

会议纪要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-062

签 发：贲 振 军

会议地点	项 目 部 会 议 室	会议时间	2025 年 05 月 19 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：升压站、光伏区施工进度、质量、安全			
会议内容：			
一．建设单位项目部对施工单位的要求：			
1. 升压站土建工程已经进行了预验收，要求施工单位逐条消缺整改；			
2. 要求施工单位在 5 月底之前完成升压站所有监控系统的工作量，站内全景摄像头安装在配电楼爬梯北侧的天沟位置，确保支架稳定牢固；			
3. 要求施工单位 5 月底前完成升压站内所有电气的工作量，设备调试及交接试验；			
4. 要求施工单位 5 月底前完成光伏区 D 地块至升压站内 1#2#开关柜集电线路的工作量，35kV 电缆的耐压试验可以在并网前完成；			
5. 要求设计单位及时出具光伏区 A 地块的施工蓝图；			
6. 要求施工单位按照光伏区 A 地块的施工蓝图，采购 PHC 桩及光伏支架，合理安排施工人员及机械进场施工，现场配备相应的管理人员，严禁以包代管；			
7. 要求施工单位及时完善升压站内的安全标识标牌及消防设施；			
8. 要求施工单位同步报验施工资料，不得影响后续的升压站受电前质量监督检查；			
9. 广东已经进入汛期，雷电天气较多，要求施工单位检查所有设备防雷装置是否齐全有效，同时做好相应的防范措施。			
二．监理单位项目部对施工单位的要求：			
升压站预验收提出的问题汇总			
1. 室外井盖、消火栓存留在上面的水泥需清理；			
2. 生产辅助楼配电箱箱体泡沫胶需清理；			
3. 生产辅楼卫生间洗衣机处孔洞未封堵；			
4. 生产辅助楼卫生间墙砖需清理；			
5. 生产辅助楼主控室操作平台需更换；			
6. 桥架连拉处跨接线铜编线需更换黄绿线；			
7. 生产辅助楼会议室吊顶缝隙太大需整改；			
8. 生产辅助楼工具门需补漆；			
9. 消防泵房孔洞未封堵；			
10. 生产辅助楼层面排水沟需清理；			
11. 事故油池井口开裂需修补；			
12. SVG 断路器线管未封堵；			
13. SVG 电抗器基础面需处理；			
14. 主变西侧电缆沟与路缘及连接处需处理；			

15. 根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）和《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB 50462-2015）的要求，生产辅助楼主控室及配电楼继电器室内的静电地板需提供防静电电阻检测报告。

质量方面

- 1. 要求施工单位及时报验升压站监控系统的相关资料；
- 2. 要求施工单位报验升压站电气施工资料及调试方案；
- 3. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患；
- 4. 要求施工单位做好成品保护工作，升压站已经完成的土建工作不得重复返工。

安全方面

施工人员安全帽不系帽带及吸烟的现象较多，要求施工单位加强安全文明施工的管理力度，杜绝习惯性违章，严禁以包代管；

进度方面

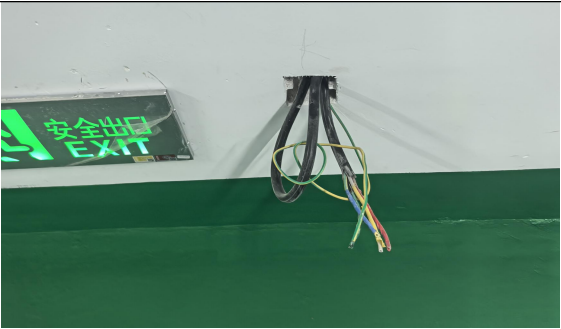
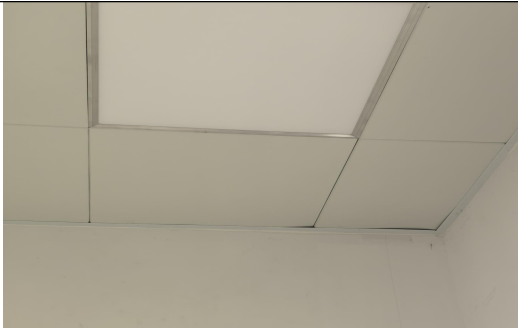
光伏区 A 地块施工目前处于停滞状态，施工进度严重滞后。

升压站土建工程预验收整改单		
整改问题	消防水泵孔洞未封堵 水泵房部分支架防腐层厚度不达标	消防管孔洞未封堵 水泵房部分支架防腐层厚度不达标
问题照片		
整改问题	污水井盖水泥需要清理	雨水井篦子水泥需要清理个别存在防锈
问题照片		

整改问题	电缆沟盖板安装不合格 水泥边框存在裂纹空鼓情况	电缆沟盖板安装不合格 个别盖板边框存在返锈情况
问题照片		
整改问题	母线桥支架基础套管未清除	SVG 设备区域内垃圾未清理干净
问题照片		
整改问题	SVG 设备区域基础螺栓返锈 设备基础存在裂缝及空鼓情况	SVG 设备区域内孔洞未封堵
问题照片		
整改问题	螺栓紧固不到位	支架基础存在掉角情况
问题照片		

整改问题	室内监控系统不完善	室内监控系统不完善
问题照片		
整改问题	室外监控系统不完善	室外监控系统不完善
问题照片		
整改问题	储能区域混凝土外观质量不合格	储能基础有部分透气孔位置偏低 下雨易返水
问题照片		
整改问题	生产辅助楼应急电源箱与桥架连接 使用 PVC 锁母需更换	生产辅助楼雨水管上根部修补有缺陷
问题照片		

整改问题	部分箱柜外表油漆损坏需修补	部分桥架托架长度不够，桥架至少要设置 2 处与保护导体可靠连接
问题照片		
整改问题	防火门锁不合格	防火门存在掉漆情况
问题照片		
整改问题	路缘石需要延伸至电缆沟处 路缘石上面需要刷标识漆	储能区域北侧电缆沟与设计单位对接出具相应的施工方案
问题照片		
整改问题	35kV 开关室内预留孔洞未封堵	35kV 开关室内插座未安装
问题照片		

整改问题	35kV 开关室内空调未安装	生产辅助楼室内个别位置吊顶不合格
问题照片		
整改问题	事故油池井口混凝土开裂	生产辅助楼屋面女儿墙混凝土外观质量不合格
问题照片		
整改问题	生产辅助楼雨蓬压条未清理	围墙外墙漆粉刷不合格
问题照片		
整改问题	生产辅助楼主控室操作平台存在外观质量问题	升压站北侧垃圾清理 光伏区围栏延伸至升压站围墙
问题照片		

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2025 年 05 月 19 日 星期一



10:34 | 2025-05-19
星期一 多云 29℃
海丰县·南土围雅

监理例会

今日水印
相机 真实可验
防伪 PB1XXCU2R1RP3M

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

日期：2025 年 05 月 19 日

序号	姓 名	参建单位名称	联系电话
01	林煜	海丰通威渔光科技有限公司	15757874923
02	鲍炜	海丰通威渔光科技有限公司	15867126045
03	俞永平	常州正衡电力工程监理有限公司	17190065789
04	王健伟	常州正衡电力工程监理有限公司	15845256920
05	王坤	浙江阳明电力建设有限公司	16628757788
06	曹心	浙江阳明电力建设有限公司	13856375566
07	汪成	浙江阳明电力建设有限公司	17505632222
08	王书世	浙江阳明电力建设有限公司	13955701031
09	段国	浙江阳明电力工程有限公司	13355637386
10	毕磊	浙江阳明电力工程有限公司	15135554975
11	陈林林	浙江阳明电力建设有限公司	18605671086
12	车文超	浙江阳明电力建设有限公司	18356501212
13	高俊超	南瑞继保 浙江阳明电力建设有限公司	15554571132
14	王颖	浙江阳明电力建设有限公司	15671333012
15			
16			
17			
18			
