

监理例会会议纪要

工程名称：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目


编号：ZHJL-DHDE-004

会议地点	大韩道恩会议室	会议时间	2023 年 08 月 12 日
会议主持人	焦猛		
会议主题：大韩道恩0.229万千瓦综合智慧零碳电厂项目8月份第二周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 本周夹具安装完成100%，导轨安装100%。			
2. 1号屋面组件安装完成26%；逆变器安装40%；桥架安装50%；直流电缆敷设50%。			
3. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
下周计划：			
1. 一号屋面组件安装。			
2. 一号屋面直流电缆敷设；直流电缆MC4插头制作。			
二、监理项目部要求			
1. 要求屋面各工序施工严格按照设计图纸及规范要求进行。			
2. 要求组件安装将中、边压块压实紧固；直流电缆、MC4接头不得拖至屋面。			
3. 要求组件吊装作业时，严格执行现吊现分散，成箱组件不得在屋面长时间停留。			
4. 要求现场施工、动火、吊装等各工序作业时，总包单位安全人员必须全天履职。			
5. 天气炎热，要求总包单位严格控制施工时间，避开高温阶段，且配备防暑降温物资。			
6. 要求提供施工项目经理及安全员相关证件进行报审。			
7. 要求对进场施工人员进行安全培训教育，且持证上岗；超过55周岁人员，严禁至屋面进行高空作业。			
三、业主项目部要求			
1. 要求高空作业施工时必须采用5点式安全带，戴好安全帽，且安全带悬挂牢固。			
2. 要求屋面施工人员避开高温阶段的施工，项目部配备相应防暑物资。			
3. 要求总包单位尽快提供项目部管理人员证件和一人一档资料。			
4. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。			
5. 要求总包单位吊装作业严格执行相关制度，作业时安全人员现场监督。			



主送单位	上海松光绿色能源有限公司
抄送单位	建立工程技术有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议照片及签到表

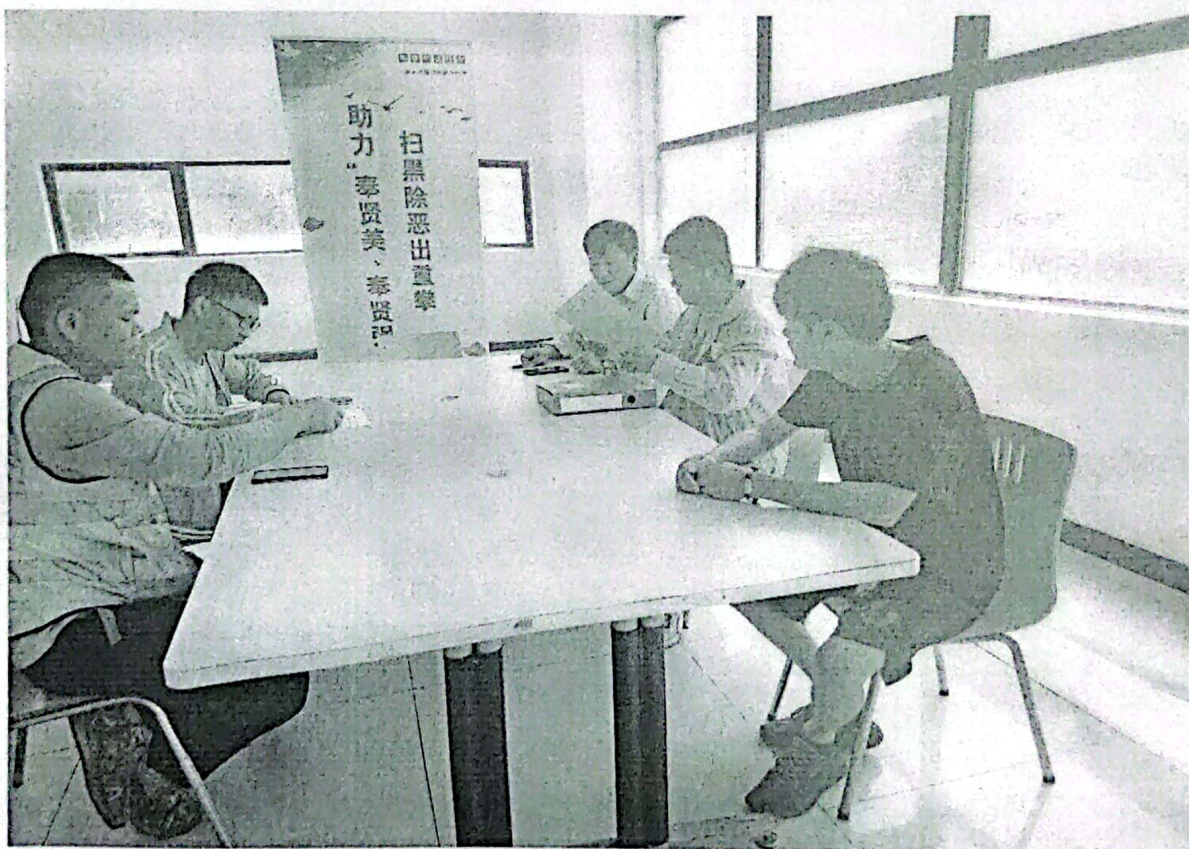

上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2023.08.12	会议地点	大韩道恩项目部会议室	
主持人	焦猛	记录人	高琰斌	
参加单位及人员:				
高琰斌 · 金越 · 余我波 沈刚 陈峰				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期

