

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目


编号：ZHJL-ZHSW-003

会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 05 月 19日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目5月份第三周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 本周彩钢瓦屋面、混凝土屋面防水施工已全部完成。			
2. 对现进场施工人员进行安全教育培训，进行每日安全站班会。			
3. 导轨、夹具、中边压块到货。			
下周计划：			
1. 彩钢瓦屋面导轨安装。			
2. 1*4mm ² 电缆到货。			
3. 混凝土屋面开展施工。			
二、监理项目部要求			
1. 要求相关技术人员及施工人员熟悉图纸，严格按照设计图纸进行施工。			
2. 按照“施工进度节点图”现你单位已对彩钢瓦屋面和混凝土屋面相关材料到货严重滞后，现要求你单位细化施工进度，确保6月30日并网节点如期完成，如因材料、设备等未到货导致工期延误，你单位负全部责任，并给予相应经济处罚。			
3. 现场施工过程中管理人员、技术人员不在岗，要求施工过程中要有相关人员看护，确保人员安全，各工序符合图纸要求。			
三、业主项目部要求			
1. 要求总包单位对屋面施工人员安全交底细化，屋面作业时严禁踩踏、跨越采光带。			
2. 对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。			
3. 要求总包单位对现场组件到货时间尽快确认并给予回复。			
4. 要求屋面作业人员人证相符及时报审，且附带相应网络截图凭证。			



主送单位	上海上电清弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
签发人	

附：会议照片及签到表

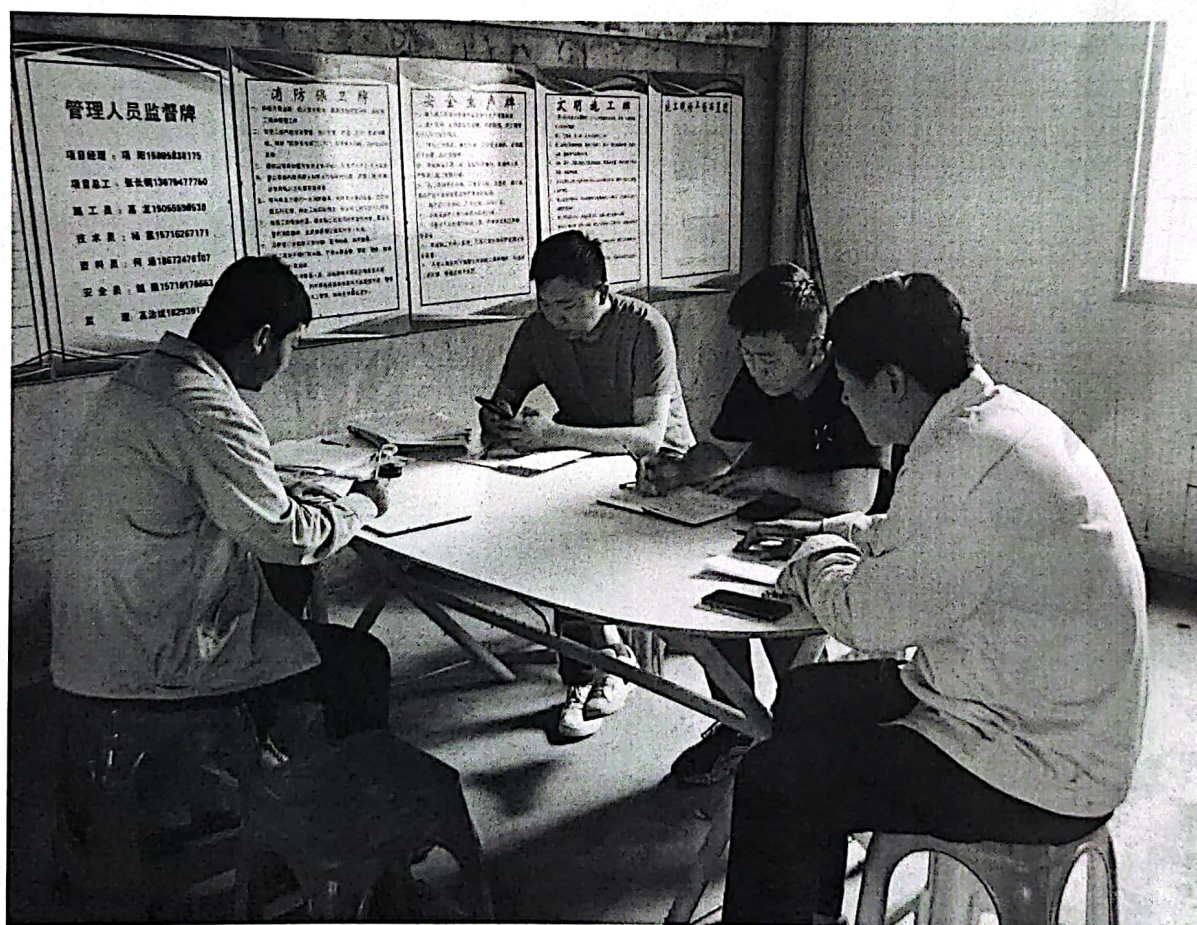

扫描全能王 创建

上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2013.05.14	会议地点	中华商务项目部会议室	
主持人	王立杰	记录人	高论文斌	
参加单位及人员:				
高论文斌 邵阳 张永刚 陈明超 杨 芳				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期

