

监 理 例 会 会 议 纪 要

工程名称：上海中华商务联合印刷有限公司0.38万千瓦综合智慧零碳电厂项目

编号：ZHJL-ZHSW-008


会议地点	中华商务会议室	会议时间	2023 年 06 月 30 日
会议主持人	王立杰		
会议主题：上海中华商务0.38万千瓦电厂项目6月份第四周监理例会			
会议内容：			
一、施工单位施工情况汇报			
本周完成：			
1. 彩钢瓦屋面：导轨安装完成100%；1*4mm ² 光伏直流电缆完成100%；桥架安装完成100%；组件安装完成3.2MW；逆变器安装完成10台；逆变器接线全部完成；接地扁铁焊接全部完成。			
2. 混凝土屋面：预制墩吊装、安装全部完成；组件安装全部完成；1*4mm ² 光伏直流电缆完成100%。			
3. 土建工程：设备基础开挖全部完成；砌筑全部完成；电缆沟开挖全部完成；设备基础浇筑全部完成。			
4. 本周项目已按时完成并网，剩余消缺工作如下。			
下周计划：			
1. 混凝土屋面：水管、电源、水泵、直流线缆、组件MC4插头、接地扁铁、交流桥架盖板等进行整改消缺。			
2. 彩钢瓦屋面：接地扁铁刷漆、交流电缆梳理、桥架盖板、屋顶卫生等进行整改消缺。			
3. 土建工程：对场区路面进行恢复，设备基础周边硬化、围栏安装、防火封堵，对场区内直埋电缆按要求进行安装安全标示桩。			
二、监理项目部要求			
1. 现阶段项目已并网带电，要求对后期消缺工作严格按照规范要求进行整改，对带电设备及线缆周边施工时不得单人作业，必须有专人看护，并确保人身安全。			
2. 要求全场电缆必须标明电缆路径、型号、起止点，直埋电缆安装安全标示桩。			
3. 要求对分部、分项资料检验批文件进行编辑、上报监理部签署。			
4. 要求对剩余消缺项严格按照设计图纸及规范要求进行消缺整改。			

三、业主项目部要求

1. 要求总包单位在有效安排工作时间和施工人员进行消缺施工时做好安全防护措施。
2. 要求总包单位对钢筋、混凝土相关强度报告尽快上报。
3. 场区设备已带电，在后期消缺工作中严格遵守规章制度，严格按照技术规范进行整改消缺。
4. 要求对场区纪律严格遵守，不得抽烟酗酒，确保安全文明生产有序进行。

主送单位	上海上电浦弘新能源科技有限公司
抄送单位	宝胜系统集成科技股份有限公司
发文单位	常州正衡电力工程有限公司
签发人	高浩斌

附：会议照片及签到表

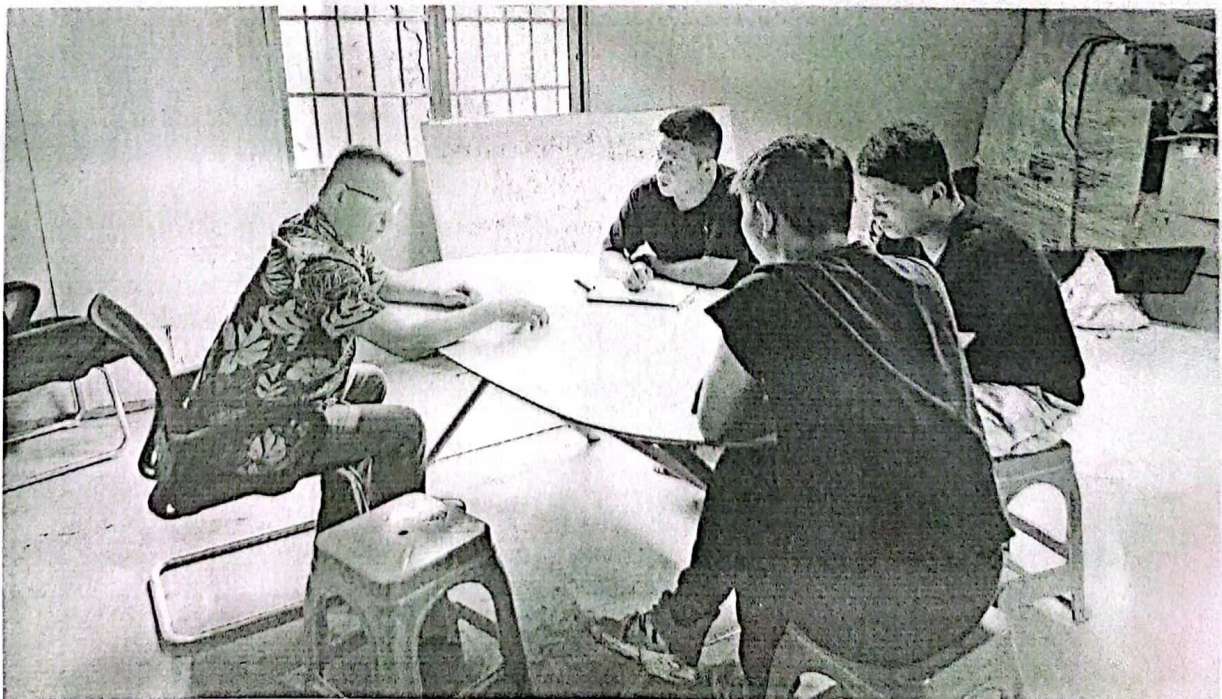

上海电力浦西公司

会议签到表

会议名称	质量及安全监理例会		附 页	
会议时间	2023.06.30	会议地点	中华商务项目部会议室	
主持人	王立杰	记录人	高论斌	
参加单位及人员:				
冷明 高论斌 张以钢 高龙				
编制人/日期		审核人/日期		批准人/日期
