

会议纪要

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXTY-019

签发：陈渝

会议地点	17 万千瓦项目总包会议室	会议时间	2023 年 11 月 04 日
会议主持人	陈渝		

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2023 年 11 月 04 日（周六）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、通号工程局集团城建工程有限公司出席。

施工单位：

一、完成情况：

晋源区

本周实际获取工作面（18）户，分布在北瓦窑村、庞家寨、枣园头、北邵村、王郭村等村，预计可安装容量（0.72）MW·P。项目累计获取工作面（79）户（已对不能做的户数相应核减）。

本周北瓦窑村（5）户支架完成；西峪村（1）户支架完成；姚村（1）户组件、逆变器完成；北邵村（4）户逆变器完成、（2）户组件完成。备案情况本周完成备案(0)MWp，其中已完成安装后补备案(0.163)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件本周实际安装完成(0.11)MWp。并网情况本周计划向电网递交（5）户并网审核资料，实际递交（5）户并网审核资料，本周并网(0)MWp。支架累计完成 2211KW，组件累计完成 1505KW，逆变器累计完成 40 台合计 1316KW。备案情况累计已完成(0.163)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(1.16)MWp，完成总量的（0.68）%。并网情况本月累计并网(0.163)MWp，项目共并网(0.163)MWp，完成总量的（0.1）%。

尖草坪区

本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 12 户，施工 1 队获取工作面 8 户；施工 2 队获取工作面 4 户；2 队东张村村委未走完合同流程。

尖草坪区施工 1 队共 8 户，5 户已并网，1 户农户走线问题未并网，西关口 1 户整改中，

1 户未施工；施工 2 队共 4 户，2 户下周完成逆变器安装，2 户未施工。备案情况本周完成备案(0)MWp，其中已完成安装后补备案(0.259)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件本周实际安装完成(0.259)MWp。并网情况本周计划向电网递交(2)户并网审核资料，实际递交(0)户并网审核资料，本周电表获取/安装(2)块，下周需求(2)块，本周并网(31.86)KW。支架累计完成 1539KW，组件累计完成 1459KW，逆变器累计完成 9 台合计 325KW。备案情况累计已完成(0.259)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(0.259)MWp，完成总量的(0.86)%。并网情况本月累计并网(31.86)KW，项目共并网(201.58)KW，完成总量的(0.67)%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(502.672)吨。2. 本周组件到货(4.3896)MW，累计到货(11.047)MW，达到总量的(6.5)%。3. 本周逆变器调拨(0)台，累计到货(75)台，达到总量的(1.34)%。4. 本周直流电缆到货(0)千米，累计到货(17.5112)千米。5. 本周交流电缆到货(0)千米，累计到货(0)千米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(5)MW。3. 下周逆变器计划到货(110)台。4. 下周直流电缆计划到货(0)千米(红色)。5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(141.96)吨。2. 本周组件到货(1.902)MW，累计到货(5.706)MW，达到总量的(5.7)%。3. 本周逆变器调拨(0)台，累计到货(7)台。4. 本周直流电缆到货(0)千米，累计到货(0.5)千米。5. 本周交流电缆到货(0)千米，累计到货(0.1)千米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货(0)千米(红色)。5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。

二、下周计划：

晋源区

下周计划获取工作面（20）户。下周计划安装（0.44）MWp（其中高压 0MWp）。并网情况下下周计划向电网递交（16）户并网审核资料。晋源区：施工人员合计 62 人。13 户施工至逆变器；12 户支架完成；

施工情况说明累计开工建设 55 户，其中已低压并网 5 户，具备高压并网条件 2 户，具备低压并网条件 30 户，支架安装完成 11 户，其余正在建设中。

尖草坪区

下周计划获取工作面（10）户。工商业无具体结果。下周计划安装（0）MWp。并网情况下下周计划向电网递交（2）户并网审核资料。尖草坪区：施工人员合计 20 人。

一队下周计划施工一户，为西关口村王曙楠户，进度达到逆变器安装完成。二队下周计划施工两户，阳曲镇皇后园村王清梅户，歇子寨杨秀文户，进度达到逆变器安装完成。

监理单位：

一、安全

1. 巡视现场发现个别工队存在无配备灭火器、三级箱，爬梯存在严重安全隐患的情况，个别工人存在佩戴安全帽没有系帽带，北邵村有一用户组件离电缆线距离太近不符合安全距离，以上问题要求尽快整改。

二、质量、进度

1. 本周组件安装板缝宽窄不匀偏差较大，宽缝有 3-4cm 打胶质量较差，窄缝有的约 1mm 打胶无法保证质量，个别工队使用化学锚栓钻孔未清理孔内灰渣。

2. 部分施工队接地扁铁喷漆没按照规范要求做，有施工队喷黄绿颜色漆间距不匀，有施工队喷红黄色漆等情况，扁铁在墙上固定无统一固定形式，固定不牢固松动，扁铁与地面接地焊接不够美观等现象，要求尽快统一标准尽快整改。

3. 目前发现北邵村、枣元头村、姚村施工队支架施工质量较好，西峪村施工队整体一般，要求施工队扬长避短，发挥工匠精神将工程质量提升上来。

4. 姚村大院图纸较多，图纸不够详细，希望设计单位能尽快安排图纸交底。


业主单位

1. 晋源区牛棚 1.1MW 方案已定，要求结构图在下周二（11.07 日）完成，下周三（11.08 日）安排入场施工。

2. 目前以完成的高压接入全部变为低压接入，要求两周时间将现有用户全部完成并实现并网。高压接入继续向供电局申请并保持沟通，为后期北瓦窑村大量开发的用户接入做准备。目前开发可按照高压并网状态以每台变压器为片区成片的去开发用户。
3. 尖草坪工商业能否用加固方案进行施工，如果可行要求设计单位尽快完成加固方案设计，但要做好成本核算，尽快实现开工条件。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 11 月 04 日

工程现场照片

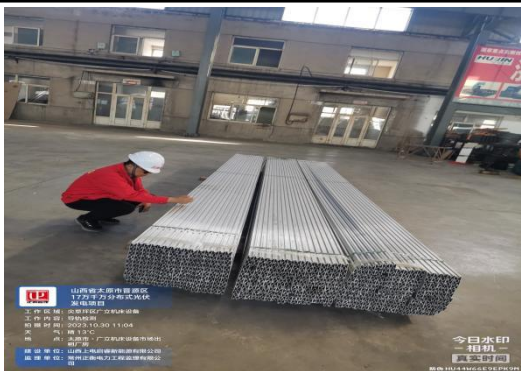

监理例会会议签到表

地点：菲丽湾项目部

项目名称：太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2023 年 11 月 04 日 六

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	陈重元	长江生态	项目经理	13750094973
2	周新	长江生态	技术经理	15971264828
3	陈海	正衡监理		13350202350
4	夏仁波	正衡监理		15189038981
5	李康廷	正衡监理	资料员	13233421229
6	于成	通号	区域负责人	18035133312
7				
8				
9	胡晓建	国号城建	安全	18035130920
10	李艳	通号		
11	张林	通号	工程	
12	吕树	国通	设计	18234157797
13	陈海明	通号	项目经理	18015760509
14	史彦珍			15034191416
15	高玲			18814827778
16				
17				
18				
19				
20				
