

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXTY-030

签发人：陈渝

会议地点	40 万千瓦尖草坪区项目总包会议室	会议时间	2024 年 01 月 20 日
会议主持人	陈 渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2024 年 01 月 20 日（周六）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、山西弘基电力工程有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。			
施工单位：			
一、完成情况：			
晋源区			
本周实际获取工作面（0）户，项目累计获取工作面（69）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2741KW。			
赤桥村（1）户、东庄村（4）户、古城营（4）户、东关村（1）户竣工整改验收，姚村一台 315 柱上变完成，北瓦窑村（2）户并网。备案情况本周完成备案(0)MWp，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电网递交（5）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，本周电表获取（2）块，其中安装（2）块。支架累计完成 2741.14KW，组件累计完成 2710KW，逆变器累计完成 80 台合计 2741.14KW。交流电缆敷设累计完成 2650KW。备案情况累计已完成(2.688)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(2.68)MWp，完成总量的（1.58）%。并网情况向电网递交并网审核资料累计递交（67）户，电表累计安装（62）块，本周并网(0.108)MWp，项目共并网(2.25)MWp,完成总量的（1.32）%。			
尖草坪区			
本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 12 户，施工 1 队获取工作面 8 户；施工 2 队获取工作面 4 户。			

尖草坪区施工 1 队共 8 户，7 户已并网，1 户已放弃；施工 2 队共 4 户，计划下周并网。工商业广立机床设备厂一期施工完毕，等待并网，广立机床设备厂二期已开工。备案情况本周完成备案(0)MWp，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电网递交(4)户并网审核资料，实际递交(4)户并网审核资料。本周电表获取/安装(0)块，本周并网(0)KW。户用支架累计完成 1650KW，组件累计完成 1650KW，逆变器累计完成 9 台合计 325KW。广立工商业钢屋顶夹具导轨累计安装 5507KW，支架累计安装 4007kW，组件累计安装 4007 kW，逆变器累计安装 12 台合 3840KW。备案情况累计已完成(7.214)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(4.407)MWp，完成总量的(14.69)%。并网情况本月累计并网(81.42)KW，项目共并网(283.2)KW，完成总量的(0.944)%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。4. 本周直流电缆到货(0)千米，累计到货(17.5112)千米。5. 本周交流电缆到货(0)千米，累计到货(0)千米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货(0)千米。5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(36.9)MW，达到总量的(123)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(29)台。4. 本周直流电缆到货(0)千米，累计到货(5.5)千米。5. 本周交流电缆到货(0)千米，累计到货(0.1)千米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货(0)千米(红色)。5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。6. 下周

铝合金导轨计划到货（0）万米。

二、下周计划：

晋源区

下周计划获取工作面（5）户。具备并网条件下周计划安装（0.08）MWp。并网情况下周计划向电网递交（5）户并网审核资料。电表下周需求（4）块。户用施工人员合计10人。5户施工至逆变器；外线施工人员7人，高压并网。

尖草坪区

施工2队共4户，计划下周并网。下周计划获取工作面（0）户。具备并网条件下周计划安装（0）MWp。并网情况下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。电表下周需求（3）块。户用：施工人员合计0人。一队下周计划并网0户。二队下周计划4户并网，为皇后园村3户，歇子寨村1户。工商业：施工人员合计40人。计划广立二期本月内完成直流侧施工。

监理单位：

安全

1. 临近春节，施工单位应加强安全巡查，重点预防施工过程中漏电触电、高空坠落、高空落物、火灾等事故的发生，严格落实每日班前安全教育。

2. 尖草坪区广立机床设备厂屋顶爬梯再次明确要求施工单位按照标准图集进行制作或者委托专业制作单位进行加工制作，在验收前整改完成；屋顶施工前必须安装用于系挂安全带的生命线，施工人员屋顶施工时要全程佩戴安全帽安全带，尤其屋檐临边施工时必须牢系安全带。


3. 施工现场应张贴悬挂醒目的安全标语标识、警示警戒标志，吊车吊运装卸材料时，吊车周围应设置警示标牌警戒带，安排专人值守严禁无关人员随意通过，吊车大臂下严禁任何人员站立或者随意通过。

质量、进度

1. 总包单位或者分包单位材料到场后应通知监理单位相关人员进行材料验收，验收合格后的材料方可用于工程施工；现场施工完成的工序应通知监理人员进行验收，未经验收或者验收不合格的严禁进行下一道工序；后续再发生入场材料不报验就用于施工或者工序完成不报验就施工下一道工序的情况，将对施工单位进行经济考核。

2. 尖草坪区广立机床设备厂应尽快将逆变器支架进行固定，固定时应注意屋顶防水层的保护严禁屋顶出现漏水现象；屋顶环网接地安装要按图施工，在直角转弯的地方要采用圆弧形扁铁进行加固连接，接地扁铁应使用黄绿漆间隔一定距离进行标识。 3. 尖草坪区广立机床设备厂电缆桥架盖板封闭前应按照设计图纸要求的地方使用防火材料进行封堵；电缆桥架安装应严格按照设计图纸要求进行施工，不符合设计图纸的地方要求尽快进行整改。 4. 晋源区即将准备并网的高压外线单位应提前和国家电网单位沟通好并网相关事宜，确保 1 月 29 日前顺利并网。 业主单位 1. 再次明确要求尖草坪区广立机床设备厂屋顶爬梯应按照使用期限 25 年标准进行护笼制作，护笼标准可参考图集制作或者委托第三方专业制作方进行制作，护笼与屋顶处要进行可靠连接固定。 2. 尖草坪区广立机床设备厂需要的材料尽快到货施工，混凝土屋顶尽快将正式设计图纸出版，2#厂房屋顶加固方案尽快完成上报。 3. 晋源区和尖草坪区还未完成并网发电的农村用户应尽快完成相关工作实现并网；广立一期现场施工存在问题的地方尽快整改完成，尽快完成并网。			
主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 01 月 20 日

工程现场照片

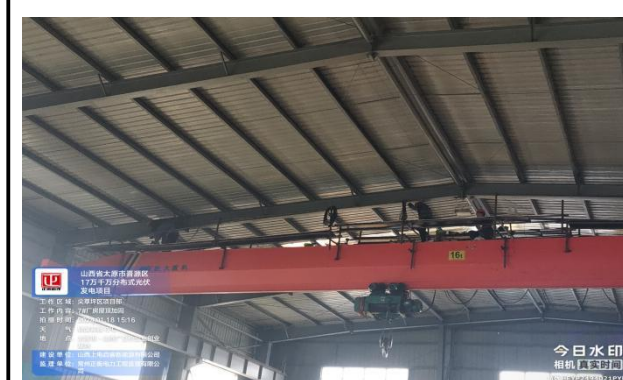

监理例会会议签到表

地点:尖草坪区通号总包项目部

项目名称:太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2024 年 01 月 20 日 六

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	周新	长江生态		
2	陈渝	常州正衡		
3	薛伟明	通号		
4	李柏文	通号		
5	吴伟强	通号		
6	程涛	通号		
7	李康兴	常州正衡		
8	张	弘基电力		
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
