

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-SXTY-031

签发人：陈渝

会议地点	40 万千瓦尖草坪区项目总包会议室	会议时间	2024 年 01 月 27 日
会议主持人	陈 渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2024 年 01 月 27 日（周六）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电启睿、山西国源盛世电力设计咨询有限公司、山西国图建设有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。			
施工单位：			
一、完成情况：			
晋源区			
本周实际获取工作面（0）户，项目累计获取工作面（70）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2800KW。			
姚村一台 315 柱上变供电局验收，姚村（4）户逆变器完成。备案情况本周完成备案（0.05）MWp。其中已完成安装后补备案（0）MWp，新备案（0.05）MWp。具备并网条件本周实际安装完成（0.05）MWp。并网情况本周计划向电网递交（5）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周电表获取（0）块，其中安装（0）块。本周并网（0）MWp。支架累计完成 2734.65KW，组件累计完成 2734.65KW，逆变器累计完成 79 台合计 2734.65KW。交流电缆敷设累计完成 2644.38KW。备案情况累计已完成（2.74）MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成（2.74）MWp，完成总量的（1.61）%。并网情况向电网递交审核资料累计递交（67）户。电表累计安装（62）块。项目共并网（2.24）MWp，完成总量的（1.32）%。			
尖草坪区			
本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 11 户，施工 1 队获取工作面 7 户；施工 2 队获取工作面 4 户。			

尖草坪区施工 1 队共 7 户，7 户已并网；施工 2 队共 4 户，计划下周并网。工商业广立机床设备厂一期施工完毕，计划周一并网，广立机床设备厂二期完成总进度的 30%。备案情况本周完成备案(0)MWp。其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周电表获取/安装（0）块，本周并网(0)KW，本月累计并网(81.42)KW。户用支架累计完成 485.48KW，组件累计完成 485.48KW，逆变器累计完成 9 台合计 325KW，并网完成 7 户，4 户等待并网，1 户毁约。广立工商业钢屋顶夹具导轨累计安装 6807KW，支架累计安装 5007 kW，组件累计安装 4007 kW，逆变器累计安装 12 台合 3840KW。备案情况累计已完成(7.214)MWp 备案。具备并网条件累计已安装完成(4.407)MWp，完成总量的（14.69）%。并网情况项目共并网(283.2)KW,完成总量的（0.944）%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。4. 本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。5. 本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0）万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货（0）万米。5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(36.9)MW，达到总量的(123)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(29)台。4. 本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（5.5）万米。5. 本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0.1）万米。6. 本周铝合金导轨到货（8400）米，累计到货（3.04）万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。

4. 下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

二、下周计划：

晋源区

下周计划获取工作面（5）户。具备并网条件下周计划安装（0）MWp。并网情况下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。电表下周需求（1）块。户用施工人员合计8人。1户具备并网条件，11户竣工验收；外线施工人员7人，5户高压并网，1户低压并网。

尖草坪区

下周计划获取工作面（0）户。工商业广立机床设备厂一期施工完毕，计划周一并网。具备并网条件下周计划安装（0）MWp。并网情况下周计划向电网递交（0）户并网审核资料。

电表下周需求（3）块。户用：施工人员合计0人。一队下周计划并网0户。二队下周计划3户并网，为皇后园村2户，歇子寨村1户。工商业：施工人员合计10人。计划广立二期本月内完成直流侧施工。

监理单位：

安全

1. 临近春节，施工单位应加强安全巡查，重点预防施工过程中漏电触电、高空坠落、高空落物、火灾地震等事故的发生，备好消防灭火器材和物资准备，严格落实每日班前安全教育。

2. 尖草坪区广立机床设备厂屋顶爬梯再次明确要求施工单位按照标准图集进行制作或者委托专业制作单位进行加工制作，在验收前整改完成；屋顶施工前必须安装用于系挂安全带的生命线，施工人员屋顶施工时要全程佩戴安全帽安全带，尤其屋檐临边施工时必须牢系安全带。


3. 施工现场应张贴悬挂醒目的安全标语标识、警示警戒标志，吊车吊运装卸材料时，吊车周围应设置警示标牌警戒带，安排专人值守严禁无关人员随意通过，吊车大臂下严禁任何人员站立或者随意通过。

质量、进度

1. 总包单位或者分包单位材料到场后应通知监理单位相关人员进行材料验收，材料验收时应准备齐全与材料相关的出厂合格证、出厂验收报告、材料供货清单、材料铭牌等资

料，验收合格后的材料方可用于工程施工；现场施工完成的工序总包自检完成后应通知监理人员进行验收，未经验收或者验收不合格的严禁进行下一道工序。 2. 尖草坪区广立机床设备厂应尽快将逆变器支架进行固定，固定时应注意支架水平稳定，屋顶防水层的保护严禁屋顶出现漏水现象；屋顶环网接地在直角转弯的地方要采用圆弧形扁铁进行加固连接，接地扁铁应使用黄绿漆间隔一定距离进行标识。 3. 尖草坪区广立机床设备厂一期厂房屋顶加固已完成总包单位应尽快完成自检并准备好相关资料进行报验；二期 6#7#厂房已完成的工序尽快进行报验。二期变压器的设计蓝图尽快完成送交供电局进行审批。 4. 晋源区即将准备并网的高压外线单位应提前和国家电网单位沟通好并网相关事宜，确保 1 月 29 日前顺利并网。尖草坪区外线单位应与供电局加强沟通，确保广立一期在 01 月 30 日前顺利通电。 业主单位 1. 再次明确要求尖草坪区广立机床设备厂屋顶爬梯应按照使用期限 25 年标准进行护笼制作，护笼标准可参考图集制作或者委托第三方专业制作方进行制作，护笼与屋顶处要进行可靠连接固定。 2. 尖草坪区广立机床设备厂二期到场导轨材料尽快安排第三方有资质的实验室进行相关实验检测，混凝土屋顶尽快将正式设计图纸出版，2#厂房屋顶尽快协商厂房租户签订合同。 3. 总包单位应尽快将施工队伍每日班前会议整理上报，班前会议要求有视频录像、有声音、施工人员和交底人签字、视频录像不少于两分钟；安全专项检查、承包商入场资料（附件四~附件九盖项目章即可）、安全考试（含监理单位）尽快整理上报。			
主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 01 月 27 日

工程现场照片

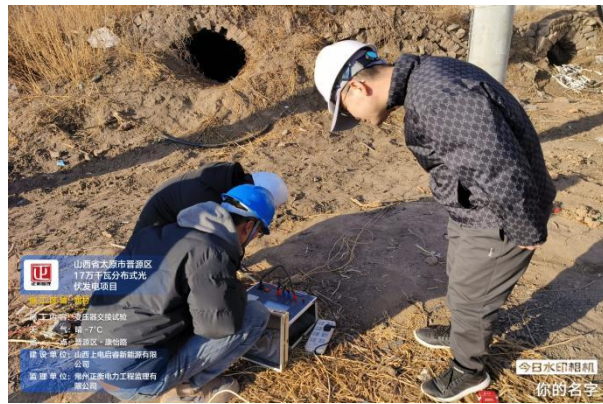

监理例会会议签到表

地点:尖草坪区天禧项目部

项目名称:太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2024年01月27日 六

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	周朝	长江生态		
2	陈渝	常州正德行		
3	孙朝	通号		
4	陈浩明	通号		
5	陈浩明	通号		
6	陈浩明	通号		
7	王康	常州正德行	资料员	
8	张健	通号		
9	吕建	通号		
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
