

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHHL-SXTY-036

山西省太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

会议时间：2024年03月05日

会议地点

40 万千瓦尖草坪区项目总包
会议室

会议时间

会议主持人

陈 渝

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2024 年 03 月 05 日（周二）15:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西国源盛世电力设计咨询有限公司、山西国图建设有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。

施工单位：

一、完成情况：

晋源区

本月计划获取工作面（100）户。本周实际获取工作面（0）户，项目累计获取工作面（70）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2771KW。

姚村（5）户，北邵村（6）户整改复查；外线整改。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电网递交（3）户并网审核资料，实际递交（3）户并网审核资料。本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，本周并网(0)MWp。支架累计完成 2.74MW，组件累计完成 4638 个，逆变器累计完成 2.74MW。交流、控制电缆敷设累计完成 4305 米。备案情况累计已完成(2.77)MWp 备案。其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。并网情况向电网递交并网审核资料累计递交（70）户，电表累计安装（62）块，项目共并网(2.6)MWp，完成总量的（1.5）%。

尖草坪区

本月计划获取工作面（0）户。本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 11 户，施工 1 队获取工作面 7 户；施工 2 队获取工作面 4 户。

尖草坪区施工 1 队共 7 户，7 户已并网；施工 2 队共 4 户，等待资料齐全后并网。工商业广立机床设备厂一期施工完毕，已并网 3.85MW，广立机床设备厂二期完成总进度的 50%。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装(0)MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况计划本月向电网递交(0)户并网审核资料。本周计划向电网递交(0)户并网审核资料，实际递交(0)户并网审核资料。本周电表获取/安装(0)块，本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW。户用支架累计完成 485.48KW，组件累计完成 485.48KW，逆变器累计完成 9 台合计 325KW，并网完成 7 户，4 户等待并网，1 户毁约。广立一期支架安装 3.855MW，组件安装 3.855MW，逆变器安装 12 台，箱变安装 2 台，完成并网 3.855KW，累计完成率 96.18%。广立二期支架安装 2816.66KW，组件安装 2100KW，逆变器安装 4 台，电缆支架(桥架)安装 1.1KM，直流电缆施工 10km。备案情况累计已完成(25.154)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(4.407)MWp，完成总量的(14.69)%，并网情况项目共并网(4132)KW，完成总量的(13.7)%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1、本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2、本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3、本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。4、本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(17.5112)万米。5、本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0)万米。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货(0)万米。5、下周交流电缆计划到货(0)万米。6、下周铝合金导轨计划到货(0)万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(36.9)MW，达到总量的(123)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(29)台。4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(5.5)万米。5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0.1)万米。6. 本周铝合金导轨到货(8400)米，累计到货(3.04)万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。
4. 下周直流电缆计划到货(0)千米(红色)。5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。

二、下周计划：

晋源区

下周计划获取工作面(5)户。具备并网条件下周计划安装(0)MWp。并网情况下周计划向电网递交(0)户并网审核资料。电表下周需求(3)块。户用施工人员合计5人。3户具备并网条件；外线施工人员5人，3户低压并网，已并网户查缺整改。

尖草坪区

下周计划获取工作面(0)户。具备并网条件下周计划安装(0)MWp。并网情况下周计划向电网递交(0)户并网审核资料。电表下周需求(3)块。户用：施工人员合计0人。一队下周计划并网0户。二队下周计划并网0户。工商业：施工人员合计10人。计划广立二期本月内完成直流侧施工。

监理单位：

安全

1. 施工单位应加强安全巡查，重点预防施工过程中漏电触电、高空坠落、高空落物、火灾地震等事故的发生，备好消防灭火器材和物资准备；严格落实每日班前安全教育，安全交底要有纸质签字、录音录像、施工人员、交底人签字；落实入场工人三级安全教育，劳动合同签订，工伤保险缴纳，特种作业人员持证上岗，加强转岗工人岗前培训教育，施工现场要实现视频监控全覆盖

2. 尖草坪区广立机床设备厂屋顶爬梯高度较高的应配备防止器，广立二期3#~4#厂房之间应增设爬梯；屋顶施工前必须安装用于系挂安全带的生命线，施工人员屋顶施工时要全程佩戴安全帽安全带，尤其屋檐临边施工时必须牢系安全带。

3. 施工现场应张贴悬挂醒目的安全标语标识、警示警戒标志，吊车吊运装卸材料时，吊车周围应设置警示标牌警戒带，安排专人值守严禁无关人员随意通过，吊车大臂下严禁任何人员站立或者随意通过。

质量、进度

1. 总包单位或者分包单位材料到场后应通知监理单位相关人员进行材料验收，材料验

收时应准备齐全与材料相关的出厂合格证、出厂验收报告、材料供货清单、材料铭牌等资料，验收合格后的材料方可用于工程施工；现场施工完成的工序总包单位应加强自检，自检合格后应通知监理人员进行验收，未经验收或者验收不合格的严禁进行下一道工序。

2. 尖草坪区广立一期箱变基础钢垫板尽快完成除锈防腐，一期二期屋顶夹具有压歪、导轨端头处悬空没有夹具支撑、逆变器支架焊渣未敲的情况，要求尽快排查整改。


3. 尖草坪区广立机床设备厂屋顶加固已完成的总包单位应尽快完成自检并准备好相关资料进行报验；二期 6#7#厂房已完成的工序尽快进行报验，二期箱变基础抓紧进行开挖，逆变器位置尽快确定，电杆、电缆同步进行施工；赵家山的施工图纸应在本周五（03 月 08 日）之前完成，施工工期计划尽快完成并上报。

4. 晋源区验收检查不合格的地方应尽快进行整改消缺，报验前总包单位应加强自检，自检合格后通知监理人员进行验收，现场有与图纸不一致的地方应尽快完成设计变更程序，未完成并网的户用尽快完成并网工作。

5. 后续新开工作业面要严格按照标准化施工流程进行，要严格审查开工报审必需上报资料。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 03 月 05 日

工程现场照片

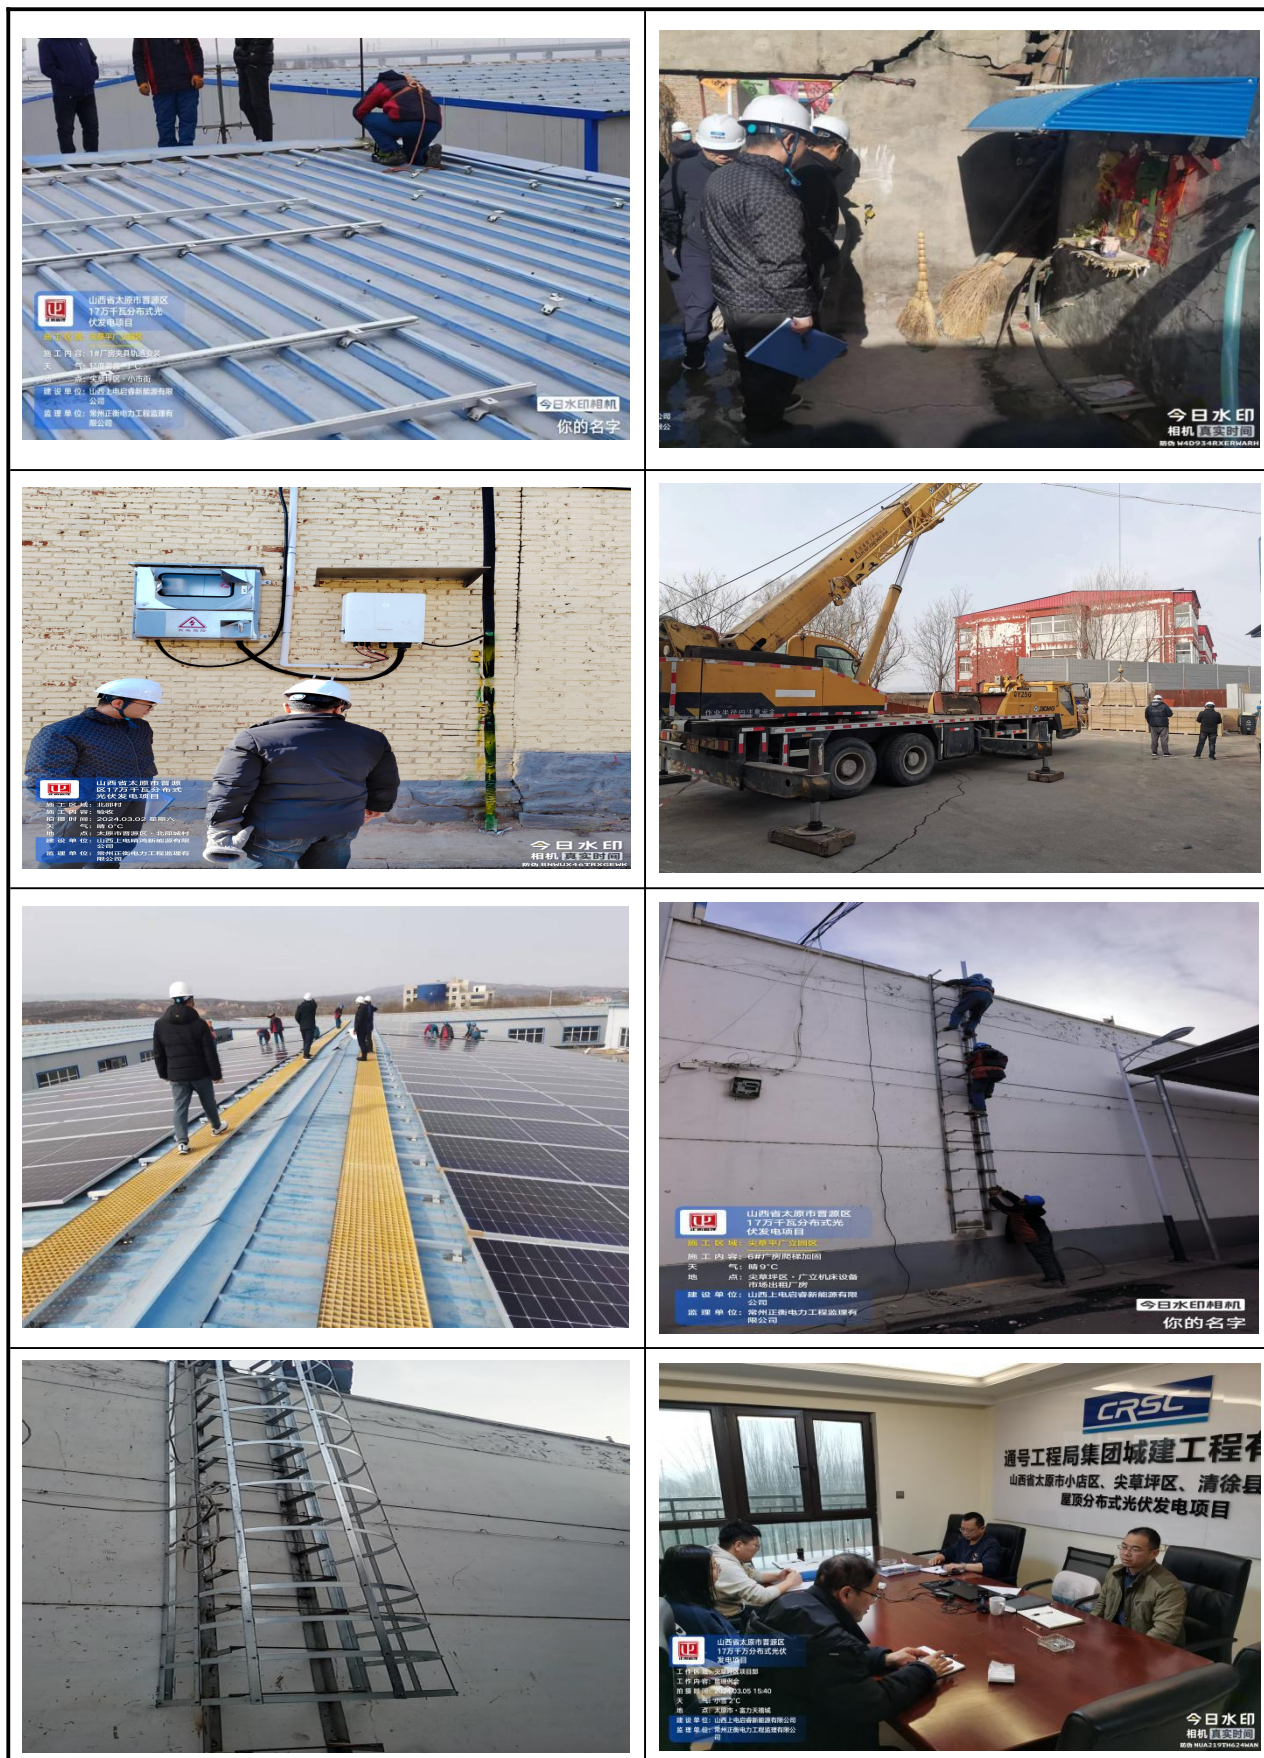

监理例会会议签到表

地点:尖草坪区项目部天禧城A区

项目名称:太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2024年03月05日 星期二

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	陈海			
2				
3	陈海	通号		15538765921
4				
5				
6	胡晓建	通号		18035130920
7	张健	通号		
8				
9	吕赫仁	国源电力		18234157797
10	李建成	正衡电力		13233423221
11	陈四	国源		13467113881
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
