

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-SKTY-049

会议地点	太原市金谷仓大厦六层会议室	会议时间	2024年06月07日
会议主持人	陈渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容 2024 年 06 月 07 日（周五）14:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电晴鸿新能源有限公司、山西国源盛世电力设计咨询有限公司、山西弘基电力工程有限公司、北格电力有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。 施工单位： 一、完成情况： 晋源区 本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目累计获取工作面（69）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2736KW。 普国光伏接入方案已批复完成。交直流测蓝图已完成，供电局正审核场区内高压接线图。前期准备支架、底座等辅材。交城大棚、养殖场签订合同办理备案手续，配合供电局现场查看线路审核接入方案。组织设计单位查看现场布置平面图及桩点位图。截止目前已完成：1 队北瓦窑等村共 41 户、3 队姚村 14 户、6 队北邵村 6 户、2 队西峪村 7 户、枣园头村 1 户，交、直流侧已整改验收完成。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料，累计递交（69）户，本周电表获取（0）块，其中安装（0）块，累计安装（65）块（5 户高压用表 1 块），本周并网(0)MWp。支架累计完成 2.74MW，组件累计完成 2.74MW，逆变器累计完成 2.74MW。备案情况累计已完成(2.74)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。并网情况项目共并网(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。			

尖草坪区

本月计划获取工作面（0）户。本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 11 户，施工 1 队获取工作面 7 户；施工 2 队获取工作面 4 户。

尖草坪区户用施工 1 队共 7 户，7 户已并网；施工 2 队共 4 户，等待并网。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶施工完毕，已并网 3.84MW，混凝土屋顶预制梁已进场，准备施工；广立机床设备厂二期组件已完成 4792 块，已完成接火工作，等待并网。赵家山场地平整，桩基施工，支架安装，桩已完成 3842 根，立柱已完成安装 2800 根。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况计划本月向电网递交（0）户并网审核资料。本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周电表获取/安装（0）块，本周并网(0)KW，本月累计并网(0)KW。户用支架累计完成 4.85MW，组件累计完成 4.85MW，逆变器累计完成 12 台，并网完成 7 户，4 户等待并网。广立一期支架安装 3.88MW，组件安装 3.88MW，逆变器安装 12 台，箱变安装 2 台，完成并网 3.855MW，累计完成率 96.18%。广立二期支架安装 2.827MW，组件安装 2.827MW，逆变器安装 7 台，箱变安装 1 台，电缆支架(桥架)安装 3300 米，直流电缆施工 3.08 万米，交流控制电缆 2000 米，接地扁铁安装 3600 米。备案情况累计已完成(25.154)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(7.027)MWp，完成总量的（23.42）%，并网情况项目共并网(4.162)MW，完成总量的（13.87）%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1、本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2、本周组件到货(0)MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3、本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。4、本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（17.5112）万米。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货（0）万米。5、下周交流电缆计划到货（0）万米。6、下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周赵家山支架到货(141.01)吨, 累计到货(1201.31)吨。2. 本周组件到货(0)MW, 累计到货(36.9)MW, 达到总量的(123)%。3. 本周逆变器到货(0)台, 累计到货(32)台。4. 本周直流电缆到货(0)千米, 累计到货(5.5)千米。5. 本周交流电缆到货(0)千米, 累计到货(0.308)千米。6. 本周铝合金导轨到货(0)米, 累计到货(3.04)千米。7. 本周管桩到货(0)根, 累计到货(5500)根。

1. 下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货(0)千米(红色)。5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。7. 下周 PHC 桩计划进场(0)米。

二、下周施工计划:

晋源区

施工人员合计 10 人。普国装饰城支架焊接。

尖草坪区

下周计划获取工作面(0)户。具备并网条件下周计划安装(0)MWp。并网情况电表下周需求(0)块。户用: 施工人员合计 0 人。一队下周计划并网 0 户。二队下周计划并网 0 户。工商业: 施工人员合计 42 人。计划广立一期二期开始混凝土屋面施工, 二期外线单位完成并网。赵家山项目大棚支架正常安装。

监理单位:

安全

1、夏季降雨频繁, 要求施工现场配电柜、配电箱、发电机搭设防雨设施, 电线电缆破损进行维修或者更换, 高处施工必须佩戴安全帽安全带, 安全带应高挂低用, 所有进入施工现场的人员都必须佩戴安全帽, 要求施工单位管理人员加强安全管理。

2、赵家山项目现场道路坑洼没有横坡排水、尘土太厚, 要求继续道路整修; 现场应加强洒水减少尘土飞扬; 现场监控设备尽快完成; 施工单位应时刻关注天气变化, 下雨天气和风力达到五级时应停止电焊施工和高处施工。


3、万柏林区普国装饰城屋顶高度较高, 施工前应将屋顶临边永久防护和上屋标准爬梯完成后方可上人进行施工。

质量、进度

- 1、尖草坪区广立一期、二期、农村户用已完工程需要整改的地方尽快安排施工人员进行整改，总包单位自检合格后上报检查，施工过程中的资料尽快整理上报，具备验收条件的尽快上报进行验收工作；还未完成并网的农户尽快完成电网报装工作，尽快完成并网。
- 2、尖草坪区赵家山项目龙骨材料短缺，后墙方管焊接进度慢，大棚地面坑洼不平，一期二期总体进度滞后，要求施工单位加快施工进度。
- 3、广立一期混凝土屋顶预制混凝土基础已到场，具体施工方案尽快确定下来开始施工。广立二期需要紧跟并网手续，尽快完成并网。
- 4、晋源区组件缝隙防水渗漏的户用尽快安排施工人员进行整改；万柏林区普国装饰城前期准备尽快完成开始施工。
- 5、赵家山项目外线图纸尽快进行图纸会审，尽快开始外线施工。
- 建设单位：**
- 1、施工单位尽快进行尾工整改，对已完工程进行整改消缺、将屋顶垃圾清理干净，自检合格后上报甲方监理维保单位共同进行验收，尽快将合格工程移交维保单位进行接管。
- 2、尖草坪区广立一期混凝土屋顶具体施工方案尽快确定下来开始施工；一期已完工程尽快组织验收；二期需要紧跟并网手续，尽快完成并网。
- 3、尖草坪区赵家山一期二期项目尽快安排龙骨、组件、后墙背板材料入场，后墙方管焊接防腐加快施工进度完成一批验收合格后开始安装墙板，外线尽快开始施工；三期外线通过高速公路具体方案尽快确定下来；剩余农村户用尽快完成并网。
- 4、万柏林区普国装饰城尽快完成前期准备工作，尽快开工，施工前上屋爬梯需按标准化完成；晋源区户用组件漏雨、彩钢瓦风吹响动要求尽快安排整改，拉闸停电户用要求尽快排除问题恢复正常。
- 5、施工单位各区域应将施工过程中的资料及时完成，参照建设单位下发《光伏项目质量检查方案》补全资料，各区域项目经理需认真执行，资料完成后上报监理审核，06月15日前补充整改完成。
- 6、目前各区域施工进度相比计划进度滞后，要求各区域认真分析原因，加强沟通协商，采取有效措施加快施工进度。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024年06月07日

工程现场照片

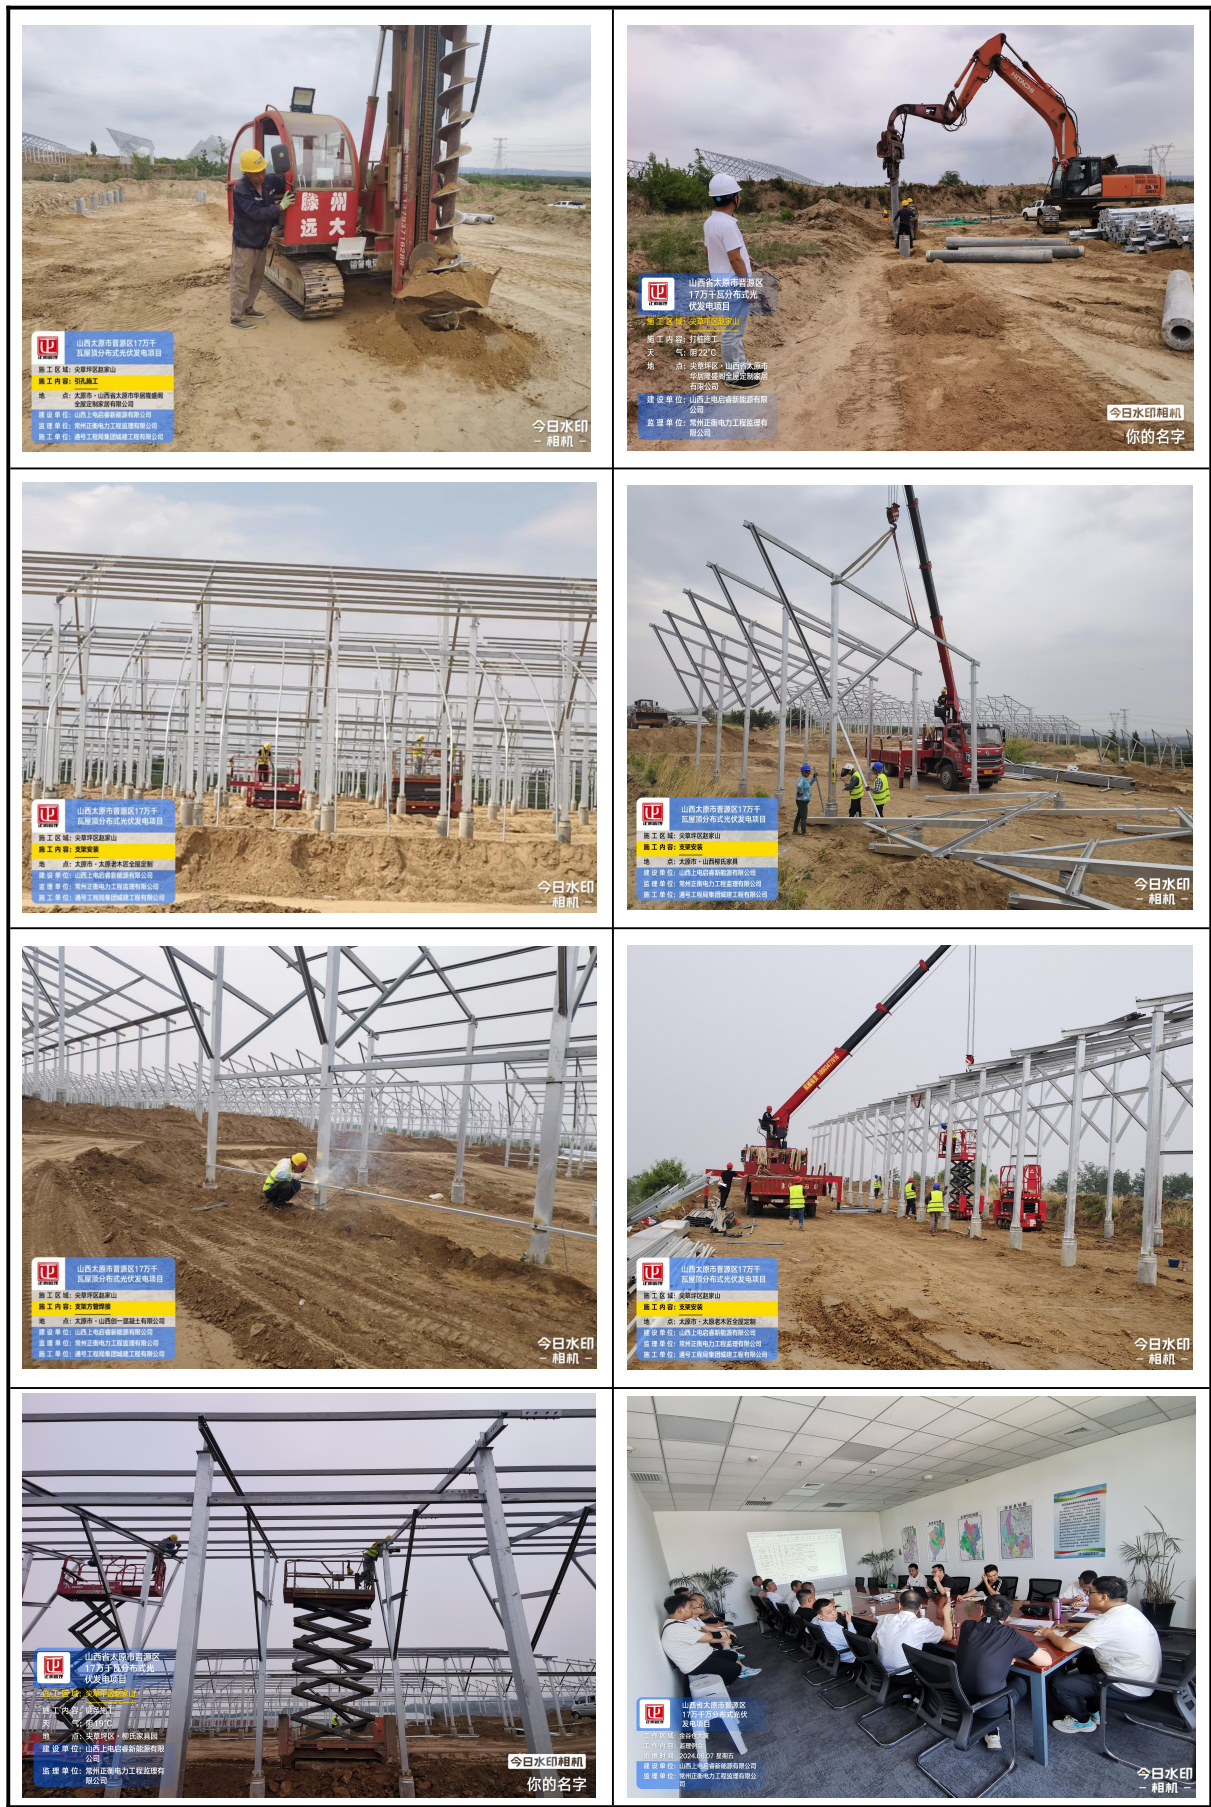

监理例会会议签到表

地点:金谷包大厦六层

项目名称: 太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2024 年 06 月 07 日 五

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	周敏	长龙		
2	张卿	山西欧亿		
3				
4	陈瀚	常州正衡		
5				
6				
7	谢志光	通号城建		
8	李宇			
9	李宇	欧亿		
10	薛伟川	城建		
11	范宏飞	通号		
12	李松月	通号		
13	高凡	下青		
14	曹浩	国瑞		
15	高万芳	市格电力		
16	李康延	常州正衡		
17				
18				
19				
20				
