

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHTT-SXTY-079

会议地点	太原市金谷仓大厦六层会议室	会议时间	2025 年 01 月 03 日
会议主持人	陈 渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2025 年 01 月 03 日（周五）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电晴鸿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司、山西国源盛世电力设计咨询有限公司。			
施工单位：			
一、完成情况：			
17 万 KW 项目			
晋源区项目并网 69 户共计 2736KW。			
交城襄大养殖场，1~16 号棚加固全部完成，打桩完成 84%，导轨完成 90%，组件完成 50%、围栏完成 20%、桁架焊接完成 23 副，系杆完成 20 副。目前施工有组件安装、支架加工焊接吊装、导轨夹具固定安装，围栏加工拼装安装。			
新兴种猪养殖场，引孔共计 831 根累计完成 100%，打桩 831 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。			
龙兴养殖场，引孔共计 504 根累计完成 100%，打桩 504 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。			
晋中物流园（原名：水屯营洗煤厂）工商业：已全部并网 3.46MW。			
中唐工商业：已完成并网 1.5MW。			
备案情况：工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp 备案。大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(55) MWp 备案。并网情况电表累计安装（66）块，项目共并网(7.7)MWp,完成总量的（4.5）%。			

尖草坪区

尖草坪区，户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW。截止目前累计并网 14.195MW。

广立机床设备厂一期二期准备 72 小时试运行。

赵家山项目一期，等待接火；二期正常送电中。备案情况累计已完成 (25.154)MWp 备案。具备并网条件本周计划安装 (6.75) MWp。本周实际安装完成 (0)MWp，累计已安装完成 (25.435)MWp。下周计划安装 (6.75) MWp。并网情况项目共并网 (14.195)MW，完成总量的 (67.7) %。

17 万 KW 项目 物资到货情况

本周到货

交城襄大养殖场：1、本周管桩到货 (0) 根，累计到货 (4008) 根，达到总量的 (91)%；2、本周导轨到货 (18672) 米，累计到货 (38676) 米，达到总量的 (100)%；3、本周支架到货 (0) 吨，累计到货 (69.89) 吨，达到总量的 (4)%；4、本周组件到货 (2.87)MW，累计到货 (12.245)MW，达到总量的 (28.5)%。

新兴种猪养殖场：本周管桩到货 (0) 根，累计到货 (835) 根，达到总量的 (100)%。

龙兴养殖场：本周管桩到货 (0) 根，累计到货 (504) 根，达到总量的 (100)%。

下周计划到货

1、下周支架计划到货 (0) 吨。2、下周组件计划到货 (0)MW。3、下周逆变器计划到货 (0) 台。4、下周直流电缆计划到货 (0) 万米。5、下周交流电缆计划到货 (0) 万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货 (0) 吨，累计到货 (934.9) 吨。2. 本周组件到货 (0)MW，累计到货 (38.2)MW，达到总量的 (100)%。3. 本周逆变器到货 (0) 台，累计到货 (269) 台。4. 本周直流电缆到货 (0) 万米，累计到货 (9.3) 万米。5. 本周交流电缆到货 (0) 万米，累计到货 (0.308) 万米。6. 本周管桩到货 (0) 根，累计到货 (5333) 根。7. 本周赵家山支架到货 (0) 吨，累计到货 (1270.92) 吨。8. 本周铝合金导轨到货 (0) 米，累计到货 (3.04) 万米。9. 本周 400KVA 台变到货 (0) 台，累计到货 (30) 台。10. 本周 JP 柜到货 (0) 台，累计到货 (30) 。

台。11. 本周 585 组件到货（0）MW，累计到货（14.13）MW。13、本周外线电缆到货（0）车，累计到货（3.2599）万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货（0）万米。5. 下周交流电缆计划到货（0）万米。6. 下周铝合金导轨计划到货（0）万米。7. 下周 PHC 桩计划进场（0）米。8. 下周电表计划到货（0）块。

二、下周施工计划：

17 万项目

施工人员合计 41 人。 襄大项目：桁架焊接安装、组件安装、围栏安装、夹具导轨安装固定、直流电缆敷设。

尖草坪区

工商业：施工人员合计 5 人。广立一期二期试运行。赵家山项目一期接火并网、质量整改。

监理单位：

安全

1、施工单位应做好冬季大风雨雪等恶劣天气的应对准备工作，编制冬季恶劣气候施工方案，早晨彩钢瓦屋顶结冰结霜时应采取有效防滑措施，应加强气象地质灾害信息预警预报工作，制定合理控制措施，有效防范自然灾害影响。

2、现场起重吊装作业时施工单位安全管理人员必须到现场进行安全管理，五级以上大风天气应停止吊装施工，高处施工安全帽安全带必须全程佩戴，现场临时用电设备和配电箱必须安装接地保护。

质量、进度

1、尖草坪区广立一期二期尽快组织进行 72 小时试运行，施工过程中隐蔽验收资料、材料送检实验报告等资料尽快准备齐全。

2、尖草坪区赵家山项目一期尽快沟通供电局完成并网，现场电缆沟标识桩和外线电杆标识尽快安排施工，竣工图抓紧完成，现场剩余未完成管线防火封堵和汇流箱支架防腐等质量问题，明确一个完成时间点尽快完成整改。

3、交城襄大养殖场围栏钢丝绳缺少卡扣材料、屋梁桁架缺少拉筋板材料、桩头钢板材料、逆变器，以上材料设备应尽快到场，电气和接地环网设计图纸在下周应完成出图；新兴

和龙兴养殖缺少支架材料应尽快到场。

建设单位：

1、根据建设单位集团公司下发新能源行业第四季度现场安全风险管理文件，要求各级单位加强组织管理、气象灾害预警预报及方案措施、总分包现场安全管控、冬季大风冰雪等恶劣天气预防、高空坠落、起重吊装、临电触电等高发事故管控，要求监理总包分包组织施工人员以会议和现场宣讲等多种形式进行学习、签到、记录，并将学习过程反馈到建设单位。

2、尖草坪区广立一期二期尽快组织进行 72 小时试运行，施工过程中隐蔽验收资料、材料送检实验报告等资料尽快准备齐全。

3、尖草坪区赵家山项目一期尽快沟通供电局完成并网，现场电缆沟标识桩和外线电杆标识尽快安排施工，竣工图抓紧完成，现场剩余未完成管线防火封堵和汇流箱支架防腐等质量问题，明确一个完成时间点尽快完成整改。

4、交城项目盯紧物资流程节点加强沟通确保材料及时供应，彩钢瓦屋顶四周防护围栏尽快完成安装。其他项目电网接入方案和电气图纸催促设计单位尽快完成。

5、各项目现场质量应加大管理力度，总包单位应对分包单位进行严格管控，现场施工应严格按照图纸标准规范执行，严防出现返工现象，在施工过程中总包单位应加强自检自查，及时整改消缺。

6、施工单位应做好冬季大风雨雪等恶劣天气的应对准备工作，加强气象地质灾害信息预警预报工作，制定合理控制措施，有效防范自然灾害影响，重点管控高处坠落、起重吊装、临电触电的隐患排查整改。

7、各区域施工期间总包单位管理人员应在现场进行质量安全的管理，并将上午和下午的施工照片发至建设单位管理群中，如果发现上午下午无施工照片发至管理群中将按照每张施工照片一千元的标准进行经济考核。

8、现场实际施工进度应时时和计划工期进行比对，出现偏差及时分析原因，调整措施，采取补救办法，如有特殊原因应说明情况及时反馈。

9、总包分包单位项目经理应明确项目各岗位职责，分工明确，责任履职到位，制定明确的岗位奖惩机制，发挥每一个岗位的职责共同创建一个高质量的光伏发电工程。


主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 01 月 03 日

工程现场照片



山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目
施工区域：襄大养殖场
施工内容：构架安装
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机

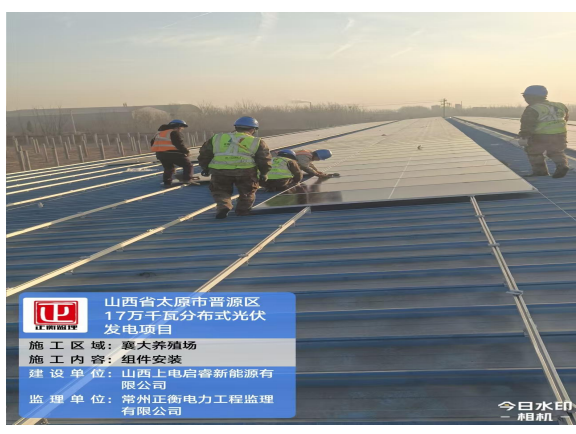

山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目
施工区域：襄大养殖场
施工内容：组件安装
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机



山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目
施工区域：襄大养殖场
施工内容：构架安装
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机




山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目
施工区域：襄大养殖场
施工内容：构架安装
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机



山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目
施工区域：襄大养殖场
施工内容：导轨安装
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机

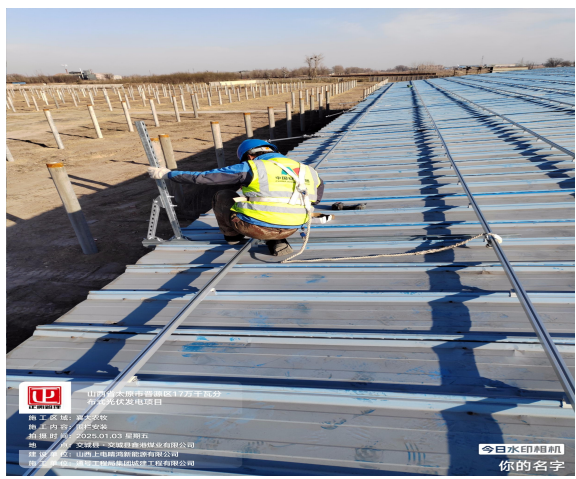

山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目
施工区域：襄大养殖场
施工内容：组件安装
建设单位：山西上电启睿新能源有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

今日水印
相机
你的名字



山西省太原市晋源区17万千瓦分布式光伏发电项目
工作区域：晋源区
工作日期：2025.01.03
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议签到表

地点: 金名仓大厦

项目名称: 太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2025 年 01 月 03 日 五

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	冯志乐	长江生态	副经理	
2	陈	长江生态	项目经理	
3	郭志明	长江生态		
4	郭	小松电力		
5	李	通号城建		
6	陈瀚	常州正衡		
7	常斌	长江生态		
8	张	国源		
9	张瑞峰	国源		
10	曹	国源		
11	李	中经		13819968998
12	李建廷	常州正衡		
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
