

会议纪要



工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

编号：SXJTY-082

会议地点	太原市金谷仓大厦六层会议室	会议时间	2025 年 02 月 14 日
会议主持人	陈 渝		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
2025 年 02 月 14 日（周五）14:30，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，参加会议单位有山西上电晴鸿新能源有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司。			
施工单位：			
一、完成情况：			
17 万 KW 项目			
晋源区项目并网 69 户共计 2736KW。			
交城襄大养殖场，1~16 号棚加固全部完成，打桩完成 84%，导轨、组件、围栏、爬梯全部完成 100%，桁架焊接完成 23 副，系杆完成 20 副，屋顶检修通道完成 68%。			
新兴种猪养殖场，引孔共计 831 根累计完成 100%，打桩 831 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。			
龙兴养殖场，引孔共计 504 根累计完成 100%，打桩 504 根累计完成 100%。目前未施工，等待支架材料到场。以上三个项目正在现场材料设备整理准备开工中。			
晋中物流园（原名：水屯营洗煤厂）工商业：已全部并网 3.46MW。			
中唐工商业：已完成并网 1.5MW。			
备案情况：工商业：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(5.1)MWp 备案。大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(55) MWp 备案。并网情况电表累计安装（66）块，项目共并网(7.7)MWp,完成总量的（4.5）%。			
尖草坪区			

尖草坪区，户用并网 11 户共计 0.446MW。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶并网 3.879MW，混凝土屋顶并网 0.414MW，小计 4.29MW。二期彩钢瓦屋顶并网 2.827MW。赵家山二期并网 6.629MW，一期并网 6.77MW。截止目前累计并网 20.965MW。

广立机床设备厂一期二期试运行已经完成。

赵家山项目一期二期正常发电中。尖草坪区并网情况项目共并网(20.965)MW,完成总量的(100)%。

17 万 KW 项目 物资到货情况

本周到货

交城襄大养殖场：1、本周管桩到货(120)根，累计到货(4128)根，达到总量的(96)%；2、本周导轨到货(0)米，累计到货(38676)米，达到总量的(100)%；3、本周支架到货(0)吨，累计到货(69.89)吨，达到总量的(4)%；4、本周组件到货(0)MW，累计到货(12.245)MW，达到总量的(28.5)%。

新兴种猪养殖场：本周管桩到货(0)根，累计到货(835)根，达到总量的(100)%。

龙兴养殖场：本周管桩到货(0)根，累计到货(504)根，达到总量的(100)%。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货(0)万米。5、下周交流电缆计划到货(0)万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1. 本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2. 本周组件到货(0)MW，累计到货(38.2)MW，达到总量的(100)%。3. 本周逆变器到货(0)台，累计到货(269)台。4. 本周直流电缆到货(0)万米，累计到货(9.3)万米。5. 本周交流电缆到货(0)万米，累计到货(0.308)万米。6. 本周管桩到货(0)根，累计到货(5333)根。7. 本周赵家山支架到货(0)吨，累计到货(1270.92)吨。8. 本周铝合金导轨到货(0)米，累计到货(3.04)万米。9. 本周 400KVA 台变到货(0)台，累计到货(30)台。10. 本周 JP 柜到货(0)台，累计到货(30)台。11. 本周 585 组件到货(0)MW，累计到货(14.13)MW。13、本周外线电缆到货(0)车，累计到货(3.2599)万米。

下周计划到货

1. 下周支架计划到货(0)吨。2. 下周组件计划到货(0)MW。3. 下周逆变器计划到货(0)台。4. 下周直流电缆计划到货(0)千米。5. 下周交流电缆计划到货(0)千米。6. 下周铝合金导轨计划到货(0)千米。7. 下周 PHC 桩计划进场(0)米。8. 下周电表计划到货(0)块。

二、下周施工计划：

17 万项目

施工人员合计 10 人。支架焊接加工，桥架安装。

尖草坪区

工商业：施工人员合计 3 人。赵家山项目质量问题整改。

监理单位、建设单位：

关于太原市光伏项目 2025 年春节假期结束后现场复工复产准备工作，现就有关事项要求如下：

1、建设单位集团公司下发的《国家能源局综合司关于 2024 年度电力建设施工安全和工程质量专项监管工作情况和四季度典型问题的通报》以及《电力安全工作规程》（工程施工部分）-高处作业两份文件，要求监理、总包、分包、班组管理人员及施工人员认真学习并记录留痕，对照文件内容逐条落实到位；其中《电力安全工作规程》（工程施工部分）-高处作业文件要求重点组织学习，培训到每一位现场施工人员，下周建设单位安全环保部门负责人将深入现场对管理人员和施工人员就文件内容随机进行提出和考核。

2、17 万项目已经并网的项目应尽快将竣工图完成，中唐和晋中物流园项目排查现场质量隐患，做好 72 小时试运行准备工作，将各项目现场设备清单详细列出上报建设单位。

3、目前施工资料的编号模板等问题经过讨论已经确定下来，施工单位应尽快完成施工资料编制上报，已经完成并网的项目施工单位在下周应将施工资料清单完成上报建设单位。


4、未并网的项目必须组织专业电工人员对组串数量和线路电压进行复查，线路测量电压的原始数据应完整记录并编入施工资料中，MC4 插头并网前严谨插入逆变器，在并网插入逆变器之前应重新测量一次线路电压，插入之后必须检查插头正负极插入的正确性。

5、已经完成并网准备进行 72 小时试运行的项目，应组织人员对现场进行安全质量隐患的排查整改消缺，确保 72 小时试运行时不能出现任何的质量安全问题，否则会影响后续工程款的付款比例和时效，望施工单位高度重视。

6、已开工未完成建设的项目，应尽快安排施工人员到场复工，加强对到场施工人员的安全教育培训，人员培训应针对不同的工作岗位制定相对应的培训试卷，培训应体现出专业性、针对性、实用性，材料设备机械应提前做好。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2025 年 02 月 14 日

工程现场照片

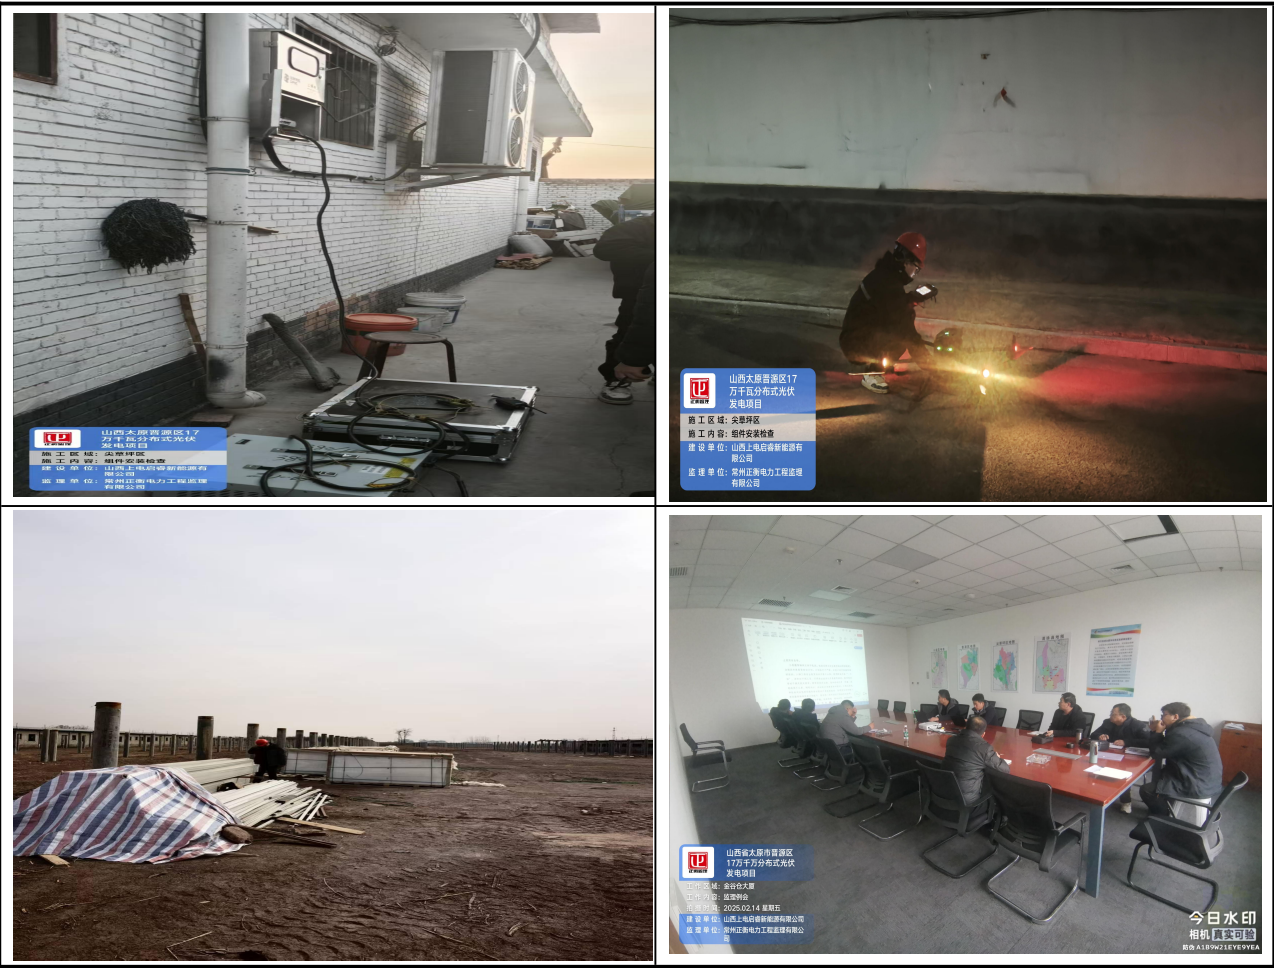

监理例会会议签到表

地点：金谷大厦

项目名称：太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目

2025 年 02 月 14 日 五

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	方伟	长治县		
2	常斌	长治县		
3	陈瑜	常州正衡		
4	李敏	海多		
5	李建廷	常州正衡		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
