

会议纪要

工程名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目
编号：ZHJL-SXTY-002

签发：

会议地点	智创城 B 座 20 楼会议室	会议时间	2023 年 7 月 04 日
会议主持人	黎建光		
会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会			
会议内容			
<p>2023 年 7 月 04 日 14:30，常州正衡电力工程监理有限公司、山西上电启睿新能源有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席，召开监理例会。会议纪要如下：回顾上周例会内容实施情况清德铺试装完成及周报准备事宜。下面由总包单位汇报本周施工完成情况及下周工作计划安排：</p> <p>施工单位：</p> <ol style="list-style-type: none">1、本周清徐清德铺支架试安装完成；2、下周计划部分区域安装容量定好及电力设备定点完成；3、变压器定点完成后根据辐射范围进行施工，变压器辐射范围之外用户不考虑安装光伏； <p>监理单位</p> <p>关于安全质量管理办法执行</p> <ol style="list-style-type: none">1、进入施工现场必须规范佩戴安全帽，不佩戴安全帽每人每次罚款 500 元，不规范佩戴安全帽每人每次罚款 100 元。2、高空作业必须按要求规范佩戴安全带，高空作业不佩戴安全带，每人每次罚款 1000 元，不规范佩戴安全带，每人每次罚款 150 元。3、施工作业屋面周围无围栏的必须布置安全警示带或安全警示线。否则每户每次罚款 500 元。			

4、在上料部位及有人员出入的门口.屋面临路部位必须布置安全警示网，否则每户每次罚款 500 元。

5、安装人员完工离场前必须对所有支架紧固螺栓进行全面检查，避免出现个别螺栓松动的问题出现。每发现一颗松动的螺栓，罚款 1000 元，并必须返场对所以支架螺栓进行全面检查紧固。

6、禁止随意在安装完成的组件版上随意踩踏，为避免组件产生隐裂。发现此类问题，每人每次罚款 10000 元。

我们监理项目部将严格按照业主授权的安全质量管理暂行办法制度进行执行，进场施工人员保单报送监理部；安全会议与例会一起召开，每月月初月中组织二次安全检查

质量、进度

1、施工前期报审资料要求下周例会召开前报审完成；

2、不经过验收进场材料进场不允许使用，私自使用资料监理部不予签字，后果有施工单位自负；

3、要求支架安装所有焊接部位必须进行满焊及防腐工作；

4、施工单位每周例会按照要求，提供电子版及纸质施工周报 。

5、支架组件安装质量必须满足设计要求及光伏发电工程施工规范要求《GBT-50794-2012》、光伏发电工程验收规范《GBT-50796-2012》。

6、我们监理部做了一个组件安装运输学习材料，借例会时间学习一下，也可以组织施工人员进行学习；



7、建议组件进场进行 EL 检测，这样可以更好管控组件施工安装质量。

8、材料进场该复验必须进行复验，如钢筋、砼的水泥砂石料等，自拌砼需要质监站配合比；

业主单位

- 1、 要求施工现场人员注意防火；
- 2、 现场消除电焊施工防火安全，做好安全防护工作；

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023年7月04日

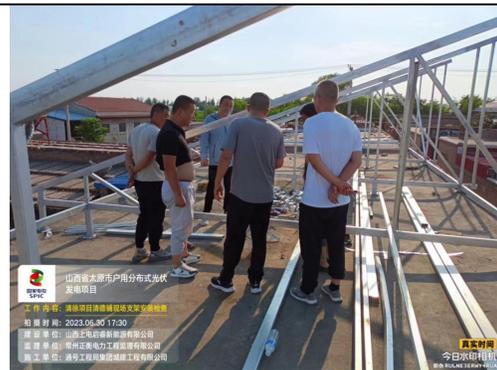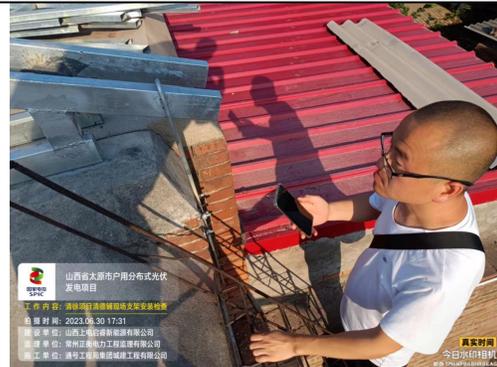

	 <p> 山西省太原市用户分布式光伏发电项目</p> <p>工作内容: 光伏项目消纳储能电站安装验收</p> <p>拍摄时间: 2023.06.30 17:29</p> <p>建设单位: 山西太原铭泰新能源有限公司</p> <p>监理单位: 常州正和电力工程监理有限公司</p> <p>施工单位: 通号工程局集团建筑工程有限公司</p> <p>真实时间 今日水印相机 水印相机 18119622082</p>

会议签到表

项目名称：太原市清徐县、小店区、尖草坪区分布式光伏发电项目 2023年7月4日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	张仰	上电富睿		17330196886
2				
3				
4	蔡光	常州正衡	负责人	15762835718
5	陈海	常州正衡		13350202350
6	成国栋	山西大晋	负责人	17603516896
7	陈明	弘基动	负责人	13623470227
8	文明志	通号		15713880887
9	袁子豪		负责人	15034191468
10	赵明	小店片区	负责人	15343433366
11	张玉龙	清文系	负责人	13834568582
12	刘冰冰	上电富睿		13327467677
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
