

永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

第 25 次监理例会会议纪要

编号: YJYGX-ZHJL-HYJY-25

签发: 孙斌

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 07 月 30 日
会议主持人	胡斌		
会议主题: 会议关于工程质量、进度、安全会议。			
一、参加单位及人员: 甘肃刘家峡浩博新能源有限公司 (建设单位) 常州正衡电力工程监理有限公司 (监理单位) 上海电力建设有限责任公司 (总承包单位) 参会人员: 详见会议签到表 二、会议主要内容与决定: 2024 年 07 月 30 日 15:30 常州正衡电力工程监理有限公司组织上海电力建设有限责任公司永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目会议室视频会议, 会议内容及决议如下: 三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报 1、进场人员、机械情况: 1.1. 330kv 升压站 (1) 项目管理人员 15 人, 施工人员 49 人 (2) 自卸车 5 台, 洒水车 2 台, 50 装载机 2 台, 压路机 1 台, 挖机 2 台, 柴油机打桩机 2 台, 夹杆式夯实机 2 台, 拉直机 1 台, 电焊机 3 台, 状态良好。 1.2. 输出线路 (1) 项目管理人员 8 人, 施工人员 75 人 (2) 洒水车 2 台, 50 装载机 1 台, 小型挖机 1 台, 升降机 10 台, 拉直机 1 台, 电焊机 3 台, 状态良好 1.3 光伏区围栏 (1) 管理人员 3 人, 施工人员 10 人, ;			



(2) 装载机1台

1.4 光伏区支架及组件安装

(1) 管理人员10人，施工人员47人；

(2) 装载机2台

2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）

工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
道路工程（公里）		65	0	0	65	0
光伏区	基础桩引孔及浇筑	221140	0	0	221140	0
	光伏支架（组）	21094	0	556	2761	0
330KV 升压站 区	山体开挖 m3	225524	0	0	225524	0
	灰土挤密桩（根）	35847	0	0	33320	
	主控通信楼	基础砼	外架浇筑	女儿墙浇筑	女儿墙	基础完成
	主变二次室	基础完成	砌筑	回填	基础完成	全部完成
	事故油池	基础完成	回填	回填	全部完成	全部完成
	构架装置	基础浇筑完成	安装螺栓	安装螺栓	安装 70%	
	生活水池	主体浇筑	养护	养护	回填	已回填 80%
	HGIS 配电基础及墙身	基础及墙身	墙身	墙身	墙身	全部完成
	消防水池	垫层、基础	钢筋	钢筋	绑扎 80%	全部完成
	防火墙	基础	基础	基础	基础	全部完成
	配电装置	垫层、基础	基础	基础	基础	全部完成



3、材料、设备到货	330KV 送出线路	塔基(个)	56	2		30	
		铁塔	57		5	11	
		设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
	01	HPB330 直径 8mmE 钢筋	3.15	0	0	3.15	0
	02	HPB330 直径 10mmE 钢筋	0.2	0	0	0.2	0
	03	HPB330 直径 12mmE 钢筋	0.34	0	0	0.34	0
	04	HPB330 直径 14mmE 钢筋	0.83	0	0	0.83	0
	05	HPB330 直径 16mmE 钢筋	3.93	0	0	3.93	0
	06	HPB330 直径 18mmE 钢筋	7.99	0	0	7.99	0
	07	HRB330 直径 18mmE 钢筋	2.5	0	0	2.5	0
	08	HRB330 直径 20mmE 钢筋	12.01	0	0	12.01	0
	09	HRB330 直径 22mmE 钢筋	15.59	0	0	15.59	0
	10	地脚螺栓 (套)	936	300	300	900	36
	11	土木格栅 (M3)	10500	0	0	0	10500



12	光伏支架 (组)	22114	0	0	2100	0
13	白石灰(吨)	10350	100	100	5295	0
14	镀锌扁铁 (吨)	120	0	0	6	0

四、监理对总包现场质量、安全、进度等进行综合评价

1、施工质量方面：

承包单位质量管理体系总体运转正常，总工及专职质量人员在岗，目前现场主要施工为光伏支架安装。

2、安全文明施工方面：

施工单位安全体系运行情况正常，未有安全事故发生：

3、工程技术管理情况：

- (1) 加强施工组织，确保产值和形象进度双丰收。
- (2) 督促施工单位做好“四小四新”科技创新试点试范工作。
- (3) 变更设计方面：实事求是变更，先申请，后变更，先变更后施工。

4、综合工作方面：

做好保密工作，做好信访稳定，维稳问题整改。

5、环水保施工情况

施工单位环水保体系运行情况正常。本周现场环水保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析：

施工进度与进度计划一致，未出现严重滞后现象。

五、监理通报本周存在问题：

- (1) 工程进度总体滞后。

六、监理单位要求：

- 1、因工程进度迟缓，监理例会改为两周一次。
- 2、总包单位要加强对分包单位的质量管控，包括（不限于）材料、设备进场，施工过程管理，资料管理。
- 3、对已经签发的监理通知单，总包单位应及时整改回复。
- 4、送出线路西固段的环评报告要尽快提交；

七、建设单位要求：



- 1、要求监理单位、总包单位加强施工质量管理。
- 2、总包单位要做好设备、材料采购计划，应满足工程实体进度需求。
- 3、要求设计单位及时提交施工图纸。

第 25 次监理例会现场

主送单位	上海电力建设有限责任公司		
抄送单位	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.07.30



永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目

会议签到表

名称	永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				
时间	2024.07.20	地点	项目会议室	主持人	胡文斌
议题	质量、安全、进度及其他内容				
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	
1	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	常立鹏	施工		
2	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				
3	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				
4	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				
5	常州正衡电力工程有限公司	胡文斌	总监		
6	常州正衡电力工程有限公司	高国文斌	主监		
7	常州正衡电力工程有限公司	蒲扣林	主监		
8	常州正衡电力工程有限公司	顾明	主监		
9	常州正衡电力工程有限公司				
10	上海电力建设有限责任公司				
11	上海电力建设有限责任公司	李新利	技术员		
12	上海电力建设有限责任公司	何明			
13	上海电力建设有限责任公司	金延国			
14	上海电力建设有限责任公司	张利	安全员		
15	上海电力建设有限责任公司	李海灵			
16	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				



永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目

第 26 次监理例会会议纪要

编号：YJYGX-ZHJL-HYJY-26

签发：胡斌

会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 08 月 13 日
会议主持人	胡 斌		
会议主题： 会议关于工程质量、进度、安全会议。			
一、参加单位及人员： 甘肃刘家峡浩博新能源有限公司（建设单位） 常州正衡电力工程监理有限公司（监理单位） 上海电力建设有限责任公司（总承包单位） 参会人员: 详见会议签到表			
二、会议主要内容与决定： 2024 年 08 月 13 日 15:30 常州正衡电力工程监理有限公司组织上海电力建设有限责任公司永靖县十四五“盐锅峡”光伏发电项目会议室视频会议，会议内容及决议如下：			
三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报			
1、进场人员、机械情况： 1.1. 330kv 升压站 (1) 项目管理人员 15 人，施工人员 49 人 (2) 自卸车 5 台，洒水车 2 台，50 装载机 2 台，压路机 1 台，挖机 2 台，柴油机打桩机 2 台，夹杆式夯实机 2 台，拉直机 1 台，电焊机 3 台，状态良好。			
1.2. 输出线路 (1) 项目管理人员 8 人，施工人员 75 人 (2) 洒水车 2 台，50 装载机 1 台，小型挖机 1 台，升降机 10 台，拉直机 1 台，电焊机 3 台，状态良好			
1.3 光伏区围栏 (1) 管理人员 3 人，施工人员 10 人，；			



(2) 装载机1台

1.4 光伏区支架及组件安装

(1) 管理人员10人，施工人员47人；

(2) 装载机2台

2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）

工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
道路工程（公里）		65	0	0	65	0
光伏区	基础桩引孔及浇筑	221140	0	0	221140	0
	光伏支架（组）	21094	0	532	5157	0
330KV 升压站 区	山体开挖 m3	225524	0	0	225524	0
	灰土挤密桩（根）	35847	0	0	33320	
	主控通信楼	基础砼	外架浇筑	女儿墙浇筑	女儿墙	基础完成
	主变二次室	基础完成	砌筑	回填	基础完成	全部完成
	事故油池	基础完成	回填	回填	全部完成	全部完成
	构架装置	基础浇筑完成	安装螺栓	安装螺栓	安装 70%	
	生活水池	主体浇筑	养护	养护	回填	已回填 80%
	HGIS 配电基础及墙身	基础及墙身	墙身	墙身	墙身	全部完成
	消防水池	垫层、基础	钢筋	钢筋	绑扎 80%	全部完成
	防火墙	基础	基础	基础	基础	全部完成
	配电装置	垫层、基础	基础	基础	基础	全部完成



3、材料、设备到货	330KV 送出线路	塔基(个)	56	2		30	
		铁塔	57		5	11	
		设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
	01	HPB330 直径 8mmE 钢筋	3.15	0	0	3.15	0
	02	HPB330 直径 10mmE 钢筋	0.2	0	0	0.2	0
	03	HPB330 直径 12mmE 钢筋	0.34	0	0	0.34	0
	04	HPB330 直径 14mmE 钢筋	0.83	0	0	0.83	0
	05	HPB330 直径 16mmE 钢筋	3.93	0	0	3.93	0
	06	HPB330 直径 18mmE 钢筋	7.99	0	0	7.99	0
	07	HRB330 直径 18mmE 钢筋	2.5	0	0	2.5	0
	08	HRB330 直径 20mmE 钢筋	12.01	0	0	12.01	0
	09	HRB330 直径 22mmE 钢筋	15.59	0	0	15.59	0
	10	地脚螺栓 (套)	936	300	300	900	36
	11	土木格栅 (M3)	10500	0	0	0	10500



12	光伏支架 (组)	22114	0	0	2100	0
13	白石灰(吨)	10350	100	100	5295	0
14	镀锌扁铁 (吨)	120	0	0	6	0

四、监理对总包现场质量、安全、进度等进行综合评价

1、施工质量方面：

承包单位质量管理体系总体运转正常，总工及专职质量人员在岗，目前现场主要施工为光伏支架安装。

2、安全文明施工方面：

施工单位安全体系运行情况正常，未有安全事故发生：

3、工程技术管理情况：

(1) 加强施工组织，确保产值和形象进度双丰收。

(2) 督促施工单位做好“四小四新”科技创新试点示范工作。

(3) 变更设计方面：实事求是变更，先申请，后变更，先变更后施工。

4、综合工作方面：

做好保密工作，做好信访稳定，维稳问题整改。

5、环水保施工情况

施工单位环水保体系运行情况正常。本周现场环水保施工总体可控。

6、施工进度及进度滞后原因分析：

施工进度与进度计划一致，未出现严重滞后现象。

五、监理通报本周存在问题：

(1) 工程进度总体滞后。

六、监理单位要求：

1、施工人员进退场台账管理应到位，新进场人员的资格证书、安全技术交底等资料应及时报审。

2、送出线路、集电线路塔基开挖，要根据已审批的专项施工方案组织施工，受限空间人工开挖要注意通风，同时做好高处坠物打击防范工作。

3、对已经签发的监理通知单，总包单位应及时组织整改回复。




4、送出线路西固段的环评报告要尽快提交；

七、建设单位要求：

- 1、要求监理单位、总包单位加强施工质量管理。
- 2、总包单位要做好设备、材料采购计划，应满足工程实体进度需求。
- 3、要求设计单位及时提交施工图纸。

第 26 次监理例会现场

主送单位	上海电力建设有限责任公司		
抄送单位	甘肃刘家峡浩博新能源有限公司		
发文单位	常州正御电力工程监理有限公司	发文时间	2024.08.13

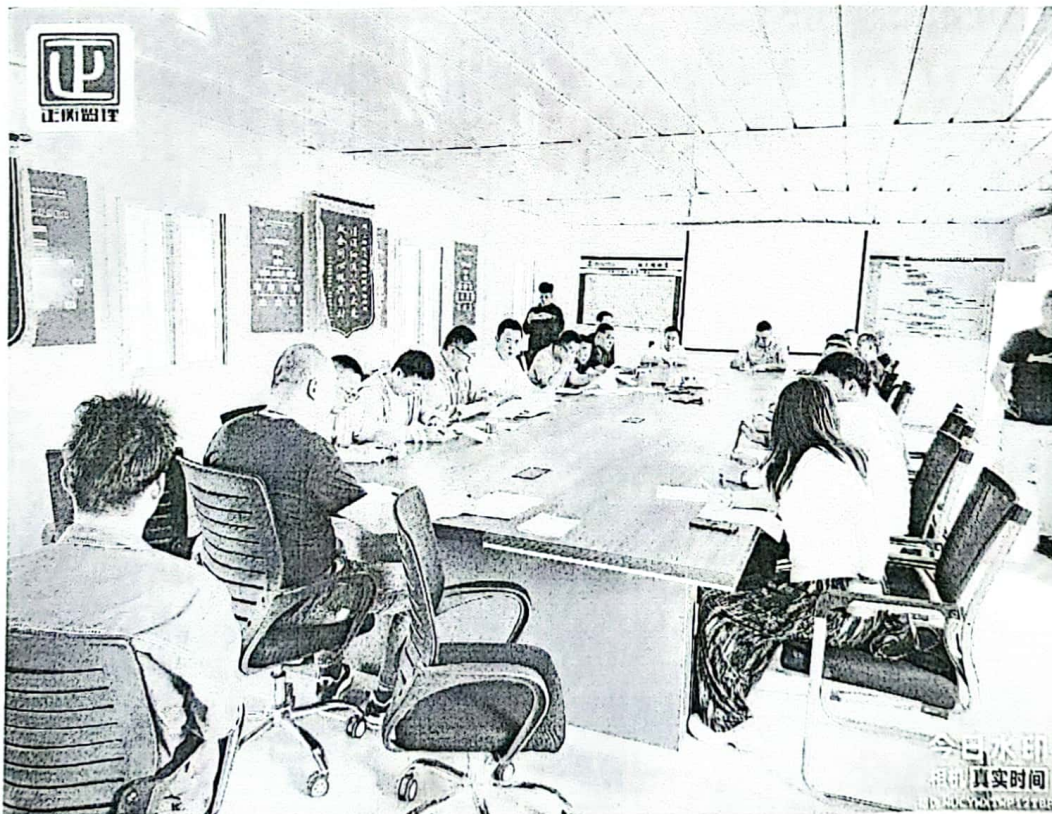

永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目 会议签到表

名称	永靖县“十四五”盐锅峡光伏发电项目				
时间	2021.08.13	地点	项目会议室	主持人	胡斌
议题	质量、安全、进度及其他内容				
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话	
1	甘肃刘家峡浩博能源有限公司	常江华	专工		
2	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				
3	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				
4	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				
5	常州正衡电力工程有限公司	胡斌	总工		
6	常州正衡电力工程有限公司	王明华	专工		
7	常州正衡电力工程有限公司	高阳文	专工		
8	常州正衡电力工程有限公司				
9	常州正衡电力工程有限公司				
10	上海电力建设有限责任公司	何明			
11	上海电力建设有限责任公司	张凯	安全负责人		
12	上海电力建设有限责任公司				
13	上海电力建设有限责任公司	李海民			
14	上海电力建设有限责任公司	李惠利	技术员		
15	上海电力建设有限责任公司	金延国			
16	甘肃刘家峡浩博能源有限公司				

