

轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式光伏发电项目

监理周报

2024. 1. 6-2024. 1. 12



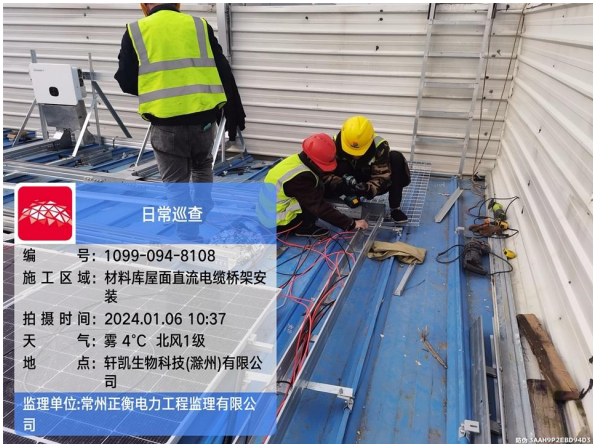
轩凯生物科技(滁州)有限公司 2.248MW 分布式用光伏发电
项目项监理部

2024 年 1 月 12 日

生物科技(滁州)有限公司 2. 248MW 分布式光伏发电项目周报

建设单位：滁州道永新能源有限公司		填报周期：2023-12.-30-2024-1-12 日	
一、项目总体建设进度汇总：			
1. 电缆敷设施工任务已完成 100%。。			
2. 组件安装施工任务已完成 100%。。			
3. 配电柜安装及内部接线已完成 100%。			
4. 逆变器安装已完成 100%。			
5. 电缆桥架安装已完成 100%。			
6. 检修通道安装完成 70%。			
7. 逆变器端电缆接线完成 100%。			
8. 光伏安装整体消缺整改完成 80%。			
9. 车棚基础开挖完成 100%。			
10. 主要设备、材料到场情况：			
名 称	厂家规格型号	本周到货	备 注
组件	晶科能源 IKM580N-72H4-V	2278×1134×35 mm.	4008 片，已到货 100%
逆变器	深圳古瑞瓦特新能 源有限公司	125KW11 台， 50KW12 台	已到货 100%%
交流电缆	上海上进电缆有限 公司	3883m	已到货 100%
铝合金导轨	清源股份有效公司	7320m	已带货 100%
支架	天津宝利钢铁	6m492 根， 4m275 根	已到货 100%
接地扁铁	天津宝利钢铁	40×4 2562m	已到货 100%
防护围栏	天津宝利钢铁	650m	已到货 100%
电缆桥架		1558m	已到货 100%
直流电缆		22000m	已到货 100%
二、项目安全施工管理。			
现场施工安全管控措施基本管控实施到位，安全管理受控。			
三、 下周计划主要工作内容			
计划完成车棚基础浇筑.及车棚基础土方回填和路面硬化，完成光伏安装全部消缺整改任务。			

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	材料库屋面直流电缆桥架安装	造粒车间屋面逆变器接线
照片	 日常巡查 编号: 1099-094-8108 施工区域: 材料库屋面直流电缆桥架安装 拍摄时间: 2024.01.06 10:37 天气: 雾 4°C 北风1级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 日常巡查 编号: 1099-094-8110 施工区域: 造粒车间屋面逆变器接线 拍摄时间: 2024.01.06 10:50 天气: 雾 4°C 北风1级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	造粒车间屋面检修通道安装	造粒车间屋面光伏接地网安装
照片	 日常巡查 编号: 1100-107-8847 施工区域: 造粒车间屋面检修通道安装 拍摄时间: 2024.01.07 09:14 天气: 晴 0°C 东北风2级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 日常巡查 编号: 1103-017-1143 施工区域: 造粒车间屋面光伏接地网安装 拍摄时间: 2024.01.08 15:31 天气: 多云 5°C 东南风2级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
文字描述	成品库屋面逆变器防火封堵	材料库屋面组件清洗系统安装
照片	 日常巡查 编号: 1104-027-7598 施工区域: 成品库逆变器电缆防火封堵 拍摄时间: 2024.01.10 14:26 天气: 晴 6°C 西北风2级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司	 日常巡查 编号: 1107-008-5422 施工区域: 材料库屋面组件清洗系统安装 拍摄时间: 2024.01.12 14:34 天气: 晴 16°C 西风3级 地点: 轩凯生物科技(滁州)有限公司 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司

