



正衡监理

编号: MZCN-ZHJL-ZH--A026

监理第二十六次会议纪要

工程名称: 梅州综合保税区 100MW/200MWh 独立储能项目

2025 年 03 月第 26 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2025 年 03 月 21 日

监理会议纪要

工程名称；梅州综合保税区 100MW/200MWh独立储能项目

编号；MZCN-ZHJL-ZH-A026

会议地点	总包办公室	会议时间	2025. 3. 21
组织单位	常州正衡电力工程监理有限公司	主持人	王登营
会议主题：	监理例会		
会议内容；关于施工现场安全、质量、进度等事宜 总包单位； 1、本周现场土建消缺整改施工，要求施工单位人员做好现场安全生产工作。 2、电网检查仿真建模资料报告下星期五完成，及资料回复。 3、现场需要资金才能进行土建未完成的工程量施工。 4、要求外线施工单位上报工程资料，并对电网检查的问题不符合规范要求的进行整改。以及检查资料整改回复工作。 本周施工情况； 1、现场电气消缺整改施工及运维维护工作。 2、土建现场路占石整改、及路灯基础二次浇灌施工，以及集装箱基础开挖浇筑施工。 3、电网检查的资料回复并网工作。 下周工作计划； 1、下周电网检查的问题消缺整改及回复验收完成。 2、做好启动会及并网前的准备工作。 3、外线对侧站间隔改造消缺施工。 需要协调； 1）、需要协调电网完成并网前的相关手续办理工作。			

2)、需要工程资金协调土建才能进行施工。

监理单位;

安全方面;

本周安全文明施工良好,无安全事故发生。

- 1、要求总包单位做好现场独立避雷针四周围栏安全防护安装工作,并加强现场安全施工管理。
- 2、要求总包单位做好现场临时用电监管。以及启动会、并网前的准备工作。
- 3、外线单位未参加监理会议,将给予考核。

质量方面;

- 1、要求总包单位按照电网检查的问题进行消缺整改质量控制,以及要求总包单位对现场电气进行自检整改工作。并要做好现场储能电池特性试验工作。
- 2、要求总包单位对现场土建消缺整改质量按照设计图纸及相关规范进行施工。

进度方面;


- 1、本储能项目施工进度缓慢,要求总包单位抓紧落实并网时间,及各项手续办理工作。
- 2、要求总包单位尽快落实土建未完成的工程量施工。避免影响本工程竣工验收工作。
- 3、要求总包单位下周一起现场独立避雷针四周围栏要进行施工,避免出现下雨雷电事故发生。

资料方面;

- 1、要求总包单位抓紧上报资料组卷目录。
 - 2、要求总包单位电网检查的问题资料尽快回复完成。
- 及外线单位上报对侧站改造工程资料。

业主单位;

- 1、要求总包单位加强电网检查资料回复。并完成相关手续办理工作。
- 2、本工程要求总包单位加强土建及电气消缺施工进度管控。以及现场施工安全管控。

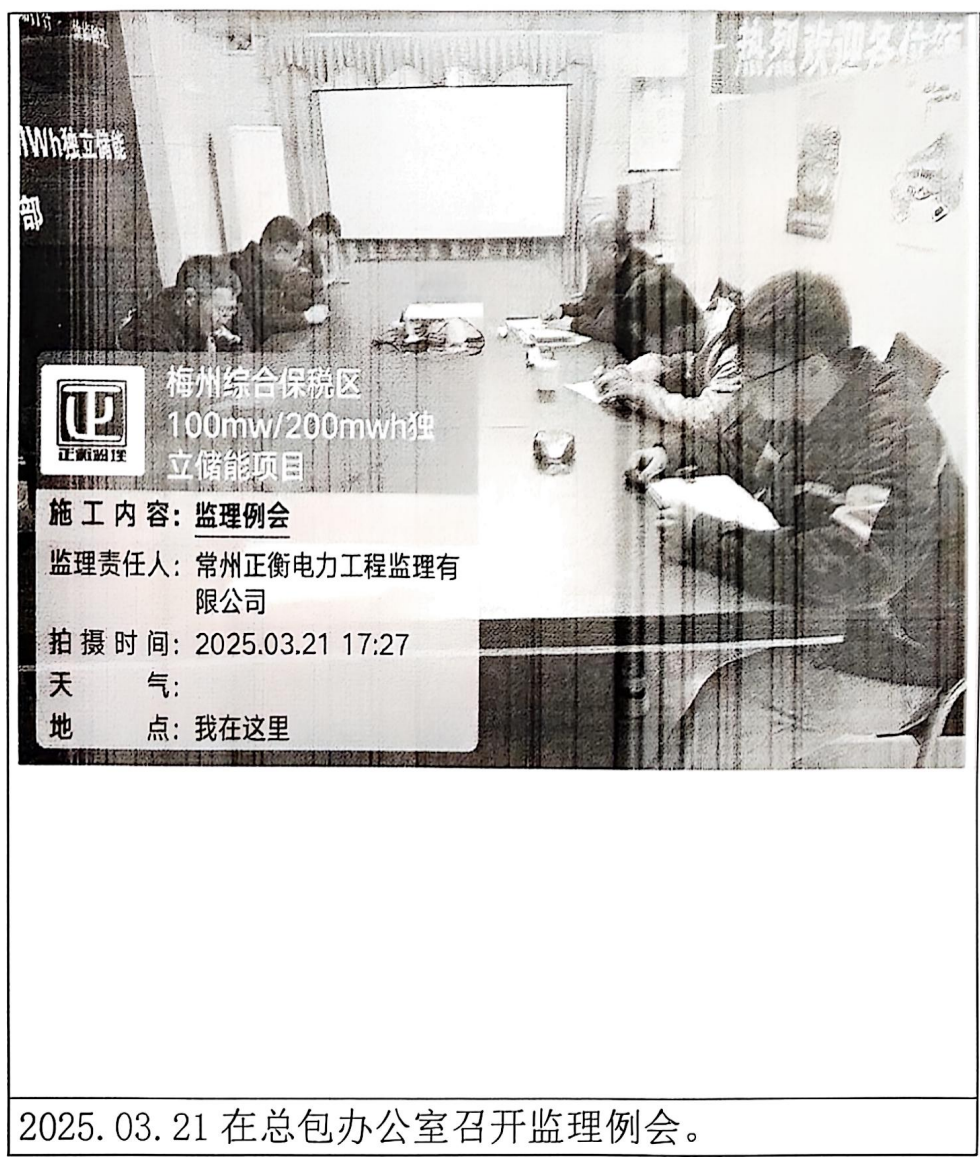

注: 本表一式 3 份, 由目监理单位整理; 建设单位、监理单位、总包单位
各一份, 签字见附件

