

## 表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目

签发人：张兵

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-010


会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 9 月 06 日
会议主持人	杨玲玲		
会议主题： 1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容：  本次会议为本项目第十次工地会议主要内容如下：  施工单位介绍本周进度：  1、人员：项目部 3 人、安装人员 15 人、加固人员 11 人每日施工前安全技术交底。  2、机械：现场加固升降车已准备。  3、材料：电缆穿线管到货并报验。  本周完成情况：  一、手续办理情况  项目备案、接入方案已取得，电力图审进行跟踪，已沟通跑供电公司手续的负责人，8 月 15 日供电公司图审已开，未提出图审修改意见，广丰区供电公司还要往市供电公司递交资料，在进行一次图审，线上流程 9 月 6 日发起。  二、现场形象进度  1、闽海一分厂：主导水槽安装完成 25%，总量完成 75%，15-16#：围栏安装完成 80%，总量完成 100%，混凝土屋面桥架下穿破孔完成 2 个栋楼  2、电缆路径破路施工对接埋深不足情况处理，设计图纸修改  3、与箱变及一次设备厂家（正泰）技术对接。  4、17-18#厂房加固： 17-18#厂房檩条就位完成 95%； 15-16#厂房加固完成 100%；  5、混凝土屋面桥架开始安装；  6、15-16#厂房屋顶四周封边瓦安装完成，防护围栏在安装；			

下周工作计划：

- 1、闽海一分厂组件安装、直流电缆铺设；
- 2、13#厂房爬梯加工焊接安装，加固完成 80%；
- 3、混凝土屋面桥架安装；
- 4、台鑫厂区电缆路径混凝土路面破路电缆敷设恢复路面；
- 5、15-16#厂房屋顶 BIPV 支架安装，防护围栏安装；
- 6、15-16 BIPV 支架安装、几字形支撑安装

三、建设单位及监理单位对施工单位提出意见和要求：

- 1、每日现场安全交底检查，保证人员安全用品佩戴，防暑降温药品齐全，及时补充。
- 2、材料送检现场取样，通知各方见证取样，做好标记进行送检，已送检的材料及时催检测单位出具报告。
- 3、组件到场及时做好到货检。
- 4、线缆，直流、MC4 接头做好绑扎。
- 5、新铺的彩钢瓦保护好，防止破损。
- 6、15-16, 17-18 屋面安装防护围栏时不允许站在临边作业。
- 7、总包方做好质量管理，对施工工序进行自检，尤其隐蔽工程必须严格管控，施工资料需同步报审，报监理部验收通过后方可进入下一道工序。
- 8、漏水情况分方阵差缺补漏，分项进行报验，完成后及时进行报验。
- 9、破路时做好现场物探进场探查，现场发现事宜及时方案细化。
- 10、安装检资质报审表，支架单位的相关实验报告，支架檩条计算书整理胶装好，包括荷载报告审核意见中旬前上报至建设单位。
- 11、预埋管不符合现场实际要求，需及时更换。

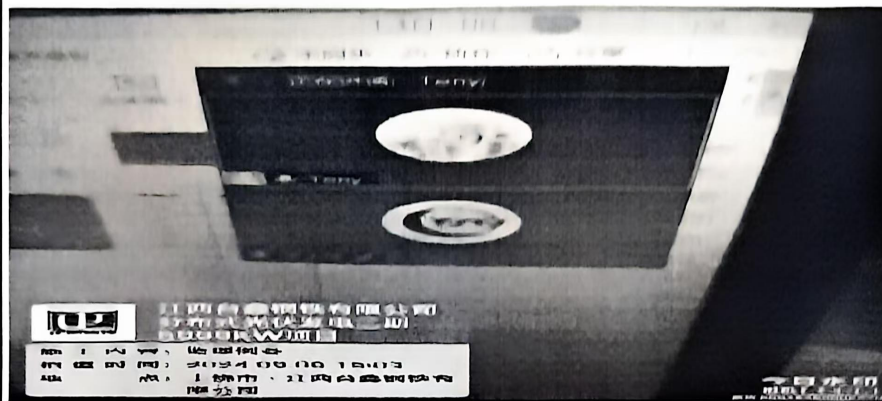

上次会议问题落实情况，

已落实完成。

主送单位	上饶中曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20240906

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

