

表 C.0.2 会议纪要

工程名称：江西台鑫钢铁有限公司分布式光伏发电二期 5999KW 项目


签发 

编号：TXGF-CZZH-HY-C02-016



会议地点	项目会议室	会议时间	2024 年 10 月 22 日
会议主持人	陈伟林		
会议主题：1、现场管理 2、施工进度 3、施工资料 4、现场施工情况等			
会议内容：本次会议为本项目第十六次工地线上会议，为确保 11 月 30 日全容量并网发电，业主对现场施工进度及人员提出具体要求，主要内容如下： 1、施工单位需落实的施工节点 （1）土建 设备基础浇筑完成 10 月 23 日，顶管完成时间 10 月 26 日 （2）光伏安装部分全部完成 11 月 20 日 1 闽海一分厂支架组件安装完成时间：10 月 26 日 215-16#厂房组件安装完成时间：11 月 3 日 317-18#厂房组件安装完成时间：11 月 15 日 4) 13#厂房组件安装完成时间：11 月 18 日 （3）低压侧电气施工全部完成 11 月 20 日， 1) 闽海一分厂低压侧（含接地）完成时间 10 月 30 日 2) 15-16#厂房低压侧（含接地）完成 11 月 4 日 3) 17-18#厂房低压侧（含接地）完成 11 月 20 日 4) 13#厂房低压侧（含接地）完成 11 月 20 日 5) 混凝土屋面低压侧（含接地）完成 11 月 5 日 6) 高压电缆敷设及箱变电气施工开始时间 10 月 27 日，完成时间 11 月 10 日。 （4）现场安全质量部分 1) 现场安全员做好每日安全交底，组织每日班前会及人员安全用品佩戴检查。 2) 督促采光带部分安全措施金属防坠网尽快安装到位。 3) 现场文明施工应加强管理，相应的安全措施落实到位。 4) 吊装至组屋面材料及时分散避免集中载荷，每日下班前做好现场垃圾清理。 5) 组件尽快送检。 6) 锌铝镁材料送检报告尽快提交报审。 7) 增加施工人员提高施工进度。			

- 8) 严格按照图纸施工。
- 9) 图审事宜及时跟进及反馈。

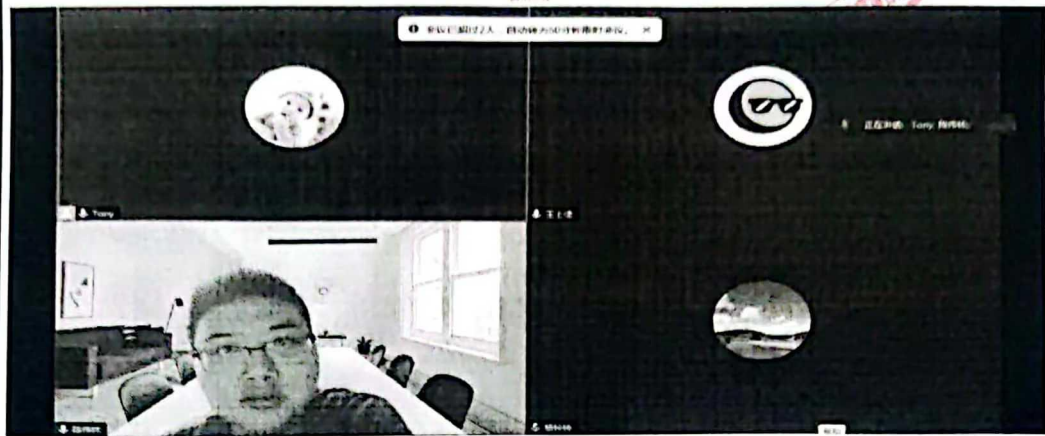

主送单位	上饶申曜新能源科技有限公司		
抄送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	20241022

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。
