

防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源项目

会议签到表

名称	防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源项目			
时间	2024. 11. 03	地点	总包会议 室	主持人 李永
议题	随. 程. 进. 度.			
序号	单位名称	姓名	职务	联系电话
1	防城港港坤新能源开发公司			
2	防城港港坤新能源开发公司			
3	防城港港坤新能源开发公司			
4	常州正衡电力工程有限公司			
5	常州正衡电力工程有限公司	李永		
6	常州正衡电力工程有限公司			
7	常州正衡电力工程有限公司			
8	常州正衡电力工程有限公司			
9	安徽成和电力建设有限公司	邵成华		
10	安徽成和电力建设有限公司	汪亮生		
11	安徽成和电力建设有限公司	陈井林		
12	安徽成和电力建设有限公司	张开鹏		
13	安徽成和电力建设有限公司	张开录		
14	安徽成和电力建设有限公司			
15	安徽成和电力建设有限公司			

防城港市防城区那良镇范河村
新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

第 10 次监理例会会议纪要

编号: XNYGF-ZHJL-JLLH-010

签发:



会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 11 月 03 日
会议主持人	朱友军		

会议主题: 关于工程质量、进度、安全会议

一、参加单位及人员:

建设单位: 防城港港坤新能源开发有限公司
监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位: 安徽成和电力建设有限公司

参会人员: 详见会议签到表

二、会议主要内容与决定:

2024年11月03日 20:00, 常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目第十次监理例会, 会议内容及决议如下:

三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报

1、进场人员、机械情况:

- 1.1. 项目部管理人员4人, 施工人员20人
- 1.2. 机械设备进场情况: 引孔机1台, 装载机1台, 拖拉机1台, 挖机1台, 叉车1台, 满足现场施工要求

2、工程形象进度及下周计划 (根据工程进度表填写)

工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
一号地块道路工程 (m ²)		180	0	0	180	/
一号地块光伏区	场地平整 (亩)	55	0	0	55	/
	管桩施工 (根)	625	0	0	625	/
	光伏支架 (组)	167	0	0	167	/
	光伏组件 (块)	4676	0	0	4676	/

		接地扁铁 (m)	1340	600	600	1400	/
		电力直流线 4m2 (m)	40000	0	0	25000	15000
	二号地块道路工程 (m2)		/	/	/	/	/
	二号地 块光伏 区	场地平整 (亩)	55	0	0	55	/
		管桩施工 (根)	688	329	329	614	74
		光伏支架 (组)	183	49	48	67	40
		光伏组件 (块)	5124	1540	1540	1848	1500
		接地扁铁 (m)	1600	200	200	200	500
	三号地块道路工程 (m2)						
	三号地 块光伏 区	场地平整 (亩)	133	0	0	11	50
		管桩施工 (根)					
	四号地块道路工程 (m2)						
	四号地 块光伏 区	场地平整 (亩)	58	0	0	20	40
		管桩施工 (根)					

3. 材料、设备到货

序号	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
01	- 号地块管桩 (根)	625	0	0	625	/
02	- 号地块支架 (mw)	3.3	0	0	3.3	/
03	- 号地块组件 (块)	4676	0	0	4676	/
04	- 号地块电力直流线 4m2 (m)	40000	0	0	40000	/


05	-号地块接地扁铁(T)	2.73	0	0	2.73	/
06	二地块管桩(根)	688	399	399	688	/
07	-号地块电缆(m)	2000	0	0	0	2000
08	-号地块汇流箱(个)	11	11	11	11	/
09	二号地块接地扁铁(T)	3.1	3.1	3.3	3.1	/

五、需建设单位协调问题:

1. 三号、四号、五号地块道路较窄,材料车辆行走不安全能否加宽便于车辆行走:

六、监理对下周工作安排如下:

1. 加强施工现场质量及安全巡视检查工作;
2. 对一号地块光伏支架安装外形尺寸、安装方向、位置、垂直度、角度、检查;
3. 对一号地块组件外形尺寸、角度、组件边缘高差、平整度、安装形式、安装标高检查;
4. 严格执行监理报验程序,对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知单并报告建设单位;
5. 监理旁站二号地块基础管桩施工,检查管桩出厂合格证及型式检验报告质量证明文件是否齐全完好。检查孔深及垂直度是否符合要求,检查桩间距、垂直度、水平度、桩顶标高是否符合要求,检查桩长及贯入深度是否合格;
6. 对进场材料开箱验收并见证取样及送检及现场见证试验工作。
7. 施工期间严格质量、安全把关,如发现有质量、安全隐患的地方不管什么原因必须先落实整改,整改合格后在施工。
8. 施工现场支架及组件安全防范措施必须全部落实到位,如发现违规将进行处罚。
9. 严格按照施工、验收规范标准施工,发现质量问题及时下发整改通知单。问题严重的将进行技术考核。

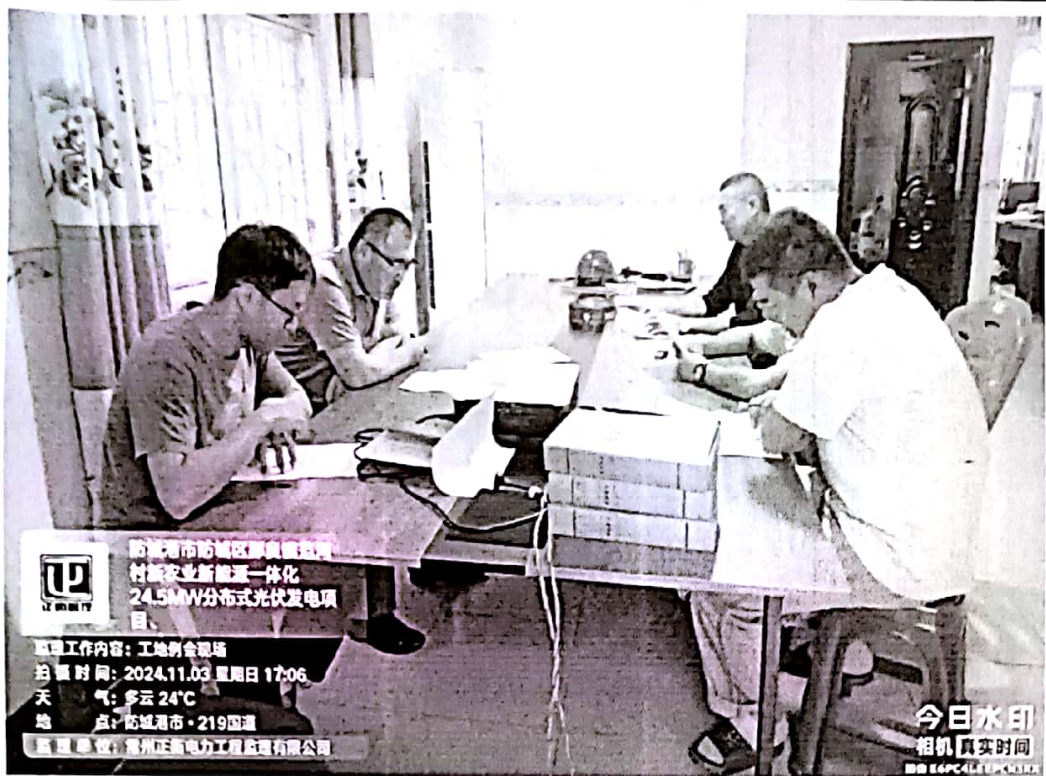

第 10 次例会现场

主送单位	安徽成和电力建设有限公司		
抄送单位	防城港港坤新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.11.03

