

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号：GD-ZHJ-C02-009
签发：高立标

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 12 月 16 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表
会议主题：安全、质量、进度、造价			
会议内容： 一、施工单位上周施工情况： 1、光伏场区： （1）打桩：分区 25、分区 50、分区 53、分区 74、分区 76、分区 60 打桩作业本周完成 1932 根，共计完成 12258 根，完成 14.47%； （2）塘口改造：已改造可施工 1650 亩，正在改造 300 亩，待改造 840 亩，1010 亩需修路 2、材料到货情况： （1）管桩 2252 根，共计到货 13517 根 二、本周施工计划： 1、光伏场区： （1）打桩 4200 根 三、监理工作要求： 1、冬季天气干燥，现场严禁明火、流动吸烟，总承包单位必须加强消防安全知识宣传教育，提升检查和消除火灾隐患的能力，加强灭火设施等应急物资的配备； 2、年末施工人员心态松懈，但安全工作不能松懈，习惯性违章出现“打游击”现象，总包单位单位一定要加强安全管控，一要加强教育、交底，二要积极进行检查、指导； 3、施工人员宿舍严禁炭火取暖，加强煤气、取暖电器设备管理，防止发生火灾、爆炸、煤气中毒等安全事故； 4、现场个别区域管桩打到塘埂上，后期是否存在不稳定因素，总包单位要认真考量； 5、总包单位要加快出图和图纸交付进度； 6、起重工等特殊工种必须持证上岗，证件必须合法有效，如果现场发现无证人员将按照规定进行考核； 7、意外险和工程一切险、进度计划总包单位尽快报审。 四、监管单位提出的要求 1、目前出现塘口桩基标高不一，村民无法理解；桩打在塘埂上，村民阻工等现象。总包单			

位要按照各个标段、各个分区所对应的每个村组每一户，把每个存在问题需要协调的事项对应到各个塘口，收集整理资料，跟对口的各乡镇土地流转负责人做好对接工作；

2、总包单位尽快将工程量清单交给 3 家监理单位总监，监理单位对春节前需要支付的款项进行核对，作为工程款支付的依据；

3、检验批和划分单元等资料及时报验；每个分区土建管桩打桩、材料送检、隐蔽工程及时报验；

4、管桩方面不符合要求的管桩厂家必须清退，总包单位适当调整管桩供应商，满足现场打桩作业需求。监理单位发现不合格管桩要加倍处罚直至清退；

5、监管单位作为工作例会牵头组织单位，后期工作例会由 3 家监理单位轮流主持；

6、塘口改造方面，目前很多桩打到塘埂，设计单位排布有没有超越红线？监理单位要对桩位进行复核；

7、已经对三家监理单位下发联系单，3 家监理单位要按照联系单的要求，及时提供合同、单位、人员资质、通知单、联系单、考核单等资料。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2024 年 12 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。




会议签到表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称：监理例会			
地点：项目部会议室		时 间：2024年12月16日	
参加人员			
姓名	工作单位	电话	备注
史经纬	建		
陈达	11		
史经纬	十一科技	1396170738	
陈达	碧志	13254922	
马志高	盐城航长	13033627137	
邵金宝	建思成	1760544988	
刘顺	江苏瑞丰	13196462696	
王安康	江苏碧志	1851266104	
陈达	十一科技	18876666787	
高立杆	正衡	15150830051	
徐文平	正衡	15660615208	



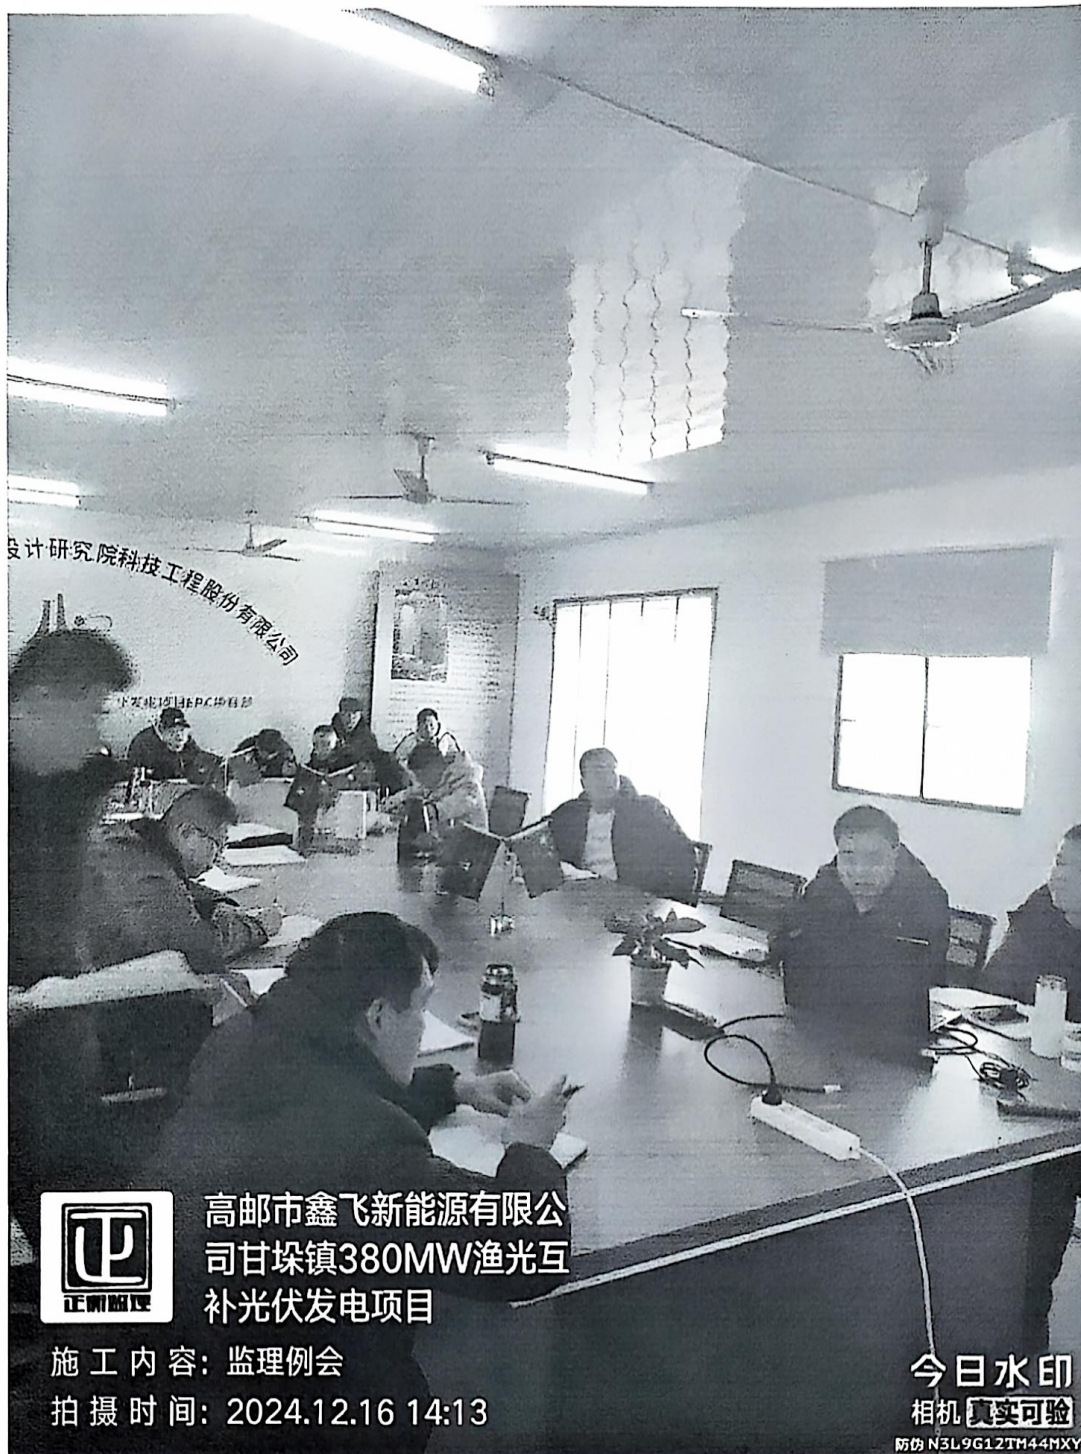

高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2024.12.16 14:13

今日水印

相机 真实可验

防伪 N3L9G12TH44MXV

