

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号：GD-ZHJL-C02-010

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024 年 12 月 23 日
会议主持人	高立标	参会人员	高立标

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

(1) 打桩：本周完成 1287 根, 共计完成 13545 根

(2) 塘口改造：已改造可施工 1950 亩，正在改造 300 亩，待改造 840 亩，710 亩需修路

2、材料到货情况：

(1) 管桩 1819 根，共计到货 15536 根

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

(1) 打桩 4200 根；

三、监理工作要求：

1、近期气温大幅度降低，水面、路面结冰等伴随而来，总包单位必须做好防寒、防滑、防风、交通运输等安全工作，同时总包单位细化落登高、吊装、交通等安全管理工作，运输设备材料时要做好路勘工作；

2、总包单位要加强现场安全管理，提高施工人员安全防范意识，每个人都要配齐安全防护用具，正确使用安全防护用具；

3、新进场的管桩厂家资质资料要尽快报审；

4、12 月 2 日例会要求总包单位在 12 月 20 日前报审进度计划、《项目划分表》等资料，目前还没有按照要求全部提供，总包单位必须尽快提供；

5、塘口工作方面，部分塘口改造不符合方案要求，总包单位必须提交经项目村签字盖章的塘口改造变更说明；

6、60 区部分施工区域上方有高压电缆，现场施工必须保证安全距离，做好安全措施；

7、二竖排改三竖排区域必须先打试桩，依据试桩数据设计出图后才能施工，如果不打试桩先施工，监理将下发停工令停止施工。

四、监管单位提出的要求

1、新进场的管桩厂家资质资料要尽快报审，工序报验资料要及时；

2、项目塘口分散，对工程有重大影响的塘口资料总包单位要尽快整理提供给监理单位；

3、二竖排改三竖排属于重大变更，总包单位必须要打试桩，为了不影响进度，试桩工作必

须要提前；

4、总包单位要申报《冬季施工方案》、《高压电防护方案》，方案批准后再施工；

5、总包单位每次例会前要提前收集对进度有影响的因素，并在例会上汇报，监理、总包项目部要和业主和监管单位做好对接；


6、各项目打桩工作要均衡，如果三个项目要同步验收，总包单位要合理安排、均衡调配资源；

7、临近年关，针对一些顽症如龙海公司一直未提供资质等，如提交进度款付款申请时将不予支付。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2024 年 12 月 23 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



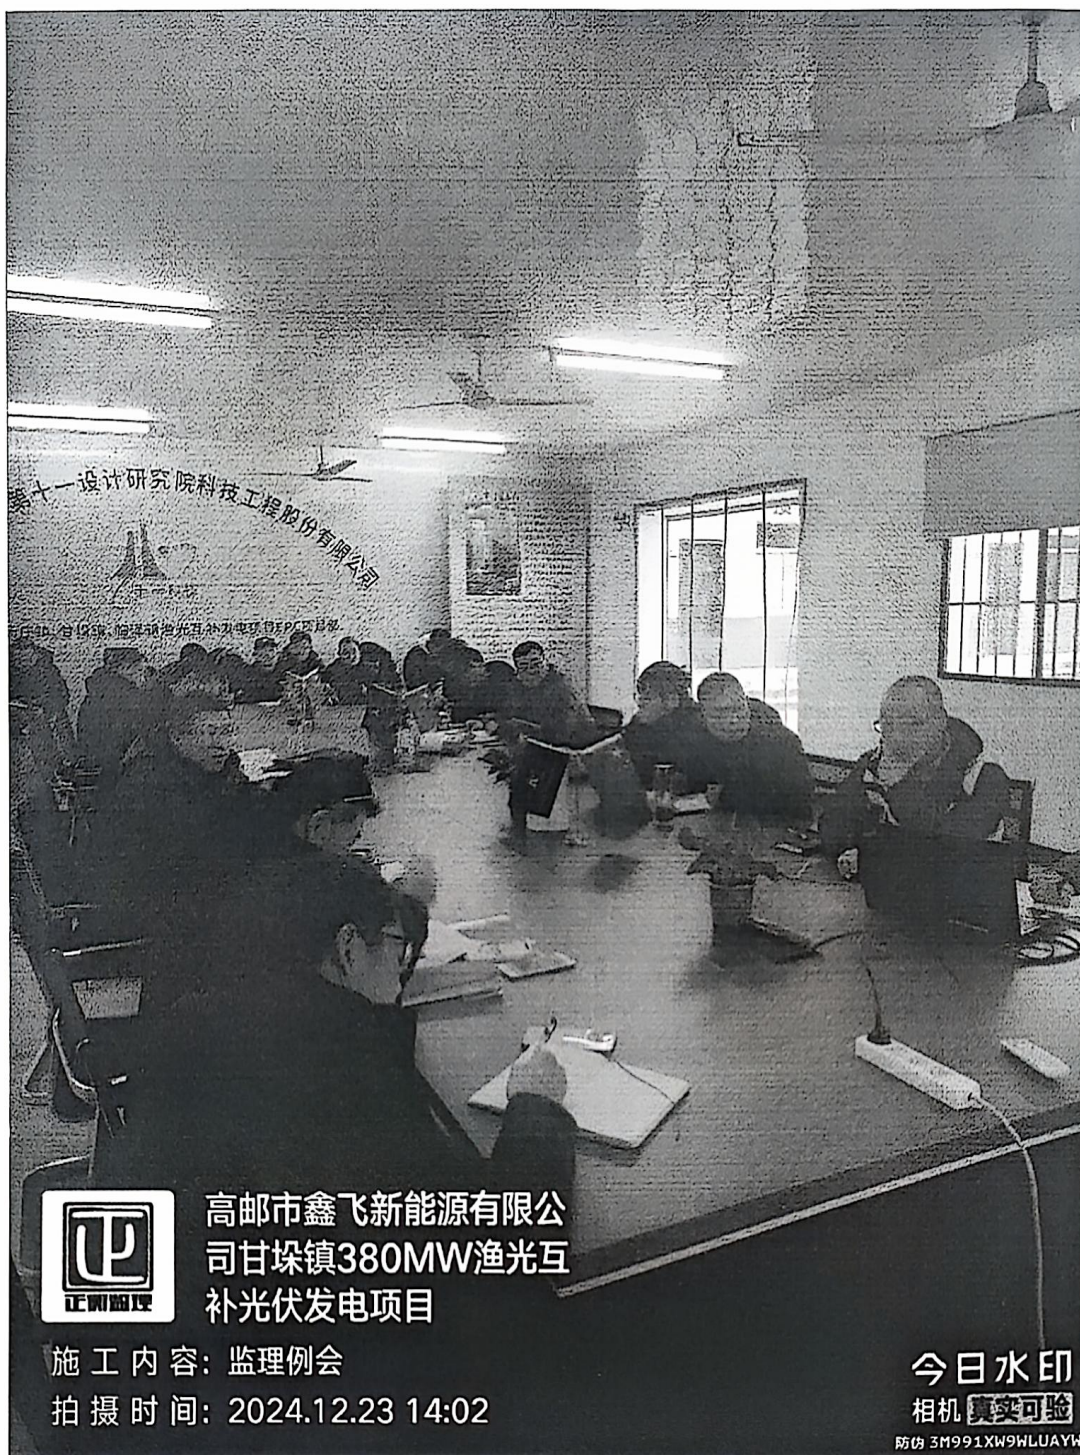

高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2024.12.23 14:02

今日水印

相机 真实可验

防伪 3M991XW9WLUAYW

