

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 签发：高立标
编号：GD-ZHJL-C02-012

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 01 月 06 日
会议主持人	高立标	参会人员	高立标 附件会议签到表 监理单位

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

(1) 打桩：分区 27、分区 29、分区 31、分区 51、分区 57、分区 58、分区 60、分区 74、分区 85 打桩作业本周完成 1947 根，共计完成 18301 根 (21.61%)

(2) 塘口改造：已改造可施工 2161.77 亩、正在改造 200 亩、剩余 710 亩需修路

2、材料到货情况：

(1) 管桩 1626 根，共计到货 19572 根

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

(1) 打桩 4200 根；

三、监理工作要求：

1、桩基验收要求总包单位必须提供桩基检测报告；

2、图纸问题 (1) 现有打桩区域图纸未全部提供；(2) 图纸的设计深度不够，部分区域不同桩长和型号的管桩打桩数量用百分数表示，但又备注仅供参考，不符合规范要求。总包单位必须及时提供符合设计深度要求的图纸，否则造成施工质量问题或用错桩型，由总包单位自行承担费用和工期损失等一切后果；

3、建议设计桩型最好统一，如果不能统一桩型，总包单位技术交底必须到位，必须要提供书面交底记录；

4、作业人员花名册没有电话号码，总包单位要补充完善相关人员电话号码。

四、监管单位提出的要求

1、总包单位要把三竖排试桩时间及点位告诉监理；

2、总包单位要细化摸排管桩厂家生产能力，要提前备桩，春节放假前施工单位要满负荷工作；

3、二竖排改三竖排属于重大变更，总包单位要提供书面资料给建设单位签字确认调整依据。二竖排正式图纸及工程量年底前总包单位要提供出来；

4、总包单位要尽快上报年底工程量，24 年 12 月 31 日前的工程量必须是实际完成的工程量，

25 年 1 月的工程量要预估至除夕前，预估标准是 24 年日平均工程量。塘口改造和道路修建土方工作量，要附改造或修建前后图片； 5、下次例会塘口协调人员要汇报，塘口协调人员和监理要对接，监理要把工作重心转向塘口移交、塘口改造方面，每个监理单位要安排专人对接，推进土地流转； 6、《冬季施工方案》、《高压电防护专项方案》2 个方案尽快上报审核，监理对照方案加以检查； 7、总包单位春节现场要有人值班，安全防护要主动防护，要以人为本提高安全意识，机械要勤加检查。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 01 月 06 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表




工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称：监理例会

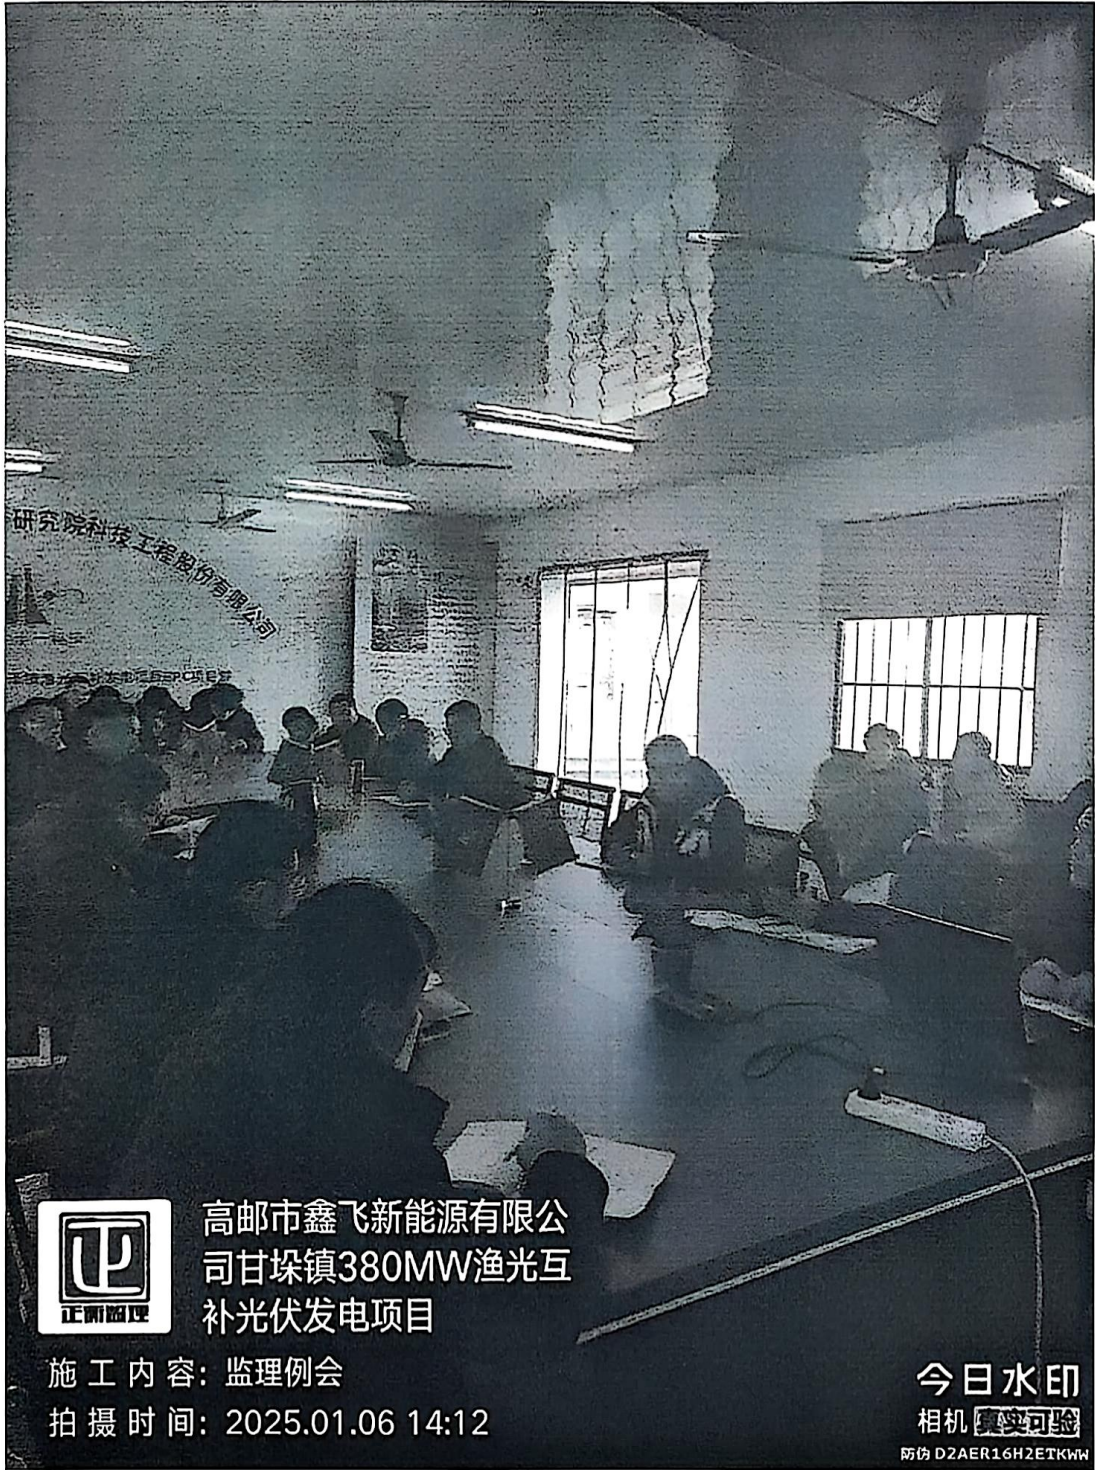
地点：项目部会议室

时 间：2025 年 9 月 06 日

参加人员

姓名	工作单位	电话	备注
	建力		
陈彦彦	新源汇		
付永新	新源汇		
史绍成	十一科技	13961707038	
	十一科技	13754091195	
刘金涛			
	浩恩成	15366403227	
	航大	13033627137	
马长春	建力		
			
王吉康	河南建业	18512066114	
王吉康	十一科技	18896666797	
王红	河南建业	1319610296	
高立标	正衡子	15150830051	
徐文平	正衡监理	15610615208	

高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
监理单位



高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2025.01.06 14:12

今日水印

相机 型号可验

防伪 D2AER16H2ETKWW

