

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 签发：高立标
编号：GD-ZHJL-C02-016

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025年03月08日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

（1）打桩：分区 31、分区 53、分区 54、分区 55、分区 84、分区 61、分区 64、分区 65 打桩、分区 66 作业本周完成 2247 根，共计完成 25505 根（30.11%）

2、材料到货情况：

管桩 2393 根

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

（1）打桩 7028 根；

三、监理工作要求：

1、总包单位要加快场区修路进度，增加作业面。同时增加人力、物力等资源，加快项目进度；

2、高压电缆下施工要严格按照审核通过《高压线路安全施工方案》和电网要求进行报备和施工，施工时必须要有安全人员在现场监护；

3、管桩吊卸和转运过程中要加强成品保护；

4、设计代表必须驻场，提高施工过程中需要设计解决的问题的效率；

5、新进场的管桩厂家资质及春节后进场的机械必须及时报审，不合格管桩退场时要通知监理旁站见证；

6、总包单位的安全员要按照规定现场履职，加强日常安全检查，落实各项安全措施；

7、EPC 总包单位必须尽快投保工程一切险；

8、总包做好异常天气施工安全保证措施，按相关规定合理安排施工作业，大风、雷雨天气，严禁从事高危作业；

9、EPC 总包单位尽快提供图纸；

10、打桩作业过程中要加强自检工作，新进场的打桩队伍要加强技术交底和培训。


四、监管单位提出的要求

1、塘口改造是重要的施工内容，要严格按照报批方案施工，改造、拆除塘埂要便于养殖，

如果因后续不便于发包的塘口不改造，要经过验收，监理验收后，报建设单位验收。如因改造不合格，后续的发生经济补偿由总包单位承担； 2、施工图纸方面，已经施工、已确定的图纸，尽快出图； 3、79 分区管桩打不下去，如何处理？总包单位尽快解决； 4、各分区管桩供应的配套桩型要到位，具备条件的塘口支架桩、箱变桩、桥架桩要全部打完，监理单位和总包单位确认有没有少打桩； 5、新增的打桩班组，一定要强调打桩质量，质量方面总包单位要把好关，不能出现打桩质量问题，对于多次出现打桩质量问题的打桩班组要退场； 6、高压线下打桩施工，三方人员必须全天候旁站（打桩队伍负责人或安全员、总包安全员、监理人员）； 7、施工队伍要听从指挥，服从总包单位、监理单位的管理。 五、建设单位提出的要求 详见建设单位下发的会议纪要。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 03 月 03 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

高邮市鑫飞新能源有限公司
监理单位
高邮市鑫飞新能源有限公司
监理单位

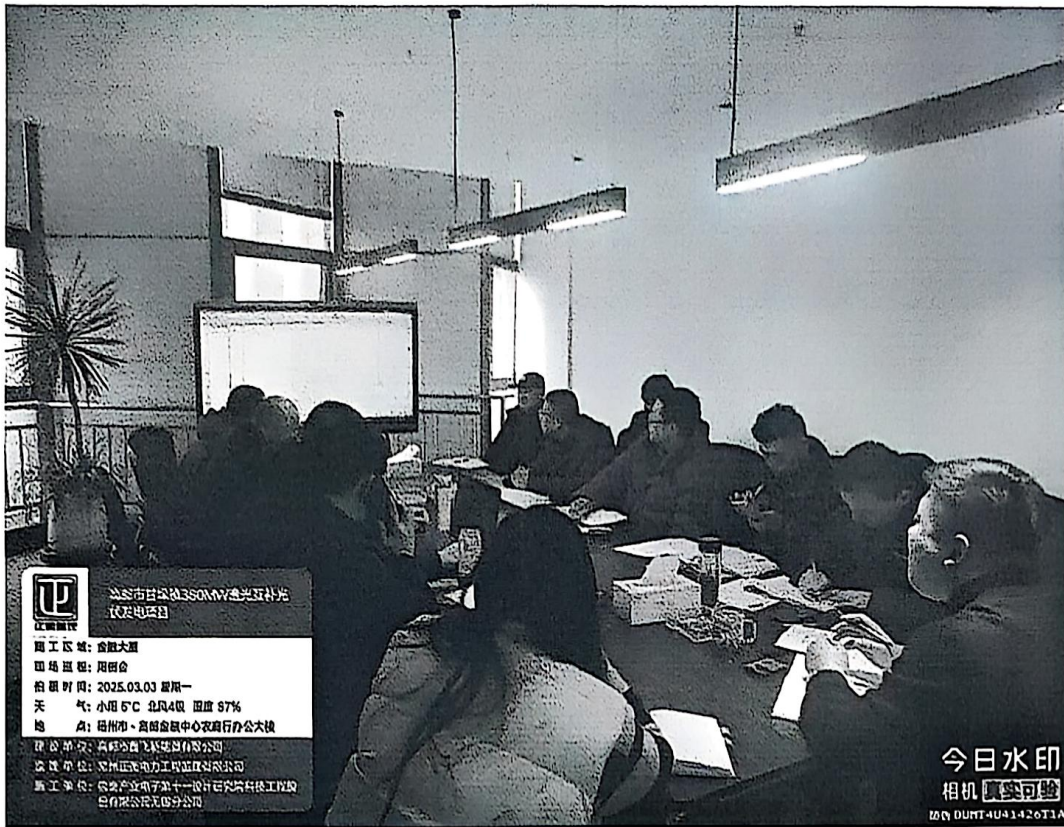

福州市汇辉350MW光伏发电项目

施工单位: 鑫源大厦
监理单位: 周国金
拍摄时间: 2025.03.03 星期一
天气: 小雨 6°C 北风4级 湿度 97%
地点: 福州市·高新区中心农商行办公大楼
建设单位: 福州汇辉光伏发电有限公司
监理单位: 福州汇辉光伏发电有限公司
施工单位: 鑫源大厦第十一设计研究院工程股份有限公司

今日水印
相机 水印相机

型号 DUMT4U41426T1A

