

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 签发：高立标
编号：GD-ZHJL-C02-017

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 03 月 10 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件：会议签到表
会议主题：安全、质量、进度、造价			
会议内容： 一、施工单位上周施工情况： 1、光伏场区： （1）打桩：分区 49、分区 51、分区 59、分区 63、分区 64、分区 79、分区 80 上周完成 1934 根，共计完成 27439 根（32.39%） 2、材料到货情况： （1）管桩 3178 根 二、本周施工计划： 1、光伏场区： （1）打桩 7819 根； 三、监理工作要求： 1、项目进度要加快，总包单位必须增加桩机、管桩，并加强桩机维保工作。 2、随车吊、新进场的打桩机和管桩厂家，总包单位必须及时报审。 3、日报、周报的数据必须严谨准确； 4、现场使用的随车吊等管桩转运车辆严禁超载； 5、塘口改造完成后，必须经验收合格才能打桩； 6、总包单位必须于 3 月 15 日前完成工程一切险的投保； 7、管桩进场质量及打桩作业质量，施工单位必须要加强自检工作。 四、监管单位提出的要求 1、甘垛项目体量最大作为重点抓手，打桩工作量滞后很多，目前日工作量远远赶不上春节前日工作量，总包单位要高度重视甘垛项目的管桩供应、机械调配、计划安排、施工管理等工作； 2、打桩施工质量，打桩班组一定要重视桩体垂直度、标高、定位等，对于多次出现打桩质量问题的打桩班组要退场。打桩质量最终以承载力检测报告为准； 3、总包单位的安全管理，宏观上有所加强，施工现场安全管理，总包单位要重点抓现场。针对本项目特点项目地点比较分散的状况，专兼职安全员要在现场，要抓细节。 4、一切险严格按合同执行，十一科技法务部门要发函给新霖飞，阐明利害关系、催办此事。			


0)

2025.03.10

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 03 月 10 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



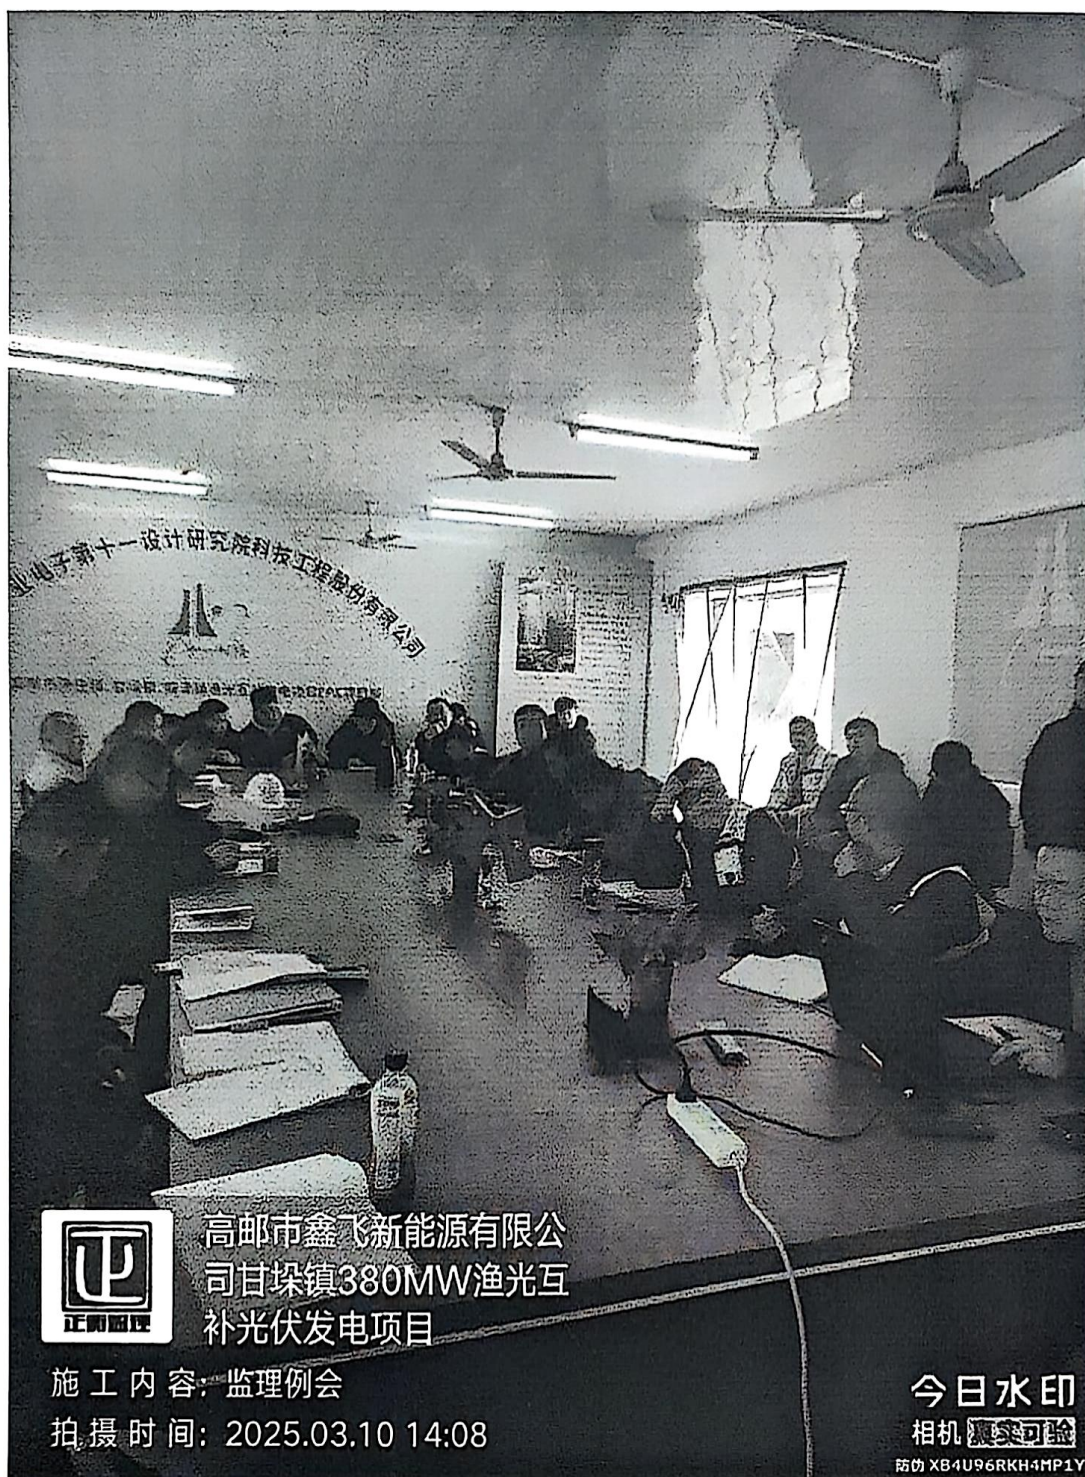

高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容：监理例会

拍摄时间：2025.03.10 14:08

今日水印

相机 影石相机

防伪 XB4U96RKH4MP1Y
