

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 签发：高立标
编号：GD-ZHJL-C02-019

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 03 月 24 日
会议主持人	高立标	参会人员	附会议签到表

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

（1）打桩：分区 39、分区 46、分区 51、分区 57、分区 59、分区 60、分区 61、分区 62
本周完成 1868 根，共计完成 31818 根（37.56%）

2、材料到货情况：

（1）管桩 1150 根

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

（1）打桩 9737 根；

三、监理工作要求：

1、高压电缆下施工必须报备，并严格按照《高压线路安全施工方案》和电网要求进行施工，施工时必须要有安全人员在现场监护；

2、总包单位应履行法定主体业务，加强管桩进场和打桩作业质量自检工作；

3、现场倾斜、设置在塘底的安全宣传横幅、标识标牌必须优化完善；

4、现场吊装前施工单位必须落实安全措施。

四、监管单位提出的要求

1、总包安全管理人员，要重在发现问题后的整改落实情况；

2、现场施工机械故障非常高，施工单位要重视；

3、现场地块、人员比较分散，总包单位对进场人员体检、保险、培训、交底要落实，人员超龄问题要重视；


4、进度方面，除了塘口流转，现场小的矛盾总包单位要抓紧协调，各光伏方阵施工要全部收可；

5、质量方面，现场桩头破损严重的要返工。施工单位在卸桩、运桩、打桩过程中对桩体垂直度、桩头破损等要加强检查；

6、每个工序总包单位要按照相关规定报验，塘口验收合格才能安装支架，各塘口改造后要到村组盖村部行政章并提供原件。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 03 月 24 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

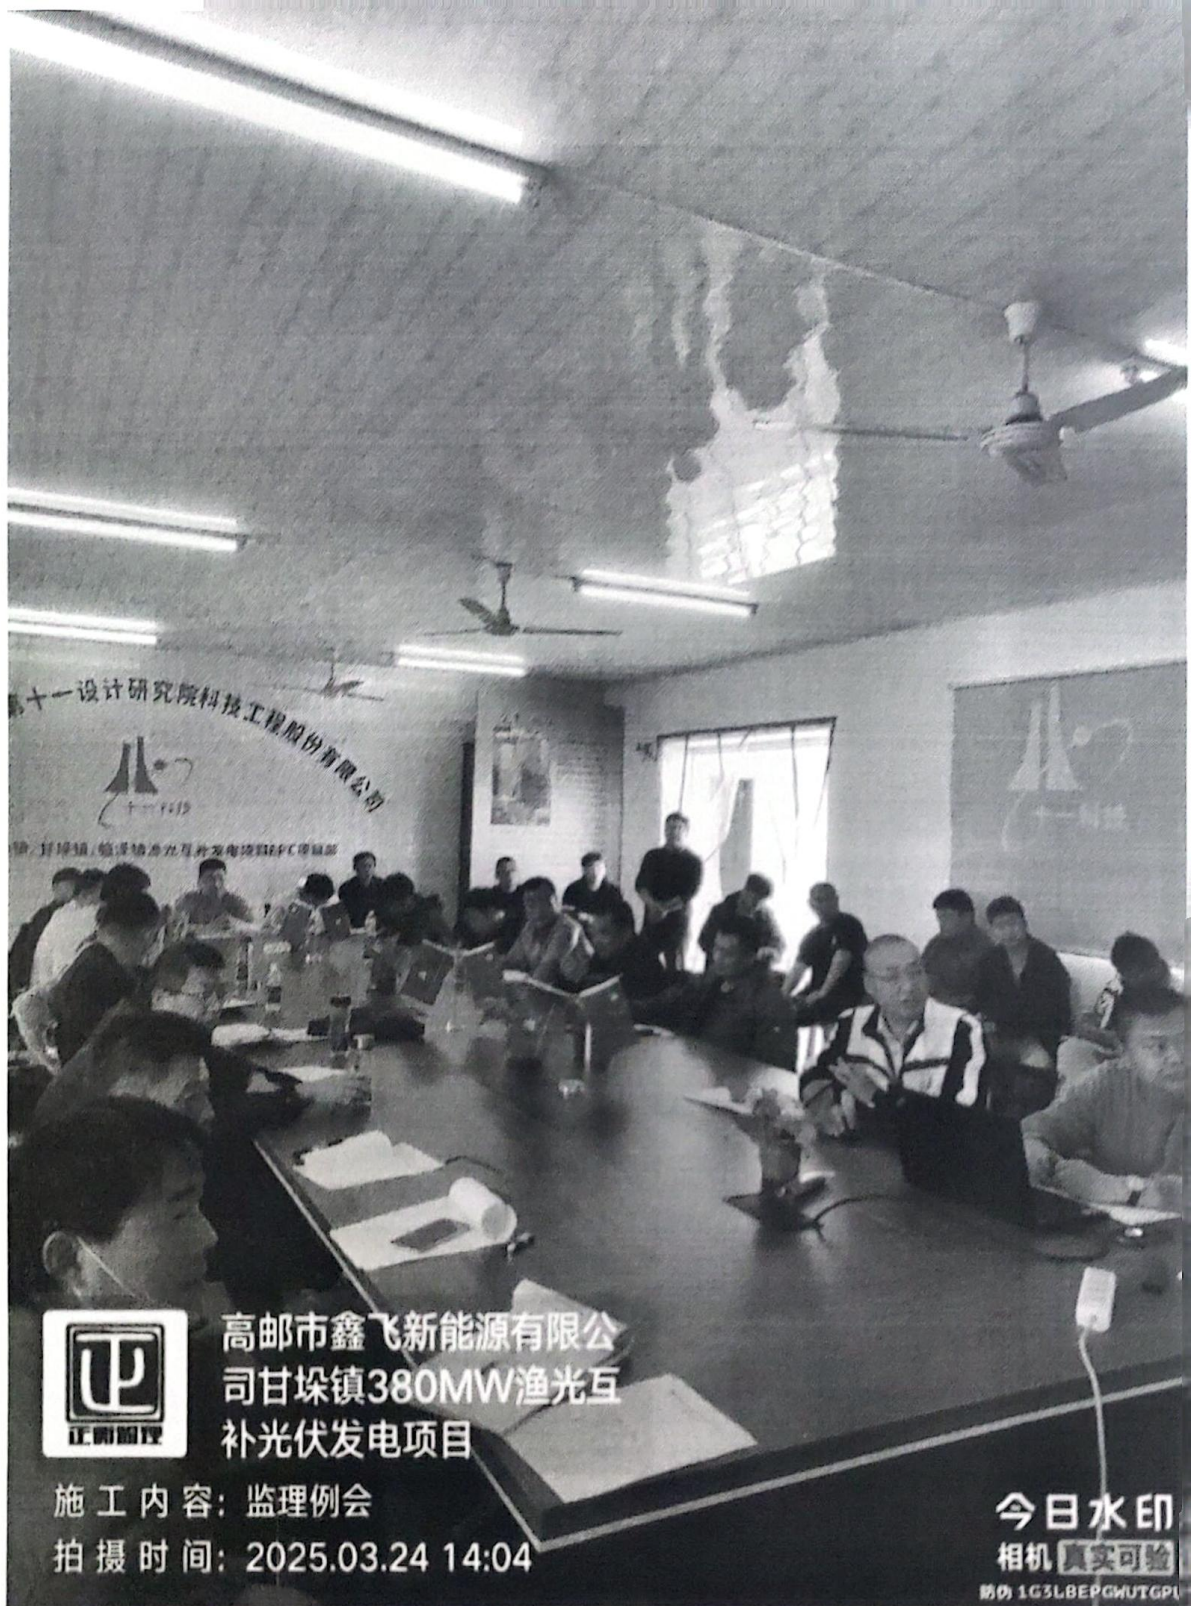

第十一设计研究院科技工程股份有限公司
第十一设计研究院
设计、监理、运维、光伏、风电、储能、EPC、总承包



高邮市鑫飞新能源有限公司
甘垛镇380MW渔光互
补光伏发电项目

施工内容：监理例会

拍摄时间：2025.03.24 14:04

今日水印

相机 真实可验

防伪 1G3LBEPGWUTGPU
