

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 签发：高立标
编号：GD-ZH11-C02-022

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025年04月14日 高邮市甘垛镇380MW 渔光互补光伏发电项目 附件：会议签到表
会议主持人	高立标	参会人员	

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

(1) 打桩：49、56、57、60、79、80、103 分区本周完成 1827 根，共计完成 38515 根（45.47%）

2、材料到货情况：

(1) 管桩 1528 根

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

(1) 打桩 18991 根；

三、监理工作要求：

1、总包单位必须尽快提供升压站回填土来源合规性证明文件，如果无法提供，必须尽快对土壤采样检测；

2、例会上多次提出各分区的所有桩要全部打完，监理统计发现甘垛项目前期大部分分区只打了支架桩，总包单位必须尽快把这些区域的箱变桩、桥架桩等全部打完；

3、总包单位必须尽快报审新进场的中骏和固基管桩资料；

4、总包单位必须尽快提供已调整桩长的各分区图纸；

5、总包单位必须尽快报审升压站前期资料和扬尘控制方案；

6、总包单位必须尽快提供桩基的桩身完整性检测报告。

四、监管单位提出的要求

1、施工现场存在的问题，属于十一科技管理存在问题，安全方面十一科技要做的尽职一点；

2、设计方面，已完成区域的图纸要尽快提供

3、因总包单位资料员更替，造成资料存在较大的偏差，汤庄和甘垛项目的资料总包要抓紧，质监资料十一科技要有专人跟踪；

4、项目第三次付款，没有完成整改的部分不付款；

5、对工人不戴安全帽等一些屡教不改的问题，监理一次通知，二次考核，三次重罚；

6、关于进场之后的支架、塘口改造等报验按照规矩来。塘口改造必须按照方案实施，现场不具备条件，确定不改造的个别塘口，总包要提供村组签字认可的文件。支架安装前准备

工作、方案报验，总包要提供合规性材料； 7、总包单位要强化正常工作，重点工作要重点抓，重点抓汤庄、甘垛项目的首次质监工作； 8、配套工程施工，总包单位要统筹安排。升压站土地手续、模拟审批手续总包单位要做好； 9、土地流转方面，业主单位的问题，业主单位已经积极的跟踪协调。总包单位的问题，总包单位要积极协调。			
主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 04 月 14 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称：监理例会


地点：项目部会议室

时 间：2025年04月14日

参加人员

姓名	工作单位	电话	备注
王成	建工		
陈松	11		
史绍成	十一科技		
张恩成	十一科技		
孙志东	海安		
王成	建工		
高志标	正德监理		
徐文平	正德监理	15610615208	



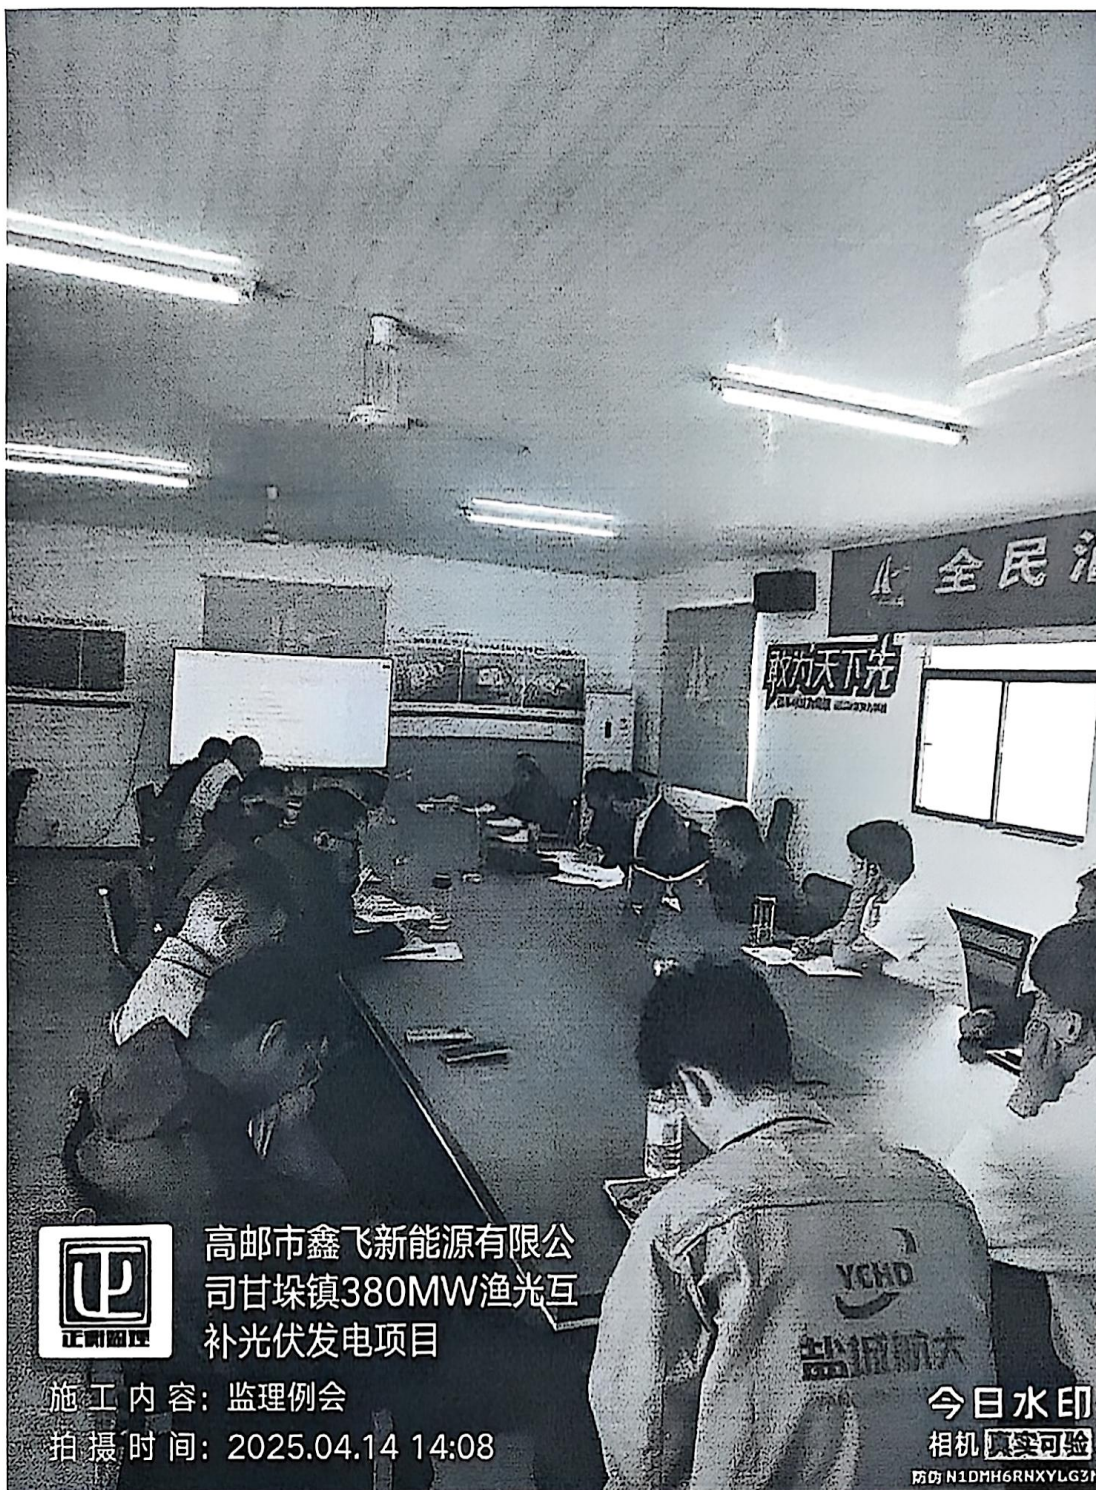

高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2025.04.14 14:08

今日水印

相机 真实可验

防伪 N1DMH6RNXYLG3N

