

# 会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

编号：GD-ZHJL-02-028

|   |        |      |             |
|---|--------|------|-------------|
| 会议地点  | 项目部会议室 | 会议时间 | 2025年06月11日 |
| 会议主持人   | 高立标    | 参会人员 | 附件：会议签到表    |
| 会议主题：安全、质量、进度、造价  |        |      |             |
| 会议内容：<br>一、施工单位上周施工情况：<br>1、光伏场区：<br>(1) 1、5、6、34、37、51、72、97、111 分区本周完成支架桩 3343 根，共计完成 61636 根<br>(2) 箱变基础本周完成 0 个，共完成 47 个。<br>2、材料到货情况：<br>(1) 管桩本周到货 3082 根<br>二、本周施工计划：<br>1、光伏场区：<br>结合地块流转情况跟进调整<br>三、监理工作要求：<br>1、下周即将进入梅雨天气，总包单位必须采取措施，增加和协调资源加快项目的施工进度。<br>2、现场巡视发现：光伏区大部分浮船拼装人员不佩戴安全帽，要求总包单位对新进场施工人员100%落实3级安全培训，提高人员安全防范意识，正确佩戴个人防护用品。<br>3、总包单位必须做好台风等异常天气的安全施工措施，做好现场防洪排涝安全措施。<br>4、现场安全文明施工方面，总包单位必须持续加强施工现场巡视检查等安全管理工作，对于违章行为、不安全因素应及时予以制止，整改完成后方可继续作业。<br>5、安装施工前，总包单位必须认真组织安全技术交底，光伏区各分区塘口改造和桩基必须验收合格。<br>6、防雷接地材料必须验收合格后才能使用。<br>7、总包单位要提供升压站试桩计划和试桩检测报告，试桩进场时及打试桩前要通知监理。<br>四、监管单位提出的要求<br>1、项目进度有所欠缺，升压站进度要加快，要满足迎接质监要求。 |        |      |             |

- 2、项目部分区域存在风机电缆矛盾需协调，其他的问题如房子拆除总包内部协调。
- 3、箱变基础必须和支架桩同步完成，避免后期安装时和箱变桩发生碰撞。
- 4、监理单位人员及专业要齐全及与项目配套。
- 5、支架桩各个区检测报告要尽快到位。
- 6、安装班组进场，交接检一定要完成，安装前上道工序不合格不得接收。要提前进行组件功率检测。
- 7、箱变平台定位一定要准确，钢筋等材料该送检的一定要送检。




|      |  |      |             |
|------|--|------|-------------|
| 主送单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司                     |      |             |
| 抄送单位 | 高邮市鑫飞新能源有限公司                                 |      |             |
| 发文单位 | 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇<br>380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目<br>部 | 发文时间 | 2025年06月11日 |

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



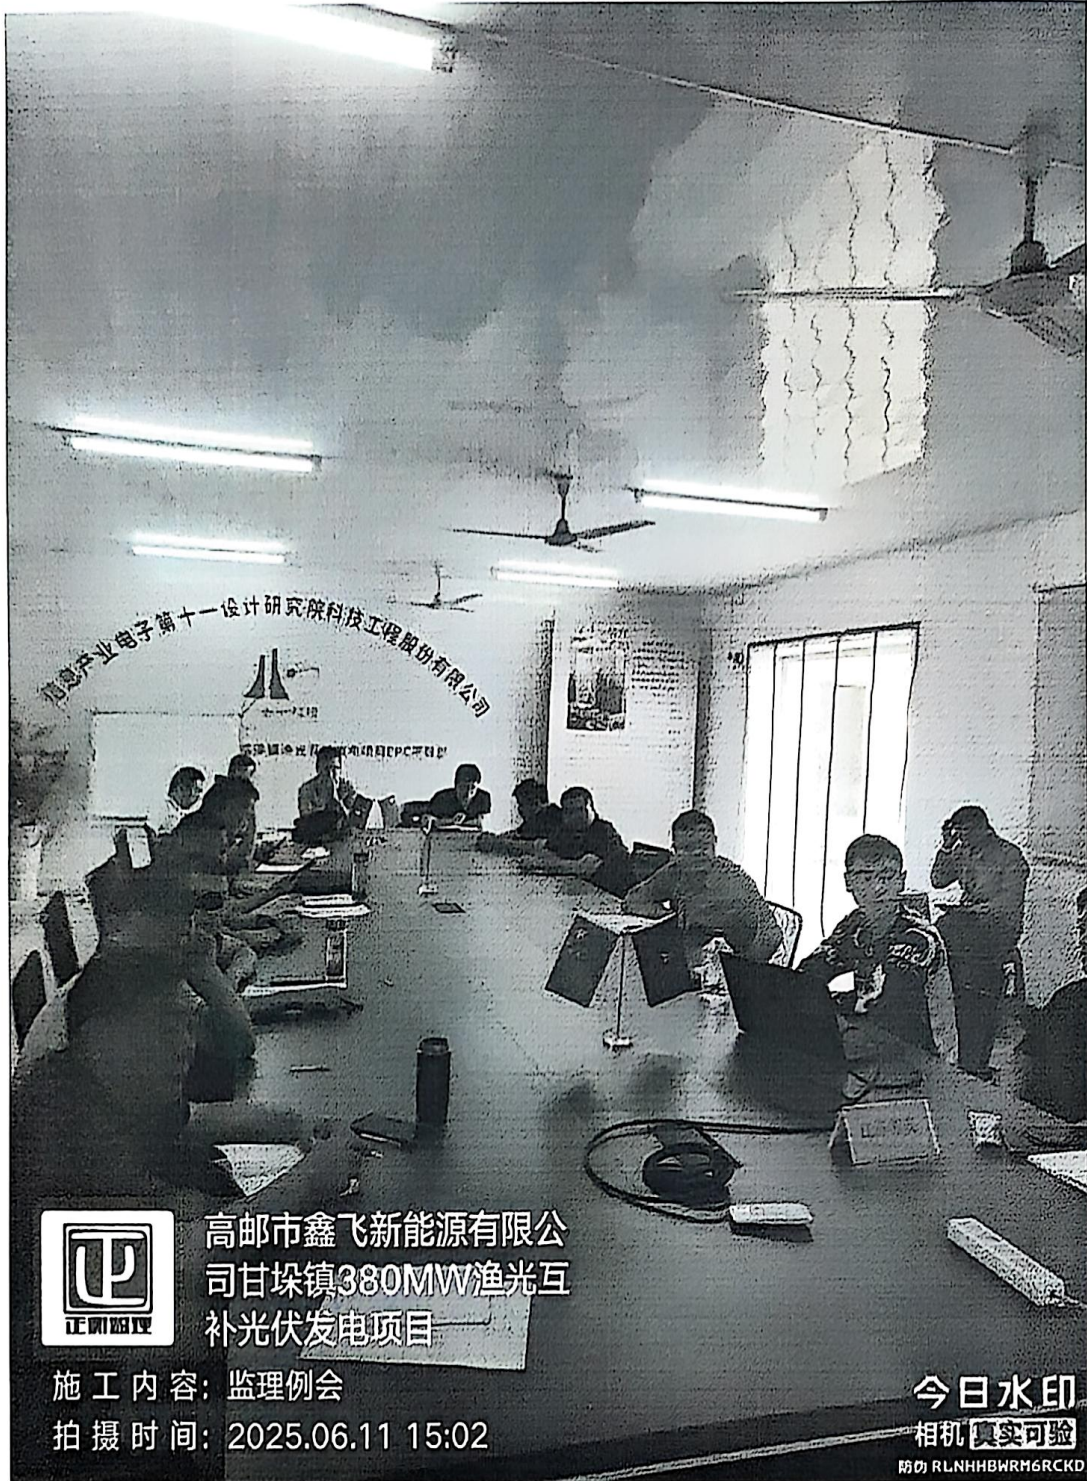
# 会议签到表

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

| 会议名称：监理例会   |      |                |    |
|---|------|----------------|----|
| 地点：项目部会议室   |      | 时间：2023年06月11日 |    |
| 参加人员  |      |                |    |
| 姓名  | 工作单位 | 电话             | 备注 |
|    | 建卫   |                |    |
| 徐海河   | 十一科技 |                |    |
| 刘旭东   | 十一科技 |                |    |
| 史新成   | 十一科技 |                |    |
| 李道峰   | 十一科技 |                |    |
| 肖志忠   | 航大   |                |    |
| 刘洋  | 航大   |                |    |
| 孙和军   | 吴仁云保 |                |    |
| 曹和平   | 江核   |                |    |
| 刘和真   | 润华   |                |    |
| 周彬  | 正德   |                |    |
| 曾鹏  | 港思成  |                |    |
| 高立标   | 正德监理 |                |    |
|  | 正德   |                |    |
|  | 正德   |                |    |
| 徐文军   | 正德监理 | 156/0615208    |    |
|   |      |                |    |
|   |      |                |    |







高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇380MW渔光互补光伏发电项目

施工内容: 监理例会

拍摄时间: 2025.06.11 15:02

今日水印

相机 [ ] 实验

防伪 RLNHBBWRM6RCKD

