

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目 编号：GD-ZHJL-C02-029

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 06 月 25 日
会议主持人	高立标	参会人员	高立标
会议主题：安全、质量、进度、造价			
会议内容：			
一、施工单位上周施工情况：			
1、光伏场区：			
(1) 1、10、14、34、35、70 分区本周完成支架桩 857 根, 共计完成 65645 根			
(2) 箱变基础本周完成 0 个，共完成 47 个。			
(3) 升压站土方平整完成，主变架构基础打桩完成 32 根。			
(4) 光伏区接地预埋完成 2100 米。			
2、材料到货情况：			
(1) 光伏区管桩本周到货 700 根			
(2) 接地材料到货 3000 米			
二、本周施工计划：			
1、光伏场区：			
结合地块流转情况跟进调整			
2、升压站			
结合天气情况调整			
三、监理工作要求：			
1、进入梅雨天气，项目即将质监，总包单位必须密切关注天气，做好下雨前的现场备桩等工作，同时增加和调配机械设备加快项目的施工进度，必须重点控制升压站的进度以符合质监要求。			
2、安装人员保险必须尽快提供，总包单位必须落实实名制管理，严禁无保险和超龄人员进场。新进场人员必须及时发放个人防护用品，进行3级安全培训，提高人员安全防范意识，正确佩戴个人防护用品。			
3、防雷接地施工前，防雷接地材料必须验收合格后才能使用。总包单位必须认真组织技术交底，统一各施工班组的施工方法，施工过程中做好防蛇虫方面的安全工作。焊接人员必须持证上岗，规范穿戴个人防护用品。			



4、防雷接地属于隐蔽工程，隐蔽前必须提前 24h 报验，验收合格后才能隐蔽。如果施工班组擅自回填，监理将要求重新挖开检查，所产生费用和工期延误由施工单位承担，同时将按照考核办法进行考核。

5、施工现场临时用电必须严格执行审批通过的临时用电方案。

6、月底质监，总包单位必须在质监前取得升压站桩基检测报告。同时总包单位必须做好现场垃圾清理、质监资料准备等迎监工作。

7、安装前塘口改造和桩基必须验收合格，安装材料必须验收合格后才能使用，安装过程中必须严格进行转序验收。

四、监管单位提出的要求

1、开例会的目的是提出问题、解决问题，日常问题监理开联系单、通知单就行了，解决不了的问题在例会上提出讨论解决。

2、十一科技和新霖飞之间协调不及时，十一科技要安排专人对接，相关问题要提前和新霖飞沟通。

3、质监后重点要放在光伏区管桩施工。

4、接地施工存在接地沟深度不足、不验收回填等问题，施工班组态度有问题，施工班组要加强自检。

5、塘口改造是目前重点，既要保证光伏区发电，又要保证作业顺畅。维持现状不需要改造的塘口，施工单位要拿相关手续过来。

6、目前影响施工的除了土地流转之外，光伏场区风机电缆等处理情况和结果总包单位要追踪。

7、工程付款，必须按照已完验收合格的工程量付款。

8、目前项目资料跟不上，总包单位要把资料报验纳入控制范围，加强施工过程资料控制。

9、安装前，总包单位要做好安全交底和技术交底。安装材料品牌更换要变更程序进行。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 06 月 25 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

工程名称: 高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目

会议名称: 监理例会

地点: 项目部会议室


时间: 2023年06月25日

参加人员

姓名	工作单位	电话	备注
高立标	建卫		
高立标	正衡监理	1515830051	
史经成	十一科技	13961707038	
孙海子	十一科技	1764441461	
李海峰	十一科技	15061835983	
刘胜书	十一科技	15710056157	
成树	泰州正衡	18921704160	
夏文英	盐城润华	15365494788	
刘明琪	润华		
王立林	润华	13606295455	
关胜	航大	15581696050	
于朝峰	润华		
刘国兴	江苏江拓	13896213234	
史俊永	江苏江拓	15995193706	
李海峰	江拓		
李海峰	江拓	13033627137	
隋峰	航大	15851118244	
隋峰	甘垛镇	15190420855	
隋峰	甘垛镇		
隋峰	甘垛镇	15951045830	

工程

甘垛镇
光伏
项目

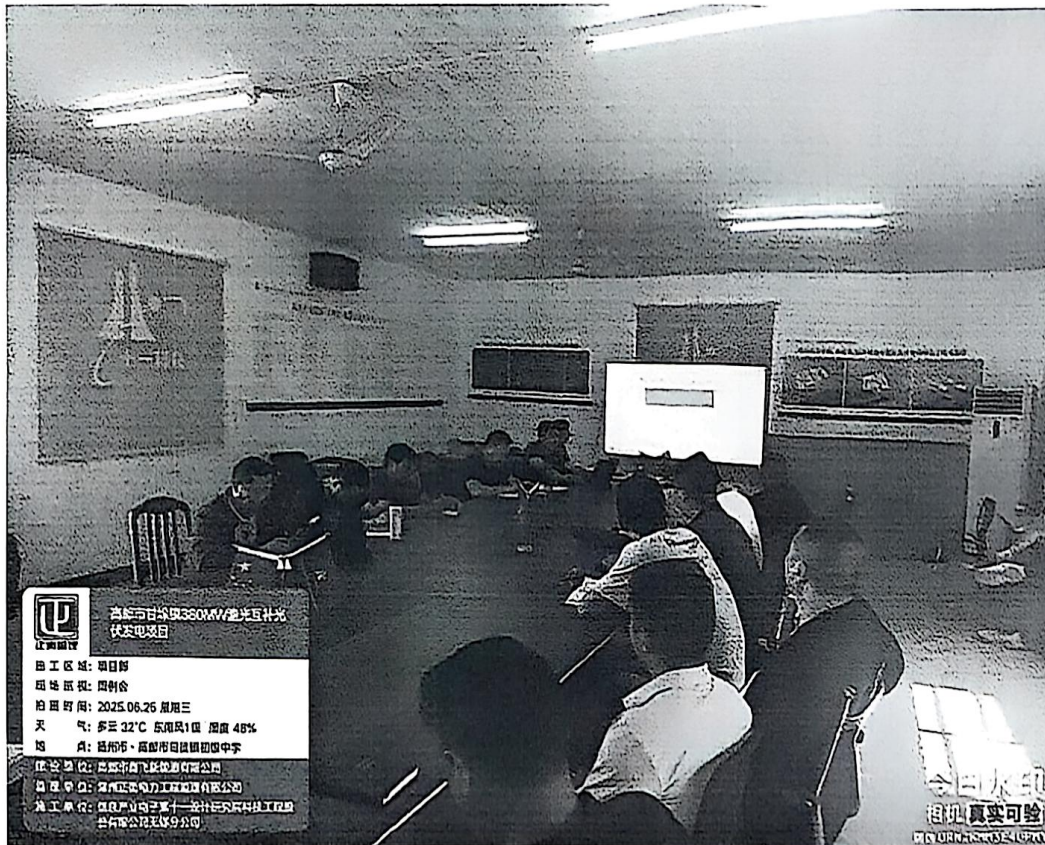

恒机有限公司
 30MW
 电项目
