

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号：GD-ZHJ-02-030
签发：高立标

会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 07 月 09 日
会议主持人	高立标	参会人员	高立标、王成、徐金到、李

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

- (1) 8、10、101、102 分区本周完成支架桩 3472 根。
- (2) 箱变基础本周完成 3 个，共完成 50 个。
- (3) 升压站桩基工程完成 431 根，所有建筑单体的基础桩均打桩完成，还剩下围墙 157 根待施作。
- (4) 光伏区接地预埋完成 18400 米。
- (5) 桩头端板除锈完成 686 根。

2、材料到货情况：

- (1) 光伏区管桩本周到货 3999 根。

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

- (1) 支架桩完成 3500 根。
- (2) 箱变基础完成 15 个。
- (3) 升压站桩基工程完成 157 根。
- (4) 光伏区接地预埋完成 20000 米。
- (5) 桩头端板除锈完成 2000 根。

三、监理工作要求：

- 1、总包单位必须增加和调配管桩和机械设备加快项目的施工进度，特别是桩基施工进度必须重点关注。
- 2、进场的防雷接地材料、立柱、支架等材料必须报验，验收合格后才能使用。支架等安装材料品牌更换要按变更程序进行，按规定取样送检，业主批准后才能使用。

- 3、夏季高温、水上作业安全措施总包单位必须落实，总包单位必须重点做好现场人员安全培训和安全交底，提高施工人员安全防范意识，正确穿戴救生衣。监理对现场安全违规发现一起考核一起，对不服从管理、屡教不改的施工人员和班组加倍考核直至清退。
- 4、塘口改造、桩基验收、桩头端板除锈验收合格前不得焊接立柱，除锈质量不合格的桩头端板必须全部返工。
- 5、桩头端板除锈施工前，总包单位必须认真组织技术交底，严格按照设计图纸和规范要求施工，立柱焊接和支架组件安装时要放线，桩头端板除锈完成后必须及时报验。不报验或验收不合格擅自安装立柱，监理按照规定进行考核，此部分工程量不予支付。
- 6、现场使用的救生衣、救生圈性能必须时符合要求，不合格救生衣、救生圈不得使用，损坏的要及时更换。
- 7、项目即将进入安装阶段，现场必须按安全相关法律法规要求增加安全员，总包单位要按照合同和施工组织设计增加人员。
- 8、各参建单位要及时完成质监整改项目和回复。
- 9、升压站桩基桩洞要设置警示牌和警示带。
- 10、总包单位要尽快在升压站设置现场办公室。

四、监管单位提出的要求

- 1、国投 3 个项目，甘垛项目进度最慢，影响因素有打桩、土地流转、升压站土地手续等，新霖飞和十一科技对 3 个项目及影响因素关注重点不同，后面要将关注重点放在甘垛项目。
- 2、风机埋地电缆避让不能影响发电量。
- 3、后面例会新霖飞负责土地流转和土建的人员必须参加。
- 4、塘口改造分为 3 块。1 不需要改造。2 按方案改造，总包、监理验收后报业主或监管单位验收，同时业主邀请村组参加验收。3 和原改造方案比较有所调整，按照方案 2 验收。
- 5、首次质监验收，绝大部分问题集中在资料上，各单位要积极整改回复，通过后才能安装，目前不允许安装支架组件。
- 6、资料员等总包项目人员必须到位。
- 7、桩基端板除锈不到位，焊接焊缝不连续、不饱满等问题总包单位要整改到位。
- 8、总包单位要把合同要求品牌提供给施工单位，施工单位要核对到场材料品牌。
- 9、当前安全，吊装作业、水上作业要进行书面交底，安全员要在现场全过程监督。项目每个人要对自己负责。
- 10、农民工工资要发放到位，避免农民工上访，总包单位要提供施工人员花名册给监理和监管单位。项目选择用工人员要严格，包括人员身体状况、精神状况、智力状况，不要选择老弱病残人员。
- 11、高温期间不要催进度，后期可能要赶进度，总包单位要做好赶工的心理准备。

主送单位

信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司



抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 07 月 09 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



会议签到表


工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目


会议名称：监理例会

地点：项目部会议室

时间：2021年07月09日

参加人员

姓名	工作单位	电话	备注
	建工集团	1895563366	
十一科技			
刘胜伟	十一科技	1377056157	
江定探	盐城航大	15873181322	
叶定来	江建	15951045830	
王田平	江建		
魏建军(十一科技)	十一科技	15370117363	
史德天	江建江建	15995141706	
王树明	盐城航大	13861406153	
刘明强	江建		
刘中宇	江建		
王江华	江建		
高立林	正衡监理	1515830051	
王江华	正衡监理	1879015547	
王江华	十一科技	15061835983	

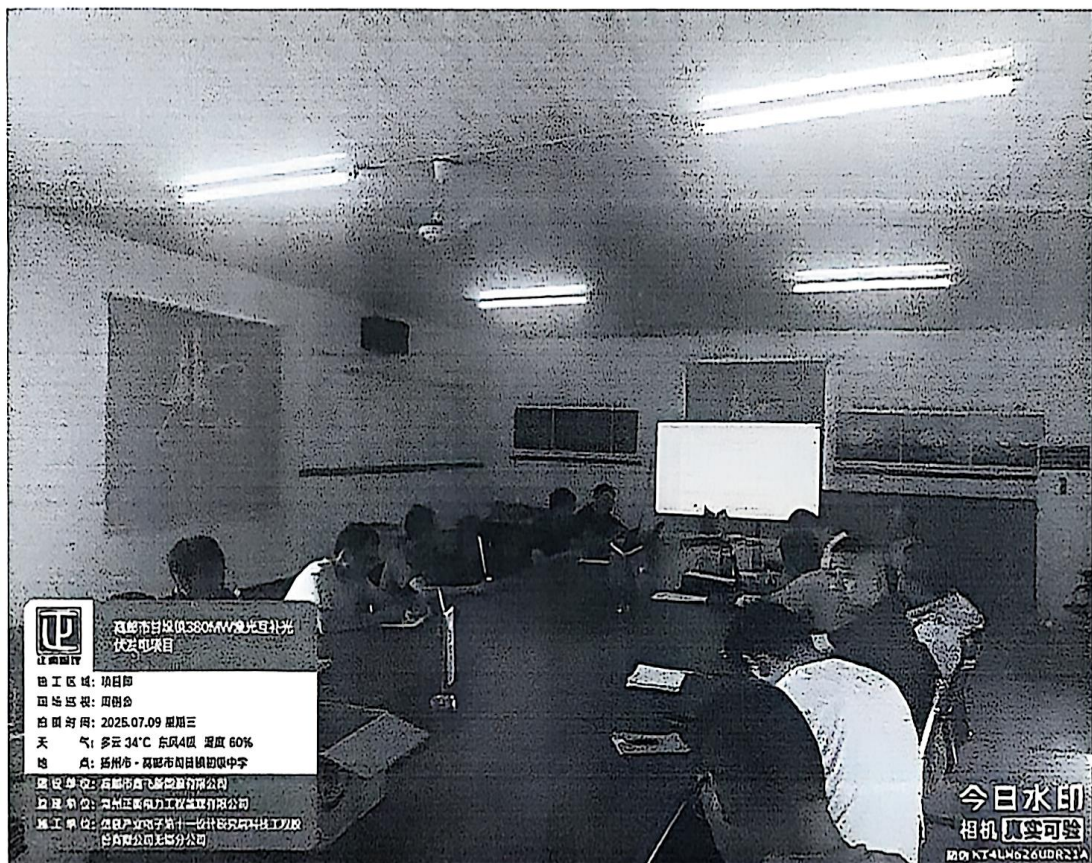

扬州市甘泉镇380kV变电站光伏
伏光发电项目

施工区域: 项目部

建设单位: 周明金

拍摄时间: 2025.07.09 星期三

天气: 多云 34°C 东风4级 湿度 60%

地点: 扬州市·高邮市甘泉镇中学

监理单位: 高邮市鑫飞建设工程有限公司

监理单位: 高邮市鑫飞建设工程有限公司

施工单位: 高邮市鑫飞建设工程有限公司

监理单位: 高邮市鑫飞建设工程有限公司

今日水印

相机真实可验

型号: KT4LW626UDR22A
