

会议纪要

工程名称：高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目
编号：GD-渔光互补光伏发电项目



会议地点	项目部会议室	会议时间	2025 年 07 月 16 日
会议主持人	高立标	参会人员	附件会议签到表

会议主题：安全、质量、进度、造价

会议内容：

一、施工单位上周施工情况：

1、光伏场区：

- (1) 分区 1、分区 10、分区 13、分区 14、分区 110 完成支架桩 1274 根，
- (2) 箱变基础打桩完成 20 台。
- (3) 安装队伍光伏区接地预埋完成 15570 米。
- (4) 立柱焊接完成 1933 根。
- (5) 桩头端板除锈完成 1933 根。

2、材料到货情况：

- (1) 预制管桩本周到货 1030 根，共计到货 70850 根。
- (2) 光伏区接地圆钢本周到场 41600 米，累计到场 61600 米。

二、本周施工计划：

1、光伏场区：

- (1) 支架桩完成 3640 根。
- (2) 箱变基础完成 10 个。
- (3) 光伏区接地预埋完成 14000 米。
- (4) 桩头除锈、立柱焊接完成 3500 根。

三、监理工作要求：

- 1、总包单位必须定期检查现场存在的安全隐患，做好现场防溺水、防暑降温工作。
- 2、材料到场必须报验，验收合格后才能使用。锌包钢、钢筋、支架等材料尽快取样送检。
- 3、桩头除锈必须报验，验收合格才能焊接立柱，总包单位必须加强自检，落实三检制，做好转序验收和防雷接地、桩头除锈等隐蔽工程验收工作。

- 4、塘口改造验收合格前不得安装组件支架。
- 5、浮船的强度、稳定性、抗倾覆性必须符合要求，必须经十一科技验收合格才能使用。施工单位加强水上施工人员的安全教育，浮船上的材料放置要均衡，防止浮船倾覆。
- 6、现场安全员不够还需增加。
- 7、总包单位必须增加并完善光伏场区、升压站、浮船安全警示标识标牌和警示带、落实浮船上锁管理措施，防止周边居民误进入、误使用发生安全事故。
- 8、材料增加品牌，总包单位需以书面形式提出品牌增加申请，明确说明增加原因(如供应商问题等)及技术参数对比。
- 9、质监整改项各单位 18 日之前要全部完成整改，并发给十一科技统一汇总上传质监平台。


四、监管单位提出的要求

- 1、进度要抓重点，要抓支架桩、箱变平台等关键工作。
- 2、未打完桩的塘口，涉及 2 个方面，1 个是能够拿下来的要明确拿下来的期限，1 个是不能拿下来的要汇报业主单位解决。
- 3、总包项目管理人员不能不断调整，要保持稳定。监理要按规划要求配备人员加强力量。
- 4、箱变位置不合理要找设计调整。箱变平台泄水孔、排水坡度质量要保证。
- 5、材料的检测方案和周期要按方案进行。材料品牌增加或更换要按正常程序进行。
- 6、安全是重点，水上施工和浮船要作为重点。
- 7、监理要做好施工过程检查和工程质量验收工作，业主单位抽查工程质量。

主送单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司		
抄送单位	高邮市鑫飞新能源有限公司		
发文单位	高邮市鑫飞新能源有限公司甘垛镇 380MW 渔光互补光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2025 年 07 月 16 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



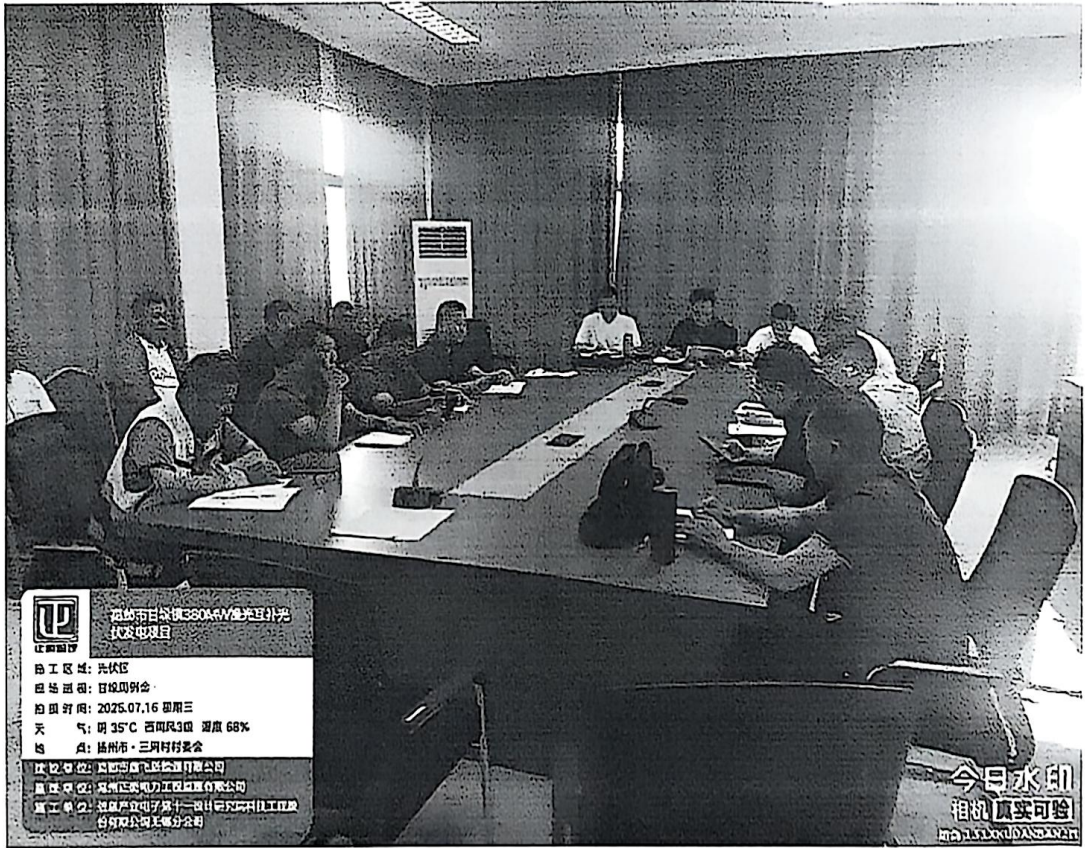

温州市白垩镇380A9M储能互补光伏
扶贫示范项目

施工区域：光伏区
监理单位：甘岭项目部
拍摄时间：2025.07.16 星期三
天气：阴 35°C 西南风3级 湿度 68%
地点：温州市·三垟村村委会
建设单位：温州瑞能新能源有限公司
监理单位：温州瑞能电力工程有限公司
施工单位：温州市电子第十一项目研究院开山工程
咨询有限公司温州分公司

今日水印
相机/手机/电脑
www.zhuanyuan.com
