


会议纪要

工程名称：天合光能光电一期 22.5MW/45MWh 用户侧储能项目

编号：THCN-ZHJL-HYJY-006

会议地点	项目部会议室	会议时间	2024. 11. 20
会议主持人	朱健康		
会议主题： 第五次监理例会			
参会人员： 胡培朋 朱健康 周飞 周建峰 王良春 钱存树 黄涛 张良元			
会议主要内容：			
总包单位汇报：			
1、二期已完成情况和下周工作计划，电缆沟已经砌筑 100%，压顶浇筑 100%，沟底找坡已经完成，电缆沟粉刷完成 100%，压顶修补完成 60%。			
2、接地环网外围已经开始开挖，3 天内完成焊接施工。			
3、设备要 24 号到场发货，顶管已经开始施工，北侧人工开挖也在进行，埋地 MPP 管已经进场，明天开始焊接，准备拉管，施工方案已经上报给监理单位。			
4、需项目部协调问题：无			
5、项目经理胡总：电缆沟底部积水情况要充分处理，防止水排不出去 电缆沟盖板要抓紧时间制作 电气单位的调试方案和调试单位资质要尽快上报 电气单位材料堆放要提前打招呼，避免重新搬运堆放，浪费人工。			
监理单位：			
1、质量方面：压顶浇筑表面不平，侧墙粉刷有开裂现象，要求整改			
2、包缝不在同一平面，要求施工单位整改			
3、焊接是必须保证搭接面积符合要求，观感质量要好			
4、电缆沟支架安装，有个别支架歪斜，要求重新调整			
5、电缆沟沟底找坡，要求清理干净，流水槽边缘要修整圆滑，方便流水。			
6、资料方面：土建单位施工报审资料基本齐全，电气单位还差材料报审，调试单位资质报审，要求尽快上报			
7、安全方面：西南侧裸土未覆盖、材料未清理，施工区域未设置安全警示牌，已下发监理通知单，要求尽快回复			
8、进度方面：要求施工单位必须按照进度计划如期完成			
业主单位：			
现场发现的问题要安排人尽快整改，因设备进场时间推后，电气单位一定要制定好施工计划。			
工期一定要按照进度计划如期完成			
后附会议相关图片：			

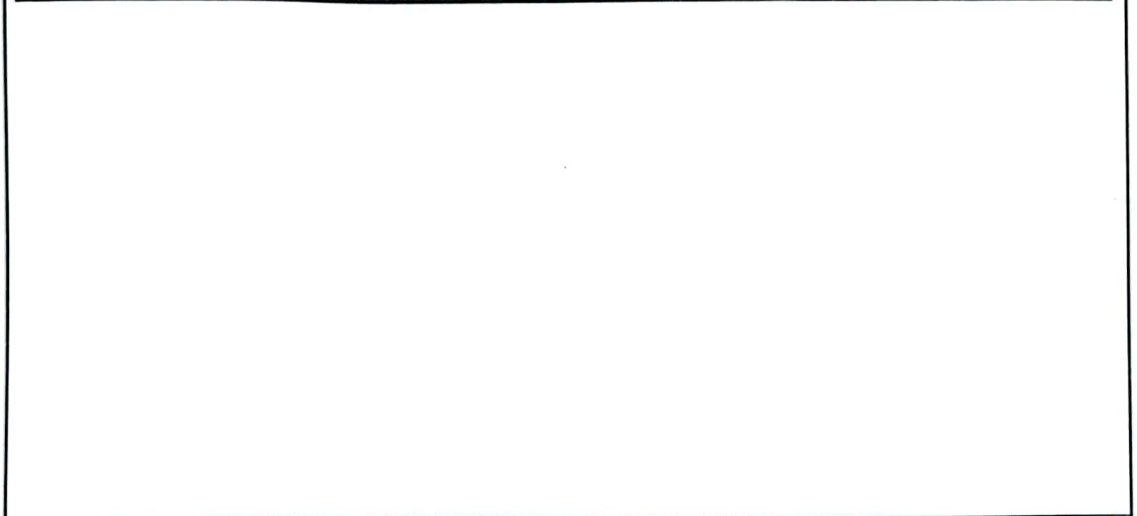

主送单位	建设单位：淮安合淮储能科技有限公司 总包单位：常州天合智慧能源工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024. 11. 20

注：会议纪要由监理项目部起草，经项目负责人签发后下发 签发：[Signature]
