

春节前安全大检查纪要及整改完成情况

2025 年 1 月 16 日

工程名称：郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目

检查时间：2025 年 01 月 16 日下午 2:00

检查地点：郎溪兴阳项目现场

检查主题：春节前安全大检查

建设单位：郎溪申宣新能源科技有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位：浙江玉信电力建设有限公司

为确保本项目现场安全，2025 年 01 月 16 日，由监理单位会同总包单位、施工单位相关项目管理人员，共同对本项目施工现场、材料及加工场地、办公地点、库房及材料临时堆放点等进行节前安全安全检查。重点排查安全管理制度、施工用电、动火作业、成品保护、临边作业、库房管理、安全文明施工等现场安全隐患，确保现场安全。要求领导干部，管理人员加强领导，落实责任，针对现场实际情况做好现场大检查具体计划。计划突出重点紧贴实际，强调针对性和可操作性，防止克服形式主义和“走过场”思想，把“以人为本，安全第一的理念和安全大检查的相关要求结合起来，并立即组成春节前大检查活动小组：

组 长：张献兵

副组长：姜旭 胡江浩

组 员：陈斌 肖汉东 吴雪飞

一、检查范围：

郎溪兴阳金属制品有限责任公司 2.18817MWp 分布式光伏发电项目现场

二、检查内容：

1、安全管理方面的落实情况排查：检查施工单位安全生产责任制的落实，项目安环保障体系及相关制度是否完善有效；参建人员的安全教育培训是否落实，针对作业人员的安全技术交底是否到位；特种作业人员和土方机械司机是否做到持证上岗；大型机械设备和土方机械是否证照齐全，且维护保养到位；针对危险施工的专项方案和防控措施是否完善。

2、施工现场安全隐患排查

1) 排查作业人员是否满足生产需要

- (1) 作业人员年龄和文化程度；
- (2) 有无影响作业的疾病、生理缺陷和性格缺陷；
- (3) 技能是否满足所从事施工生产的需要，有无相关证件；
- (4) 个人防护用品是否按要求佩戴；
- (5) 人员身体和精神状态是否良好。

2) 排查现场安全文明施工是否到位

- (1) 安全宣传提示是否对应现场，并通俗易懂；
- (2) 安全标志是否设置到位并指向明确；
- (3) 现场施工围挡是否完好；
- (4) 施工现场是否整齐有序。

3) 排查施工用电是否规范正确

- (1) 现场的照明灯具和电动设备是否合规；
- (2) 用电线路是否按要求铺设；
- (3) 大型设备是否按要求接地。

4) 排查施工现场消防设置是否到位

- (1) 消防设施是否齐全到位;
- (2) 绿色通道是否通畅;
- (3) 动火作业是否远离易燃易爆材料的堆放点。

5) 排查现场机械设备有无安全隐患

- (1) 现场安全防护装置是否完好;
- (2) 设备状态是否良好;
- (3) 设备运行路线是否频繁交叉行人路线而无对应措施。

6) 排查现场安全防护是否落实到位

- (1) “四口五临边”的安全防护是否到位;
- (2) 基槽、坑、沟、洞口是否及时覆盖;
- (3) 高处作业的安全防护;
- (4) 现场的安全警戒和使用过程中的防护情况;
- (5) 吊装作业区安全警戒的设置;
- (6) 屋面采光带防护是否到位;

7) 排查危险施工的相关安全措施是否落实到位

- (1) 相关的施工方案与安全措施、审批手续是否齐全;
- (2) 关键工序和隐蔽工程是否有合格的验收手续, 相关的安全措施和设施是否到位;

8) 排查节日期间施工现场值班人员是否落实到位

- (1) 相关节日期间项目人员值班表是否制定完成;
- (2) 值班期间人员安全保障是否落实到位, 巡视检查制度是否符合现场要求。

三、检查结果及整改要求

- 1、屋面材料乱堆乱放、需要整理并做好防护
- 2、停工后爬梯口需要铁链封堵并做安全警示标语
- 3、加固人员使用电源线存在破损情况、需要更换电源线停工后做好保存工作
- 4、加固使用天然气、氧气、二氧化碳等气瓶需要分别存放、并做好安全标识配备灭火器
- 5、加固人员使用焊机未做接地措施
- 6、加固使用油漆属于易燃物品、做好安全措施并配备灭火器
- 7、现场材料停工前需要分类集中堆放、拉设警戒线、做好警示标识
- 8、现场直流电缆做好标识防止偷盗、拉设警戒线、做好警示标识
- 9、已经拆箱组件做好成品保护
- 10、组件备件需要做警示标语例如禁止堆放重物
- 11、安全围栏缺少安全警示标语
- 12、停工前未完成材料需要整理、绑扎固定
- 13、采光带缺少临时防护并喷涂禁止踩踏等安全警示标语
- 14、施工结束后垃圾未及时清理
- 15、现场材料停工前未使用需要整理并做好绑扎
- 16、屋面垃圾停工前需要清理干净
- 17、采光带临时警示锥桶需要固定防止大风吹落下屋面砸伤他人

以上 17 点检查出来的问题要求相关责任单位严格按照整改要求对现场存在的安全隐患、文明施工、安装等不符合项进行整改落实，并按照“举一反三”的原则进行自查自改，整改后已整改闭环情况已复查（详见附页）。

报送：郎溪申宣新能源科技有限公司

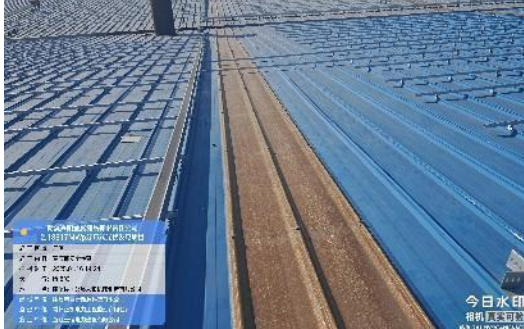
抄送：浙江玉信电力建设有限公司

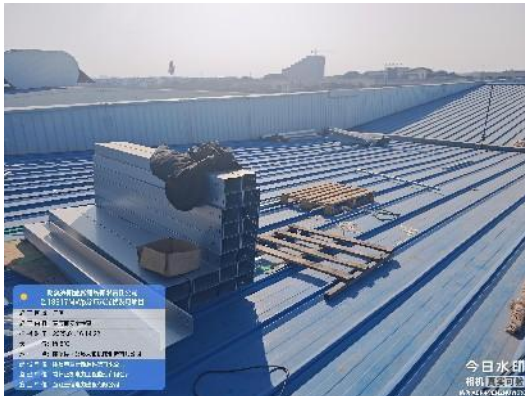
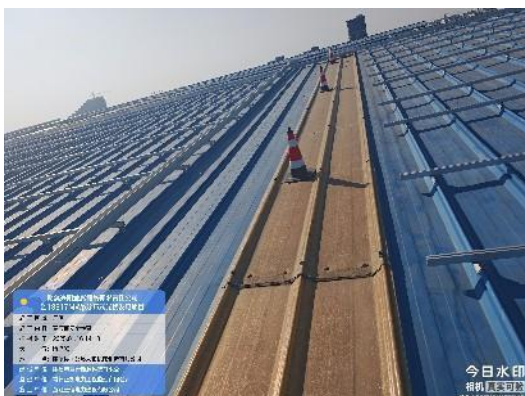
检查问题及整改完成情况

序号	检查问题	整改情况	备注
1	 屋面材料乱堆乱放、需要整理并做好防护	 已整改	
2	 停工后爬梯口需要铁链封堵并做安全警示标语	 已整改	
3	 加固人员使用电源线存在破损情况、需要更换电源线停工后做好保存工作	 现场材料退场处理	

4	 加固使用天然气、氧气、二氧化碳等气瓶需要分别存放、并做好安全标识配备灭火器	 现场材料退场处理
5	 加固人员使用焊机未做接地措施	 现场材料退场处理
6	 加固使用油漆属于易燃物品、做好安全措施并配备灭火器	 现场材料退场处理
7		

	现场材料停工前需要分类集中堆放、拉设警戒线、做好警示标识	已整改	
8			
	现场直流电缆做好标识防止偷盗、拉设警戒线、做好警示标识	已整改	
9			
	已经拆箱组件做好成品保护	已整改	
10			
	组件备件需要做警示标语例如禁止堆放重物	已整改	

11			
	安全围栏缺少安全警示标语	已整改	
12			
	停工前未完成材料需要整理、绑扎固定	已整改	
13			
	采光带缺少临时防护并喷涂禁止踩踏等安全警示标语	已整改	
14			
	施工结束后垃圾未及时清理	已整改	

15			
	现场材料停工前未使用需要整理并做好绑扎	已整改	
16			
	屋面垃圾停工前需要清理干净	已整改	
17			
	采光带临时警示锥桶需要固定防止大风吹落下屋面砸伤他人	已整改	

郎溪兴阳金属制品有限责任公司2.18817MWp分布式光伏发电项目

序号	单位名称	职务	姓名	联系电话	备注
1	浙江玉信电力建设有限公司	项目经理	胡江浩	13967669919	
2	浙江玉信电力建设有限公司	技术负责人	吴雪飞	15955627550	
3	常州正衡电力工程监理有限公司	专业监理工程师	姜旭	17604520417	

说明：所有人员必须保持24小时电话畅通，如遇紧急情况需报备建设单位项目经理批准。



郎溪兴阳金属制品有限责任公司2.18817MWp分布式光伏发电项目值班表

序号	日期	胡江浩	吴雪飞	姜旭	备注
1	2025.01.2 1		✓		
2	2025.01.2 2		✓		
3	2025.01.2 3		✓		
4	2025.01.2 4		✓		
5	2025.01.2 5		✓		
6	2025.01.2 6		✓		
7	2025.01.2 7		✓		
8	2025.01.2 8		✓		
9	2025.01.2 9		✓		
10	2025.01.3 0		✓		
11	2025.01.3 1		✓		
12	2025.02.0 1	✓			
13	2025.02.0 2	✓			
14	2025.02.0 3	✓			
15	2025.02.0 4	✓			
16	2025.02.0 5	✓			
17	2025.02.0 6	✓			
18	2025.02.0 7	✓			
19	2025.02.0 8	✓			
20	2025.02.0 9	✓			
21	2025.02.1 0			✓	
22	2025.02.1 1			✓	
23	2025.02.1 2			✓	
24	2025.02.1 3			✓	
25	2025.02. 4			✓	

