

山东齐河和乐门业光伏发电工程情况汇报

致：浙江正泰新能源开发有限公司

山东齐河和乐门业光伏发电工程位于山东省德州市齐河县和乐门业有限公司厂内，总装机容量为 9.5MW，其中 3.55MW 为自发自用余额上网，已于 2017 年 12 月 28 日并网发电，目前进行整改消缺工作。5.95MW 为全额并网，目前进行低压电气安装，高压部分和输出外线工程未施工。


本工程为屋顶分布式光伏发电工程，需要对 1#、3#厂房钢结构进行加固，以保证对本光伏电站达到相应的承载力。总承包单位为西北电力建设第一工程有限公司。

我监理部对钢结构加固工程进行施工质量检查发现，钢结构加固工程未按设计图纸施工。1#厂房南边 2#钢立柱未加固，3#厂房所有钢立柱未加固，钢结构加固后防腐涂层干漆膜厚度不符合设计要求（设计要求涂层干漆膜总厚度：室内 $\geq 125\mu$ ，现场检测 70 μ 以下），对整体钢结构厂房存在极大的安全隐患。多次督促未整改（已发 14#、16#、18#监理工作联系单），施工方多种理由推脱（施工困难、图纸不明确、设计院来人现场确认等），至今设计院未到现场确认，现场无一人施工。


附 现场图片



1#厂房南边 2#钢立柱未加固

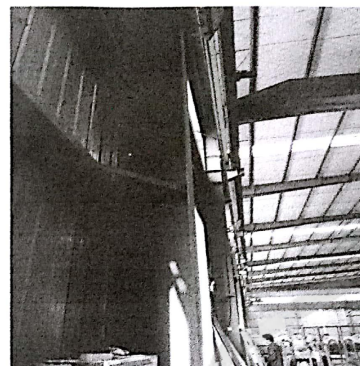

3#厂房所有钢立柱未加固

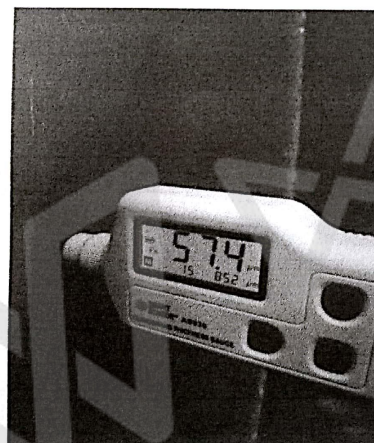

防腐涂层干漆膜厚度不符合设计要求

山东齐河和乐门业光伏发电工程监理项目部



2018年3月24日
