

GFDZJBM11: 监理报告

监 理 报 告

工程名称: 丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵
镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JLBG-001

致: 丹阳嘉信电力发展有限公司

由 甘肃省安装建设集团公司 施工的 联兴、松卜场区。我方发出编号为 ZHJL-JLTZ-003、ZHJL-JLTZ-004、ZHJL-JLTZ-005 的《监理通知单》，施工单位已整改，但未进行回复。编号为 ZHJL-JLTZ-006 的《监理通知单》，施工单位未整改，且未进行回复。

特此报告。

附件: ☒ 监理通知单

☐ 工程暂停令

☐ 其他

监理项目部 (章)

总监理工程师: 任伟峰

日 期: 2018 年 5 月 28 日

注 本表一式四份, 主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-003

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于联兴打桩质量事宜

内容：

经我监理部巡查发现联兴打桩存在质量问题，部分桩身开裂、破损，存在严重的质量隐患（详见附图）。现要求你单位对已完成桩进行检查，对出现上诉的现象的桩进行处理。若未按要求进行整改，影响下一道工序施工，产生的后果由你施工单位承担。现要求你单位在 2018 年 5 月 3 日前给予我单位书面回复。




监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年4月30日



注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



监理工程师通知单

工程名称：丹阳嘉信 电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-004

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于安全文明施工以及组件安装事宜

内容：

2018 年 5 月 7 日经我监理巡查发现，施工现场施工人员未佩戴安全帽，组件摆放随意（见附图）。

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，否则不得进入施工现场。按施工需求正确施工劳保用品，保证施工安全。

2、施工现场组件摆放随意，立放、斜放及背板向上都存在。立放、斜放，支撑物会导致背板划伤；若立放、斜放组件倒下，会导致组件隐裂。若组件背板向上，晴天温度过高，会导致背板胶水汽化，背板出现气泡。阴雨天则会背板导致积水，背板连接电路氧化。

现要求你施工单位立即对施工现场安全文明施工及组件摆放按第八次监理例会会议纪要进行整改，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在两日对此通知单进行书面回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 5 月 07 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。



监理工程师通知单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-005

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于安全文明施工事宜


内容：

2018 年 5 月 9 日经我监理巡查发现，施工现场存在以下安全问题（见附图）：

1、联兴箱变底板施工，钢材切割过程中氧气瓶与乙炔瓶安全距离不符合要求，规范要求两瓶之间安全距离不得小于 5M。

2、联兴施工现场油桶无可靠防护措施，存在安全隐患，要求你单位对油桶周边进行安全围护，添加明显标识。

现要求你施工单位立即对以上问题进行整改，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在 1 日对此通知单进行书面回复。

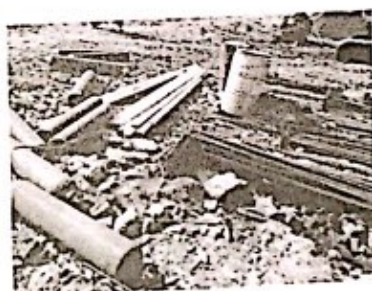

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 5 月 09 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份



监理工程师通知单

工程名称：丹阳嘉信电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-006


致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于逆变器底座防腐事宜

内容：

经我监理巡查发现，SVG 充电室、逆变器等设备已吊装完成，但底座槽钢未刷防锈漆，未做防腐处理（见附图），现场槽钢已锈蚀。

现要求你施工单位立即对逆变器底座进行防锈、防腐处理，按要求进行整改。并对后续施工过程中出现的槽钢锈蚀情况按此次整改要求进行处理。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在两日对此通知单进行书面回复。

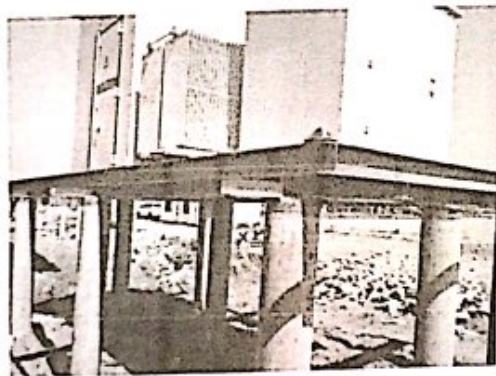

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年5月23日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。

