

GFDZJBM11: 监理报告

监 理 报 告

工程名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵

镇 15 兆瓦全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JLBG-001

致: 丹阳汇恒电力发展有限公司

由 甘肃省安装建设集团公司 施工的 快庄场区。我方发出编号为 ZHJL-JLTZ-001、ZHJL-JLTZ-002、ZHJL-JLTZ-004 的《监理通知单》，施工单位已整改，但未进行回复。编号为 ZHJL-JLTZ-005 的《监理通知单》，施工单位未整改，且未进行回复。

特此报告。

附件: ☒ 监理通知单

☐ 工程暂停令

☐ 其他

监理项目部 (章)

总监理工程师: 任仲峰

日 期: 2018 年 5 月 28 日

注 本表一式四份, 主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。



由 扫描全能王 扫描创建

监理工程师通知单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳延陵镇 15 兆瓦  
全额上网渔光互补分步式地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-001

致：煜阳新能源有限公司

事由：关于快庄桩位施工事宜

内容：经我监理部检查发现你单位在快庄打桩施工过程中存在以下问题：

- 1、打桩施工完成后，纵向桩位存在偏差。
- 2、桩基础垂直度存在偏差。

为保证不影响下道工序施工，针对以上问题，你单位必须在整改完成后报我监理部复验，验收合格后方可进入下道工序施工，否则不得进入下一道工序施工。若未按要求进行整改，所产生一切后果由你单位负责。（详情见附图）



监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2022年12月26日



注 本表一式\_\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_\_份。



监理工程师通知单

工程名称: 丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦  
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号: ZHJL-JLTZ-002

致: 甘肃省安装建设集团公司

事由: 关于施工进度缓慢事宜

内容:

按关于快庄打桩施工进度会议讨论要求, 你单位需在 2018 年 3 月 28 日完成 2MW 桩位施工 (约 820 根桩), 但你单位实际施工进度无法完成会议要求。现要求你单位增加桩机数量, 保证按期完成施工计划。请你单位对此通知到于 2018 年 3 月 28 日给予回复。

监理项目部 (章):

总/专业监理工程师:

日

期: 2018 年 3 月 27 日

注 本表一式三份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存一份。



监理工程师通知单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦

全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-004

致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于安全文明施工以及组件安装事宜

内容：

2018 年 5 月 7 日经我监理巡查发现，施工现场施工人员未佩戴安全帽，组件摆放随意（见附图）。

1、进入施工现场必须正确佩戴安全帽，否则不得进入施工现场。按施工需求正确施工劳保用品，保证施工安全。

2、施工现场组件摆放随意，立放、斜放及背板向上都存在。立放、斜放，支撑物会导致背板划伤；若立放、斜放组件倒下，会导致组件隐裂。若组件背板向上，晴天温度过高，会导致背板胶水汽化，背板出现气泡。阴雨天则会背板导致积水，背板连接电路氧化。

现要求你施工单位立即对施工现场安全文明施工及组件摆放按第八次监理例会会议纪要进行整改，若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在两日对此通知单进行书面回复。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018 年 5 月 07 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。





监理工程师通知单

工程名称：丹阳汇恒电力发展有限公司丹阳市延陵镇 15 兆瓦  
全额上网分布式渔光互补地面光伏电站项目

编号：ZHJL-JLTZ-005


致：甘肃省安装建设集团公司

事由：关于逆变器底座防腐事宜

内容：

经我监理巡查发现，逆变器已吊装完成，但逆变器底座槽钢未刷防锈漆，未做防腐处理（见附图），现场槽钢已锈蚀。

现要求你施工单位立即对逆变器底座进行防锈、防腐处理，按要求进行整改。并对后续施工过程中出现的槽钢锈蚀情况按此次整改要求进行处理。若未按要求进行整改所造成的后果由你单位进行承担，另要求你单位在两日对此通知单进行书面回复。

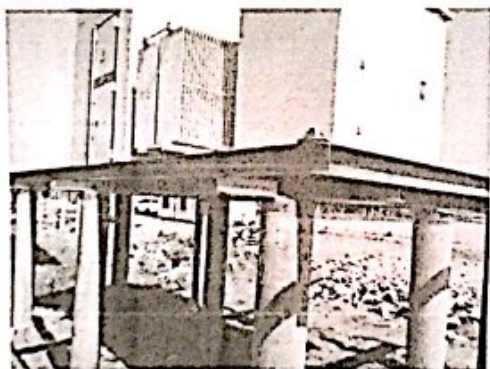

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2018年5月23日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

