

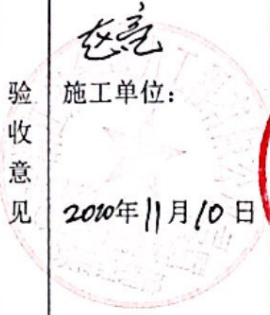
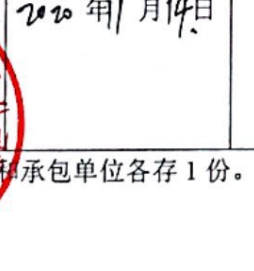
箱变基础钢筋安装记录（隐蔽签证）

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目光伏发电及配套
输变电 EPC 工程

分项工程名称		箱变基础		工程部位		驮龙（S1，S2，S3，S4）箱变基础钢筋；驮龙（S1，S2）箱变基础钢筋				
施工图号		30-N300601S-T0203		设计变更编号		/				
主 要 质 量 情 况	钢筋型号：	主筋：Φ20，Φ12		内箍筋：	外箍筋：Φ8		地脚螺丝直径：/			
	基础钢筋实测数据一览表									
	基础 代号	基础型号	Φ20 主筋数量 根		Φ12 主筋间距 mm		外箍筋间距 mm		内箍筋间距 mm	
			设计	实测	设计	实测	设计	实测	设计	实测
	1	驮龙 S1 箱变基础	64	64	150	151	/	/	150	152
	2	驮龙 S2 箱变基础	64	64	150	150	/	/	150	152
	3	驮龙 S3 箱变基础	64	64	150	152	/	/	150	150
	4	驮龙 S4 箱变基础	64	64	150	151	/	/	150	151
	5	驮坑 S1 箱变基础	64	64	150	153	/	/	150	150
	6	驮坑 S2 箱变基础	64	64	150	152	/	/	150	151
基 础 代号	接腿型号	底脚螺丝间距 mm		铁塔半跟开（正面）mm		铁塔半跟开（侧面）mm				
		设计	实测	设计	实测	设计	实测			
1	/	/	/	/	/	/	/			
2	/	/	/	/	/	/	/			
3	/	/	/	/	/	/	/			
4	/	/	/	/	/	/	/			
5	/	/	/	/	/	/	/			
6	/	/	/	/	/	/	/			
问题及整改：										
检查结论：同意隐蔽及进行下一道工序施工										



扫描全能王 创建

验收意见	 施工单位: 赵亮 2010年11月10日	 监理单位: 纪现华 2010年11月12日	 勘察单位: 孙道飞 2010年11月13日	 建设单位: 2010年11月14日
	年 月 日			

本表一式5份，由承包单位填写。建设管理单位、监理单位、勘察单位、设计单位、承包单位各存1份。

