

GFDZJBM11: 监理报告

监 理 报 告

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

致: 博耳能源江苏有限公司

由 德霖能源有限公司 施工的 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目, 在 8 月 31 号消防泵房底板验筋时我监理方发现存在接地扁铁焊接不符合设计规范要求及时下发监理通知单 SY02 要求整改。当时施工方负责人(苏峰)当着业主人员面将监理通知单仍在地上拒收, 且恶言相加威胁我方监理人员并驱离现场, 现场业主人员在这一过程中始终保持沉默态度。我方无奈只好暂时离开现场。

在 10 月 15 号现场监理人员在例行巡视升压站时发现综合楼屋面保温层施工存在未按图纸要求设置防火隔离带、一次室至 SVG 电缆沟绑筋支模施工存在钢筋规格不符合图纸要求现象。我监理方在发现问题后下发检查记录 ZHJL-JCJL-18 要求施工单位按图施工。送至施工项目部要签收该检查记录时, 被施工方(李有军)当众撕毁, 只能另写一份相同问题的检查记录并在文件上写拒签。后续我监理方下发的检查记录多次遭到施工单位拒签。

就我监理 2 次下发文件被拒签事情, 特此报告。

附件: 监理通知单 SY02、监理检查记录 ZHJL-JCJL-18



总监理工程师/总监理工程师代表:

日 期: 2021 年 12 月 13 日

注 本表一式四份, 主管部门、建设管理单位、工程监理单位、项目监理机构各一份。

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-018

|           |                                                                                                  |                 |                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 德嘉能源有限公司                                                                                         | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021年10月15号                                                                                      | 检查地点            | 升压站            |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项   |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 巡视检查升压站综合楼保温施工及场区电缆沟绑筋支模                                                                         |                 |                |
| 存在问题      | 1. 综合楼屋面保温未设置防火岩棉防火带<br>2. 电缆沟钢筋为 $\phi 10$ 与图纸不符                                                |                 |                |
| 整改要求      | 按图施工                                                                                             |                 |                |
| 检查人       | 王磊 2021.10.15                                                                                    | 施工项目部<br>签收人/日期 | 拒签             |
| 整改情况      | 整改负责人:  日期: |                 |                |
| 复查意见      | 复查人:      日期:                                                                                    |                 |                |



## 监理工程师通知单

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号：ZHJL-JLTZ-SY002

致：德幂能源有限公司十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目施工项目部

事由 关于焊接相关事宜

内容

经监理现场检查发现，消防泵房接地施工存在以下问题：（详见附件一）

- 1、扁铁焊缝搭接面不符合图纸设计要求
- 2、焊接缝无满焊

现要求你单位立即整改，未整改核验前不允许进行隐蔽作业。  
若私自施工隐蔽后果将有你方承担。该通知单 3 日内进行回复。


监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日期：2021 年 8 月 31 日

本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。

附件一：

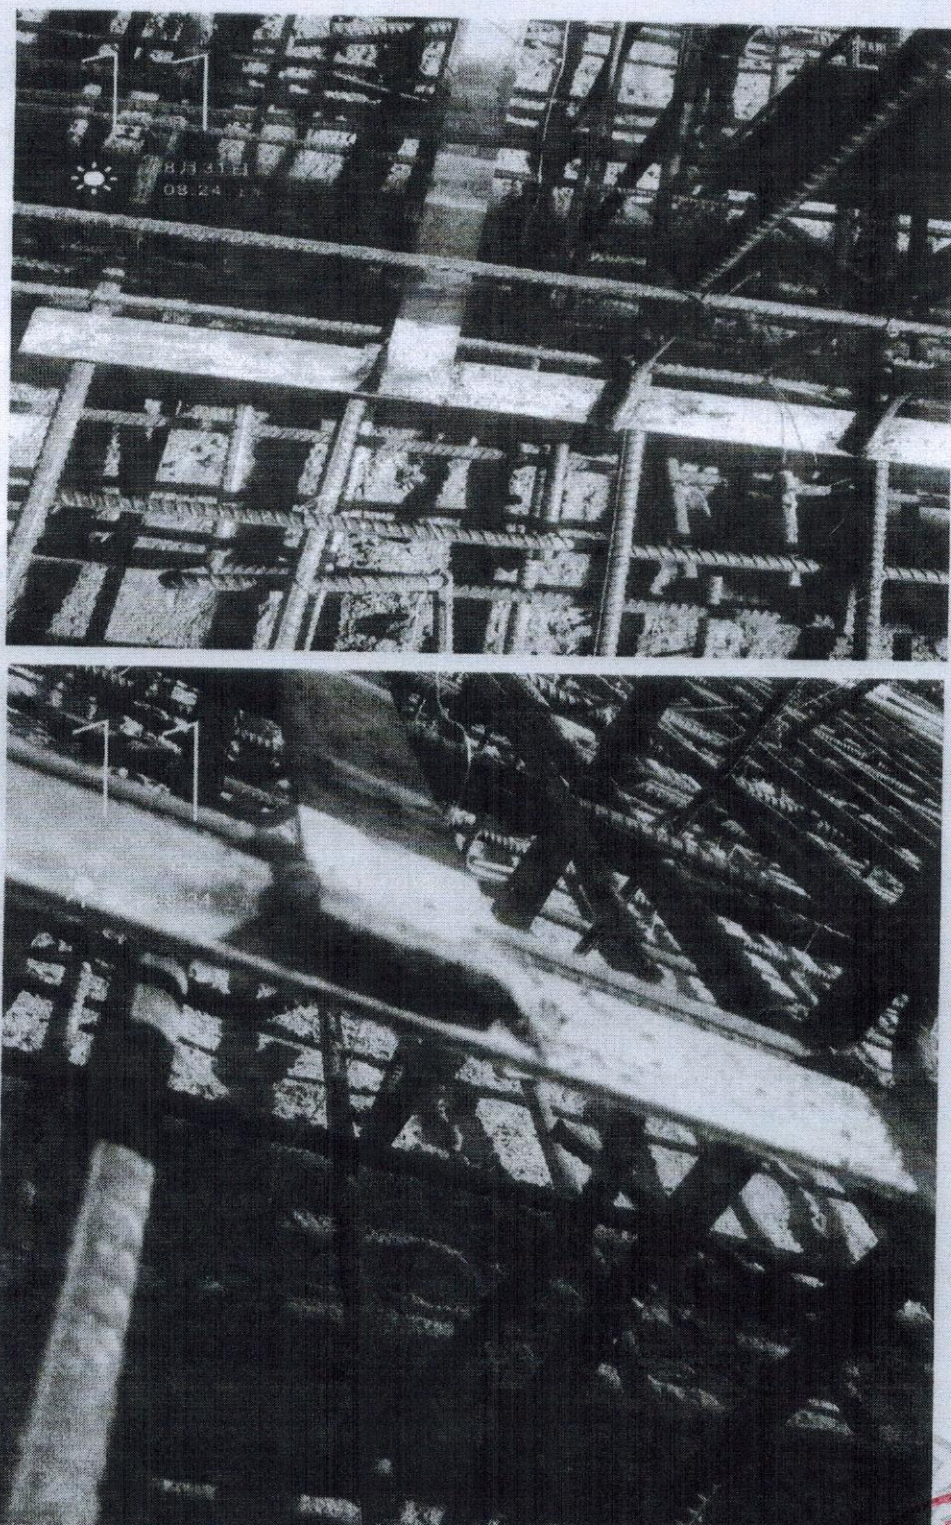

光伏  
有限公司

