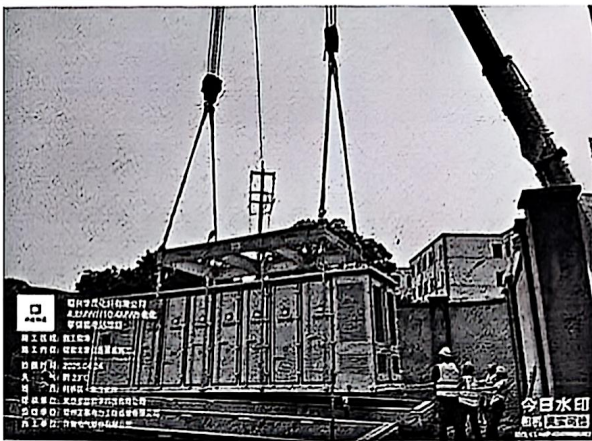
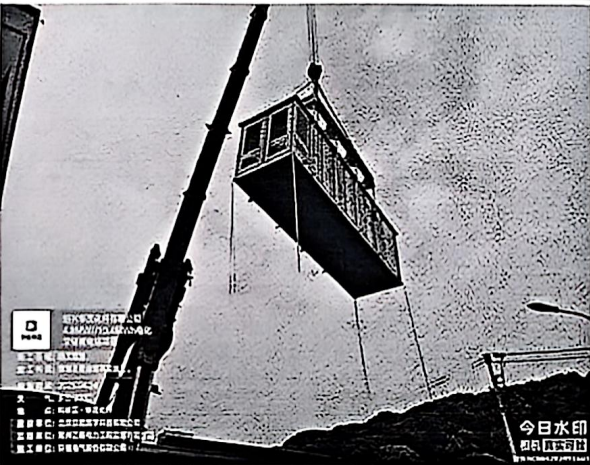


安全旁站监理记录表

项目名称：绍兴华茂化纤有限公司 4.8MW/10.4MWh 电化学储能电站项目
编号：SX-HM-JL-AQ-03

日期及气候：2025.4.24;小雨 12-26C°	施工地点：华茂配电室北侧。
旁站监理的部位或工序：储能配电柜倒运	
旁站监理开始时间：2025.4.24.09.15	旁站监理结束时间：2025.4.24.16.20
施工情况： 现场共有 400 吨吊车一台、100 吨吊车一台，吊车操作人员 2 人、指挥人员一人，其它辅助人员 8 人，专职安全员 2 人，管理人员 4 人。准备对储能到场的 PCS4 台、BMS 2 台进行吊装就位。	
监理情况 1、检查吊车钢丝绳及吊具安全情况，检查现场吊车操作员及指挥员的证件；检查现场专职安全员证件；对所有现场施工作业人员再次进行安全交底，讲明安全防护重点和危险源。 2、根据现场实际情况，再次局部调整吊装方案，并经过监理、建设单位审批。 3、吊装施工从上午 09.15 分开始至下午 16.20 结束。 4、整体吊装施工过程安全、顺利无意外情况发生。	
发现问题： 无	
处理意见： 无	
备注（包括处理结果）：	
承包单位：许继电气股份有限公司 安 检 员：高李洋 日 期：2025 年 4 月 24 日	项目监理单位：常州正衡电气工程有限公司 旁站监理人员：郭俊志 日 期：2025 年 4 月 24 日

现场施工图片：

照片		
文字描述	吊车钢丝绳及吊具检查	BMS 吊装
照片		
文字描述	BMS 吊装	PCS 吊装

填报说明:

本表有项目监理机构填写, 项目监理机构存____份。
