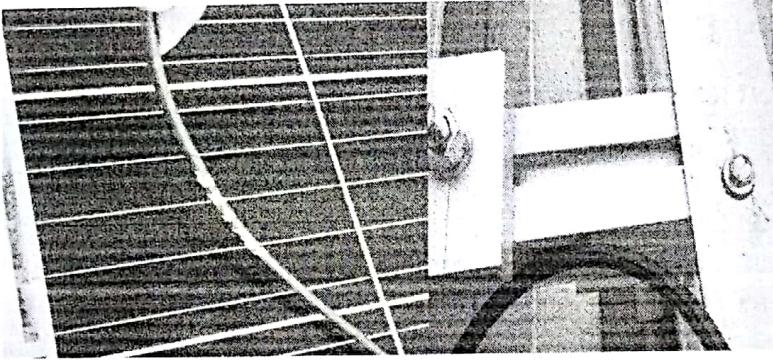


## GFDZJBM14 : 监理检查记录表

## 监理检查记录表

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXMB-013

施工单位	北京英杰融创工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月11日	检查地点	3#成品库
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	现场熟悉情况，对组件安装、接地、桥架安装进行检查		
存在问题	1. 组件方阵缺少号码套管，只存在汇流箱、逆变器一端，不便于以后运维检修及查找 2. 各接地扁铁采用栓接，钻孔产生的铁屑杂质未清理，造成屋面、导轨内出现锈迹 		
整改要求	1. 对各方阵进行号码套管，确定各方阵具体属于那个区域，那条线路，以便检修 2. 对屋面产生的铁锈，需进行及时处理		
检查人	张海龙	施工项目部 签收人/日期	吕杨扬 2018.6.11
整改情况	已整改 整改负责人：吕杨扬 日期 2018.6.11		
复查意见	已整改 复查人：张海龙 日期 2018.6.11		



由 扫描全能王 扫描创建
