

监 理 检 查 记 录 表



工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目

编号: GPDZJBM14-06

施工单位	上海上电电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年06月27日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对光伏支架基础支墩浇筑施工现场检查。		
存在问题	1、部分光伏组串条形支墩基础浇注前场地未平整,浇注后与图纸不符(附图纸及施工现场照片)。 2、施工现场无配置安全警示牌及防火装置(灭火器)。 3、条形支墩浇注振捣不到位、拆模操作不当,部分支墩存在裂纹、麻面。		
整改要求	1、光伏支架安装前要进行光伏组串条形支墩周围地面平整,应按图纸施工,否则不得进行光伏支架安装。 2、条形支墩浇注现场要及时配置消防设施(灭火器)以及安全警示牌。 3、对部分已存在问题的条形支墩要进行修复。		
检查人	李贵生, 2018.06.27	施工项目部 签收人/日期	黄正 2018.6.27
整改情况	关于监理项目部提出的三条问题,其中第二条已整改完成,第1、3条,现已按图纸要求,已经整改,整改完成后报监理项目部验收。 整改负责人:李贵生 日期:2018.6.29		
复查意见	整改已闭环整改,符合整改要求,报审后,留观,项目部进行验收。 复查人:刘永杰 日期:2018.6.30		



附：条形支墩图纸

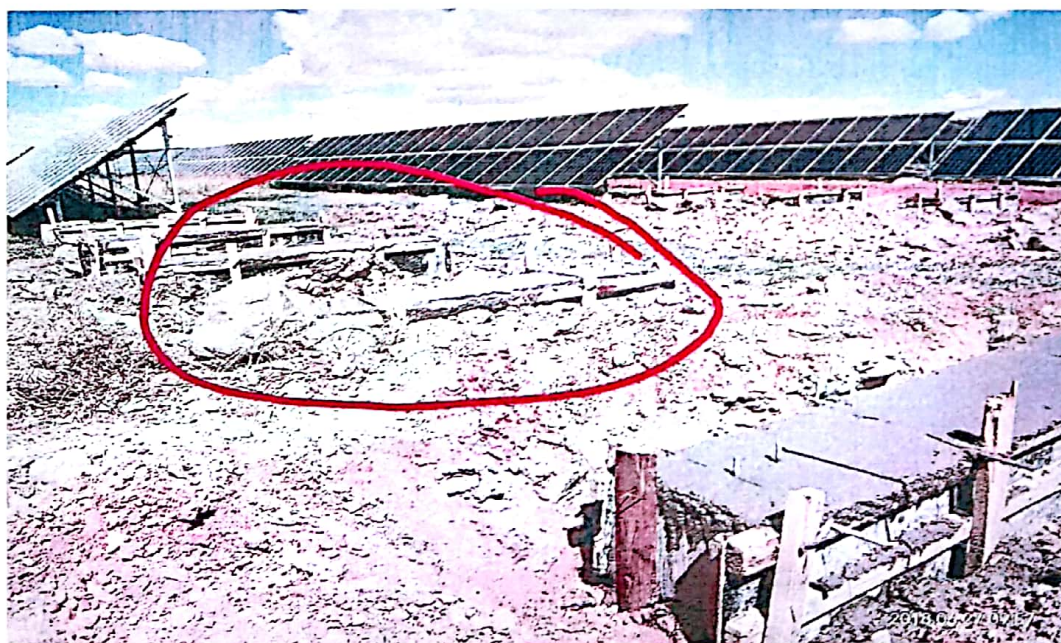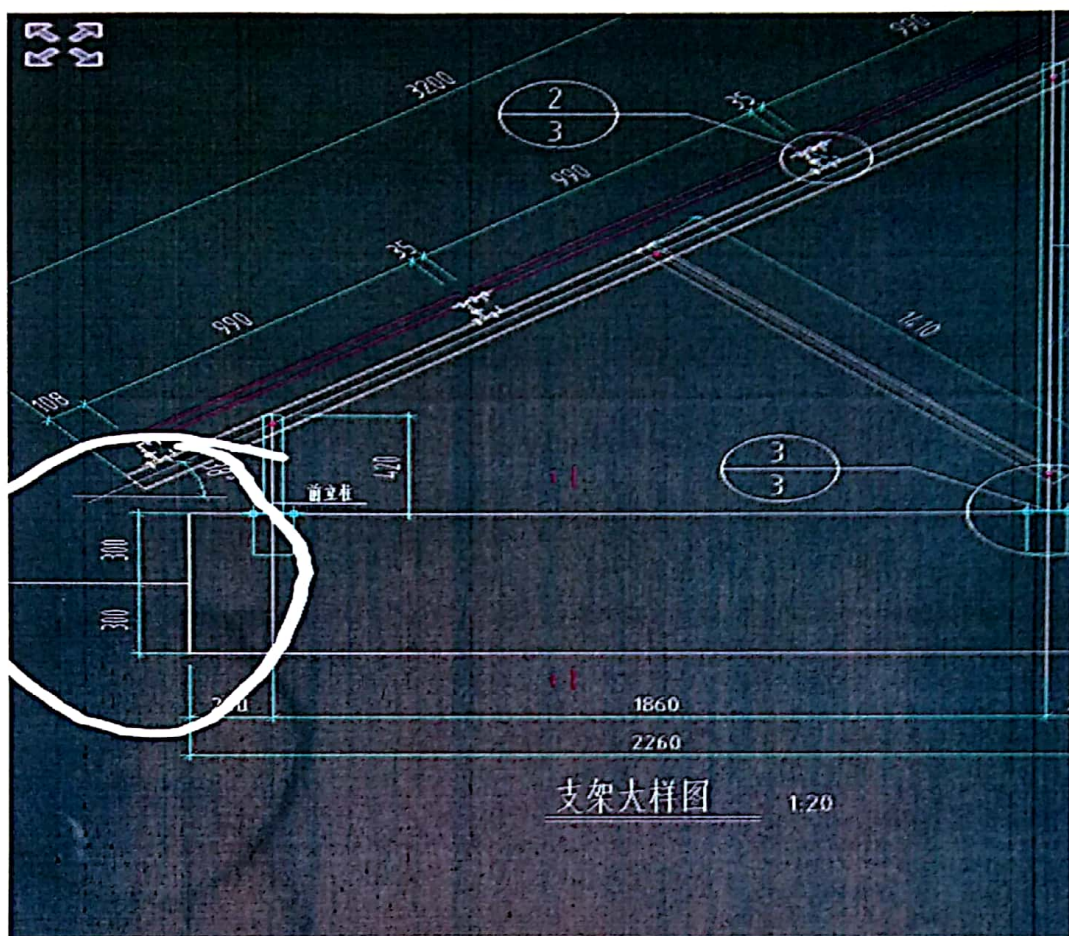

施工浇注现场

