


监理检查记录表

工程名称: 张北光伏电站容配比优化改造工程项目


编号: GFDZJBM14-07

施工单位	上海上电电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2018年06月28日		检查地点	光伏组件安装现场	
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期		<input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	监理项目部对光伏支架以及光伏组件安装工序、支架、组件现场放置检查。				
存在问题	1、光伏支架在装车、卸车过程中施工人员未轻拿轻放，而是摔都车上，易造成镀锌层脱落，会减少光伏支架使用年限（图 02）。 2、光伏组件安装现场组件未安装的存放不正确（图 01），叠放层数过高，且每层叠放不整齐，易造成光伏组件表面玻璃划伤，光伏组件内部隐裂、碎片、断栅等。				
整改要求	1、总包项目部应对施工人员进行光伏支架、光伏组件安装进行技术交底。 2、施工技术员要进行现场安装操作技术指导。 3、对现场光伏组件叠放问题要及时整改。 4、光伏支架转运时，装车、卸车对小件应轻拿轻放，对支架横梁或大件应二人搬装。				
检查人	 2018.06.28		施工项目部	 2018.06.28	
整改情况	1. 现已对光伏支架装车、卸车全部轻拿轻放。 2. 现已对光伏组件叠放层数在15层以内重新叠放以 整齐。 整改负责人: 李贵生 日期 2018.6.28				
复查意见	 复查人:  日期 2018.7.1				

附: 施工照片



由 扫描全能王 扫描创建

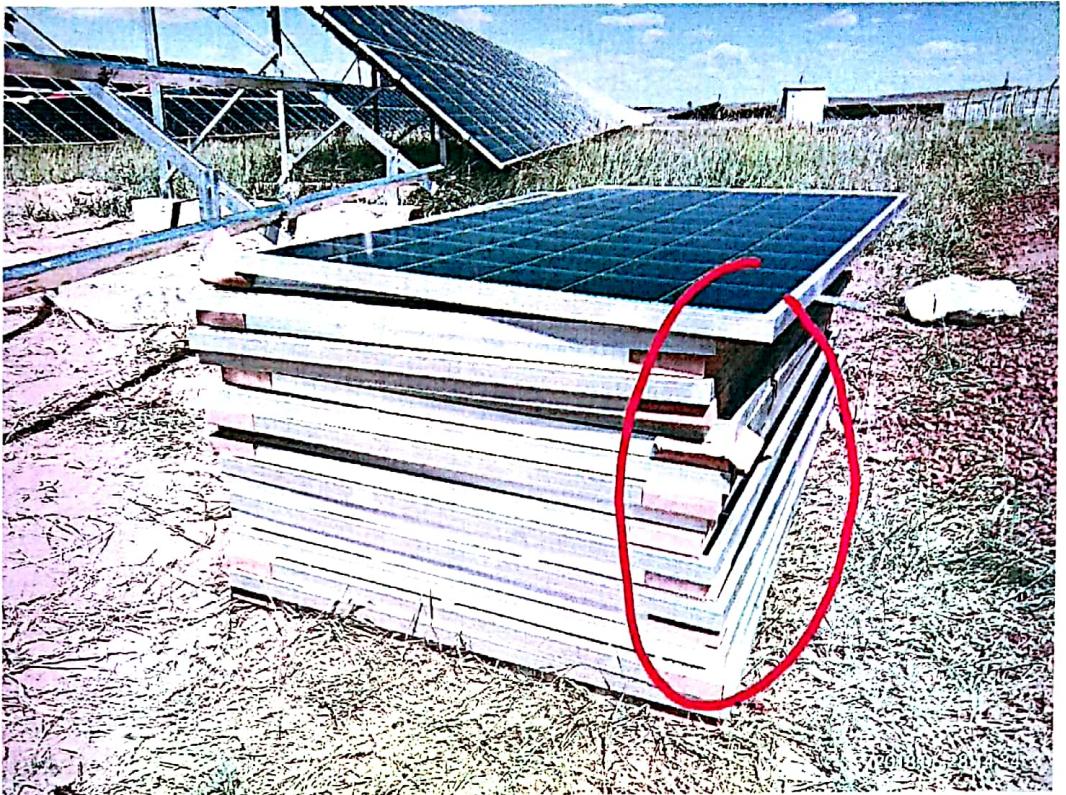

由 扫描全能王 扫描创建
