


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 河南省浙商有限公司屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-ZSFZ-JC-010

施工单位	湖北飞友建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019年7月8日	检查地点	箱逆变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查屋面恢复情况		
存在问题	1. 设备基础底板未做好抄平工作, 存在不在同一水平面上 2. 梁的箍筋间距过大 3. 梁 的 尺 寸 与 图 纸 不 符 		
整改要求	1. 暂停浇筑, 做好抄平工作, 确保在同一水平面上 2. 安排人员对各尺寸进行复核整改完善。 3. 待整改完善后, 我单位进行复核, 合格后方可进行浇筑。		
检查人	王建寿	施工项目部 签收人/日期	材料部 2019.7.9
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 河南省浙商有限公司 2019.7.13		
复查意见	经复查, 已按要求整改, 请按要求进行浇筑工作。 复查人: 王建寿 日期: 2019.7.15		

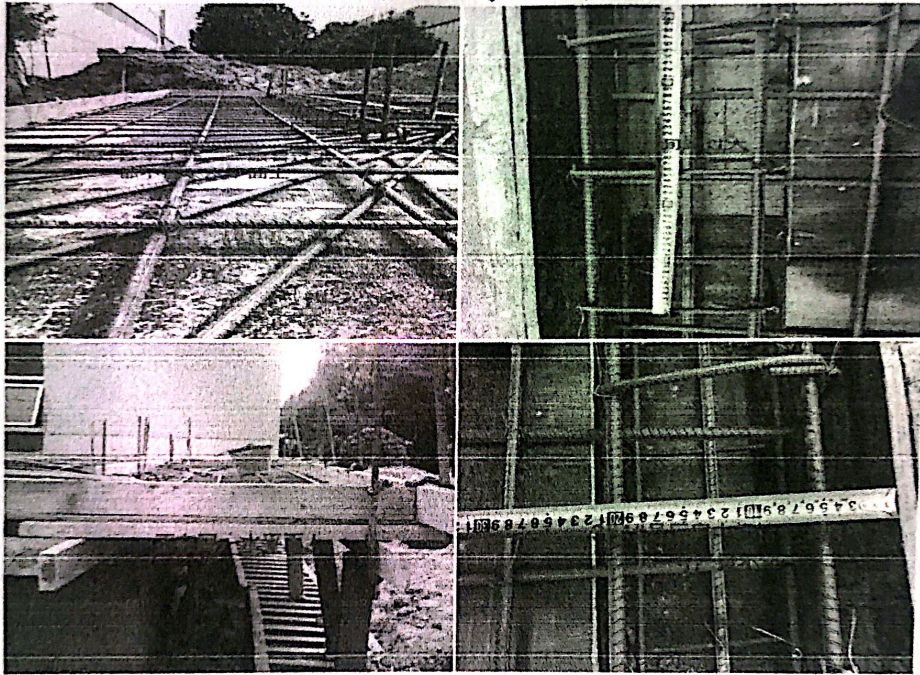
