


监理检查记录表

工程名称: 合肥大陆马牌轮胎(中国)有限公司 8.3MW 分布式光伏发电项目 编号: ZHDL-JC-003

施工单位	阳光电源股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年4月8日	检查地点	NPM 车间、成品库 1
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查导轨、组件安装质量		
存在问题	1. 导轨与导轨未按图纸要求, 采取连接件进行固定 2. 组件外侧导轨挑出长度过短, 不满足图纸大于 5 公分要求 		
整改要求	1. 对未采取连接件固定的进行整改完善, 完成后报验收合格后方可进行下一道工序施工 2. 对组件外侧导轨过短问题采取增加导轨长度(连接件必须避开夹具所在位置)		
检查人	王成春	施工项目部 签收人/日期	李大为
整改情况	已整改 整改负责人: 李大为 日期: 20.4.9		
复查意见	经检查, 已整改 复查人: 王成春 日期: 20.4.10		

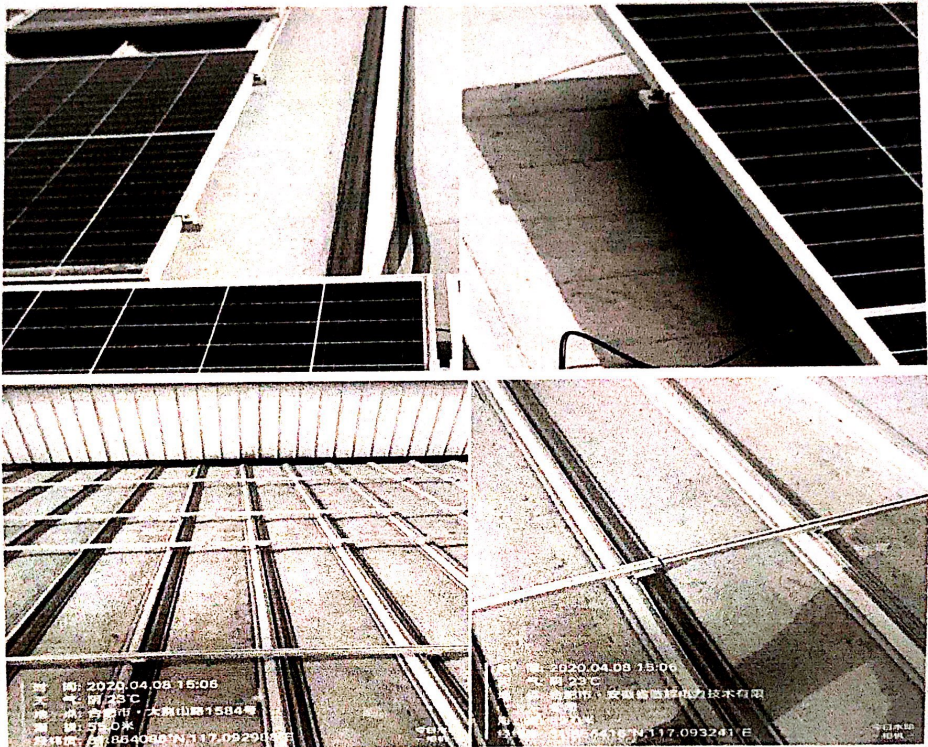

扫描全能王 创建
