




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号：SP-B16-01




施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 11 月 19 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	施工单位采购的水泥墩个别有掉角、漏筋等现象		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.11.19
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2020.11.19		
复查意见	整改完成, 合格 复查人:  日期: 2020.11.19		

注 1. 本表由监理单位填写留存。

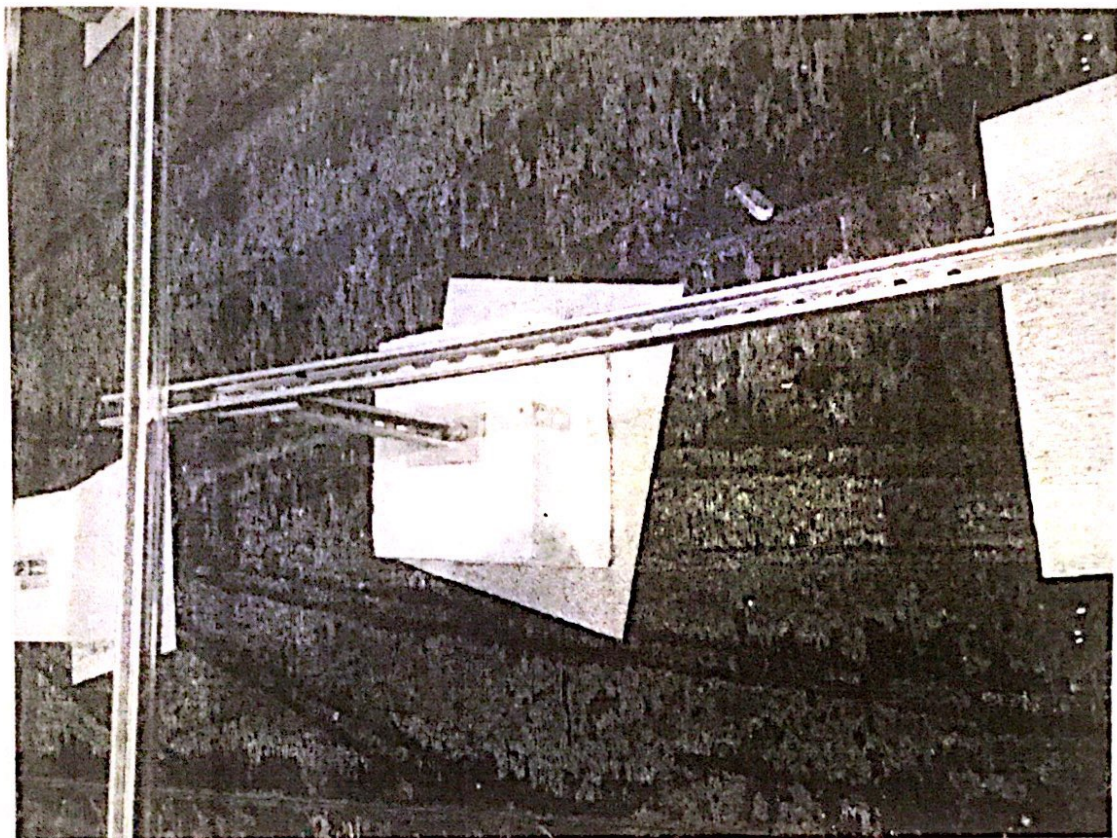
监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号：SP-B16-02

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 11 月 25 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	水泥墩下方铺设的防水垫未调整到建设单位质量手册的要求		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.11.25
整改情况	 整改负责人:  日期: 2020.11.25		
复查意见	 复查人:  日期: 2020.11.25		



注 1. 本表由监理单位填写留存。



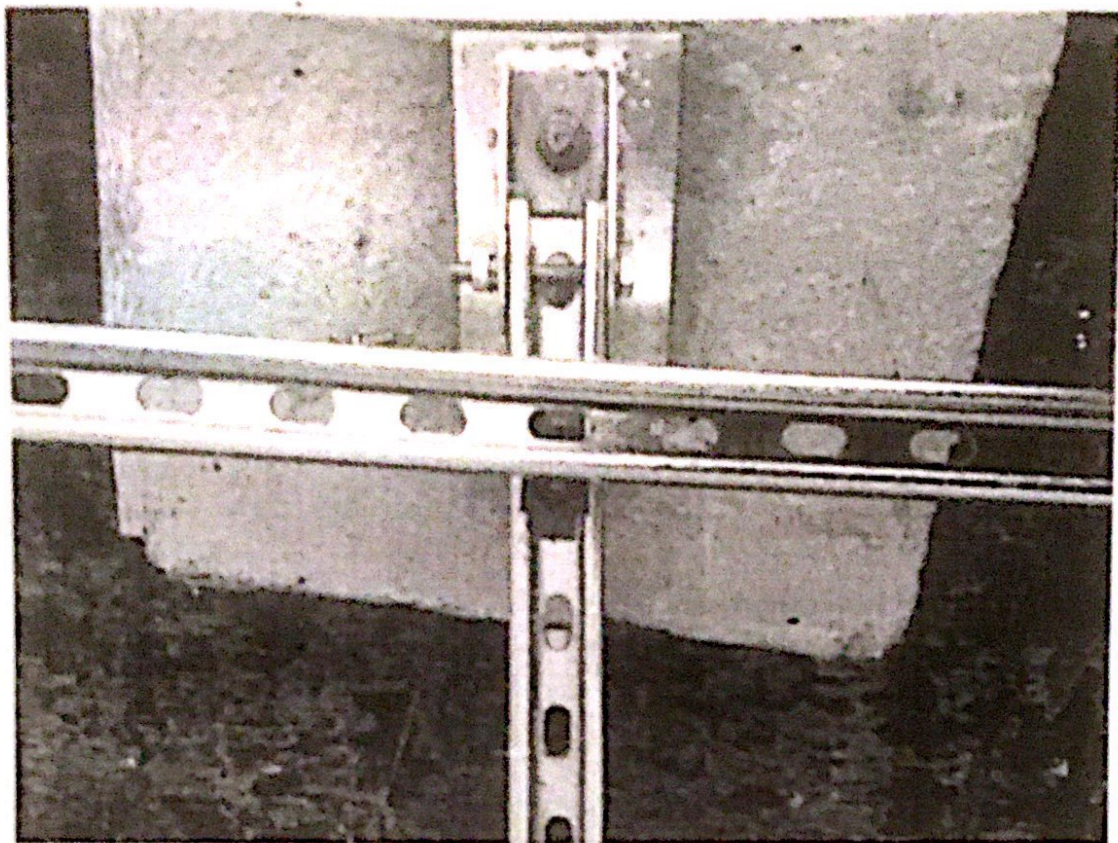
监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号: SP-B16-03

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 13 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	光伏支架验收时发现有个别支架螺丝未紧固		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.12.13
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2020.12.13		
复查意见	整改完成, 合格 复查人:  日期: 2020.12.13		




注 1. 本表由监理单位填写留存。



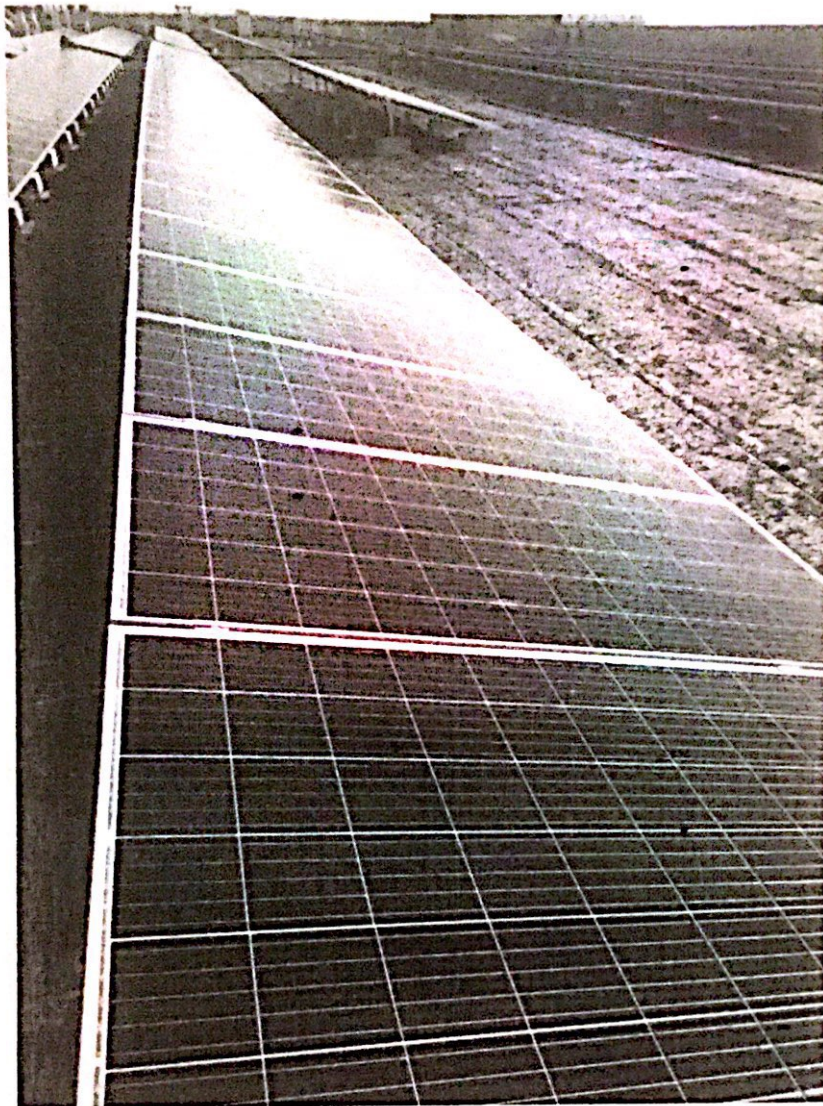
监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号: SP-B16-04

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司		监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 21 日		检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时,发现施工工地存在问题			
存在问题	同一阵列光伏组件安装高低误差较大			
整改要求	为保证工程安全顺利的进展,现要求你单位立即整改,并报予我监理方进行复查。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	 2020.12.21
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2020.12.22			
复查意见	整改验收完成 复查人:  日期: 2020.12.22			






注 1. 本表由监理单位填写留存。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号：SP-B16-05

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 23 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在问题		
存在问题	屋面施工垃圾及组件外包装纸屑未清理		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.12.23
整改情况	 整改负责人：  日期：2020.12.23		
复查意见	 复查人：  日期：2020.12.23		





注 1. 本表由监理单位填写留存。



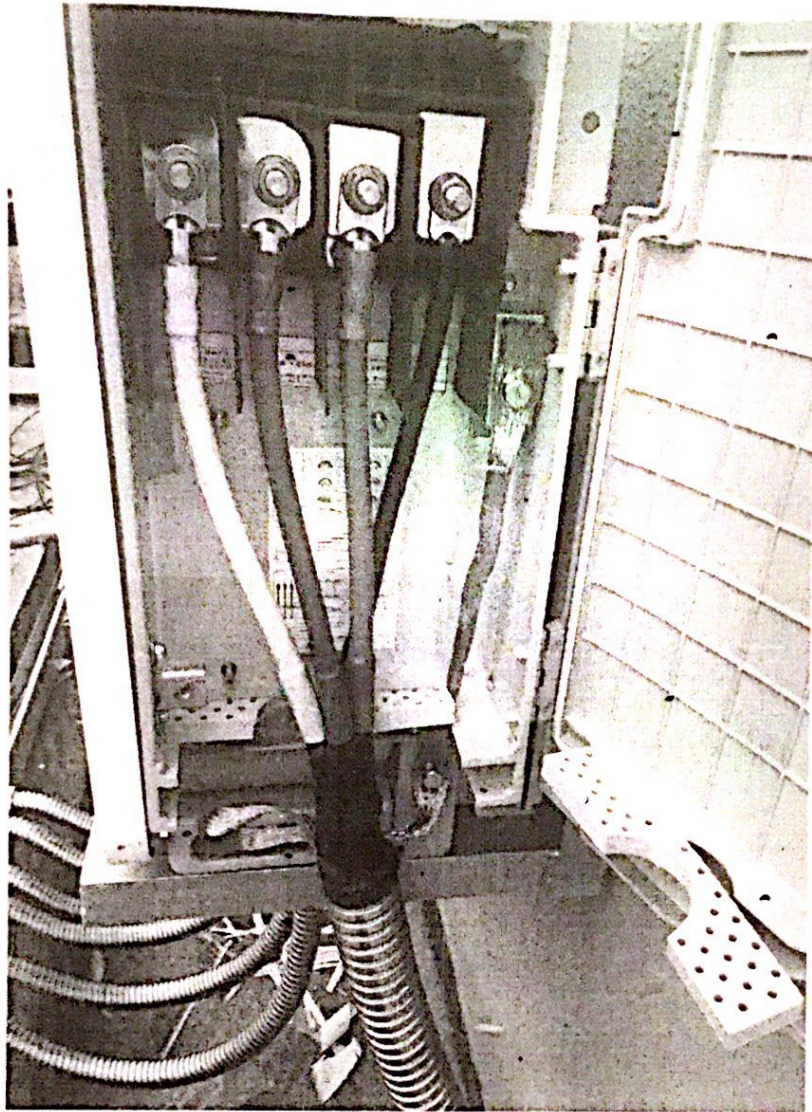
监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号：SP-B16-06

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 27 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时，发现施工工地存在以下问题		
存在问题	逆变器交流侧低压电压剥线长度过长； 电缆接地扁带应增加冷压鼻子，严禁支架固定；		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展，现要求你单位立即整改，并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人:  日期: 2020.12.27		
复查意见	 复查人:  日期: 2020.12.27		



注 1. 本表由监理单位填写留存。



监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江吉美食品科技有限公司屋顶 0.6MW 分布式光伏发电项目

编号: SP-B16-07

施工单位	浙江群朗电力工程有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020 年 12 月 30 日	检查地点	施工工地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	我监理人员在巡视施工工地时, 发现施工工地存在以下问题		
存在问题	支架与接地扁铁焊接时, 应做好直流电保护管防护工作; 接地扁铁交叉处应增加斜撑, 增大接触面积; 接地引下点焊接, 圆钢与扁铁焊接时, 应为圆钢直径的 6 倍, 双面焊接; 不应直接搭接;		
整改要求	为保证工程安全顺利的进展, 现要求你单位立即整改, 并报予我监理方进行复查。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2020.12.30
整改情况	已整改 整改负责人:  日期: 2021.01.02		
复查意见	已整改完成 复查人:  日期: 2021.01.02		

注 1. 本表由监理单位填写留存。

