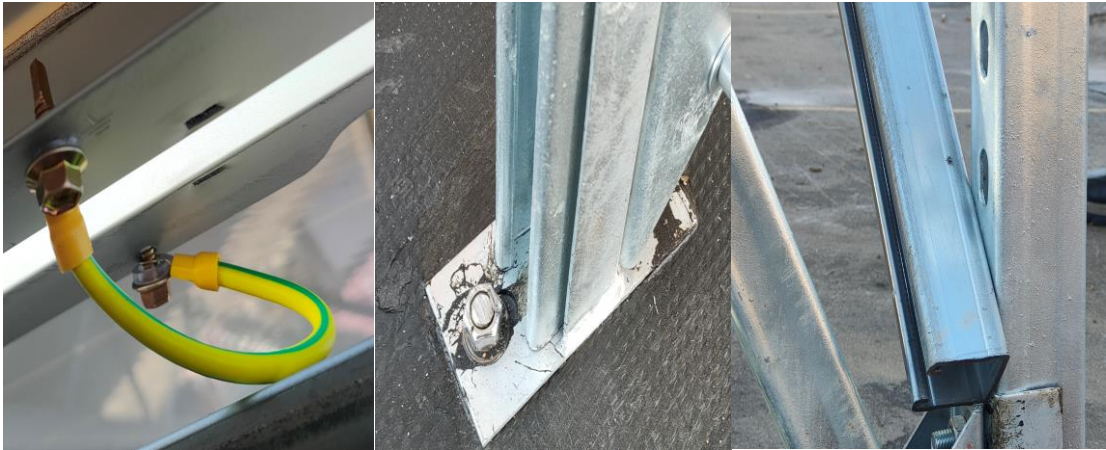


监理检查记录表

工程名称：承德滦平县光伏加电取暖改造工程 60MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-LPXM-JLJC-04

施工单位	河北舒阳新能源科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 11 月 26 日	检查地点	大屯镇窑岭村张国林家屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1. 组件之间的接地线虚接； 2. 光伏支架底座膨胀螺栓安装不规范； 3. 不同材质的光伏支架存在混用的现象。		
存在问题			
整改要求	1. 组件之间的接地线重新安装，不得存在虚接的情况； 2. 更换膨胀螺栓，丝扣必须漏出 2-3 扣； 3. 更换不同材质的光伏支架。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期： 年 月 日		
复查意见	复查人： 日期： 年 月 日		
