


隐蔽监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

电缆区域	W9#风机塔筒到 W9#风机箱变	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸
电缆型号规格	ZC—YJV22—1.8/3—3X300+1X150	电缆根数	9 根、光缆一根（24 芯）
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 1m—4m	符合电缆敷设规范要求
2	电缆沟宽度	沟宽 2m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10CM	
8	软土回填后	盖预制混凝土板（合格）	
9	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
10	电缆沟回填后何处设有标志桩	无	

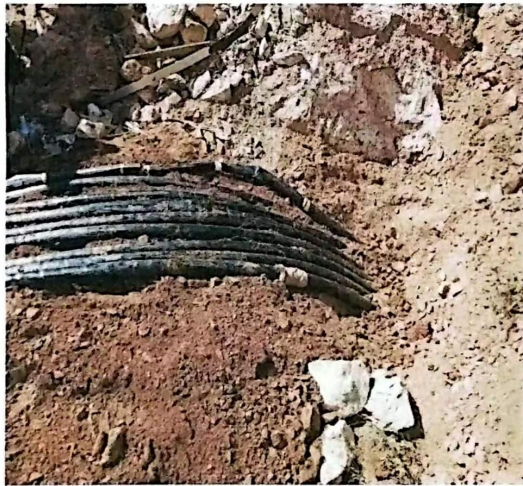

隐蔽检查结论：合格

质检机构	验收意见	签 名
施工单位	符合要求	吴思祺 2023 年 08 月 30 日
监理单位	符合要求	徐明生 2023 年 08 月 30 日

隐蔽工程监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

电缆区域	集电线路 1 回路 1N17 至 1N17+1 塔基	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸	
电缆型号规格	3XZC—YJY23—26/35—1X500	电缆根数	电缆 3 根、光缆一根，190 米/根	
序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注	
1	电缆沟深度	沟深 1.1m		
2	电缆沟宽度	沟宽 1m		
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无		
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm		
5	盖砖和警示带	符合要求		
6	电缆与电缆间距最小距离	25cm		
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10cm		
8	软土回填后	符合要求		
9	电缆接头处有未设标志桩	无接头		
10	回填细土	符合要求		
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	符合电缆敷设规范要求	30 米标志牌、标志桩	




隐蔽检查结论：合格

质检机构	验收意见	签 名
施工单位	符合要求	吴思祺 2023年09月16日
监理单位	符合要求	黎建光 2023年9月16日

隐蔽工程监理检查记录（直埋电缆）

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—ZHJL—YBJC—

电缆区域	集电线路 1N1 塔基到升压站一次仓室直埋电缆	检查依据	电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 GB 50168 —2016、施工图纸
电缆型号规格	3XZC—YJV23—26/35—1X500	电缆根数	电缆 3 根、光缆一根，190 米/根

序号	检 验 项 目	检 验 结 果	备 注
1	电缆沟深度	沟深 4m—1m	
2	电缆沟宽度	沟宽 2m	
3	沟内有无石块、建筑垃圾	无	
4	电缆上、下铺沙或软土深度	上、下 10cm	
5	电缆间距	25cm	
6	电缆与电缆交叉最小距离	30cm	中间用绝缘隔板 5cm
7	电缆底部和上部铺沙最小距离	10CM	
8	软土回填后	盖预制混凝土板（合格）	
9	电缆接头处有未设标志桩	无接头	
10	回填土是否经分层夯实	分层夯实	
11	电缆沟回填后何处设有标志桩	30 米标志牌、标志桩	符合电缆敷设规范要求



隐蔽检查结论：

质检机构	验收意见	签 名
施工单位	符合要求	吴思祺 2023 年 9 月 3 日
监理单位	符合要求	陈明 2023 年 9 月 3 日
