

监 理 日 志

工程项目名称：松山区特等蒙古族自治县城市道路工程

监 理 单 位：常州路新电力工程咨询有限公司

日期：2013 年7月22日至2013 年9月7日

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年7月22日	星期	五			
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
东南风3级	32~19℃	多云零星小雨	001			
监理人员动态	现场监理周群1人					
施工情况: 进场道路施工, 2台挖掘机, 大型自卸车9台, 桩机组装进场。放线2人						
监理工作情况: 2016年7月17日中午接受到大庆杜尔伯特指令, 车北京下午出发, 7月18日20:00到达项目地。7月19日至7月22日场区道路施工(铺垫建筑垃圾,						
文件及会议:	板: 39588 桩数: 6300 组数: 800组 10MW 38588 6139 组: 817组					

记录人:

周群

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年7月23日	星期	7.1			
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
东南风2级	29~20℃	多云				
监理人员动态						
施工情况：放桩点1组3人、 货场施工：钩机两台、自卸车11台						
监理工作情况：参加讨论研究打桩方案，杨、杨、张、周文 桩机老板。 现场巡视、提云螺：推进场道路建议。						
文件及会议：处于场地平整阶段						

记录人：周喜军

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年7月24日	星期	日
当日风力	当日气温	天气状况	编号
西南风2级	29~20℃	晴	1
监理人员动态			
施工情况：施工用水井一口，站内生活用水井一口，全部完成 施工场地平整，已完成。 放点、2人，456个			
监理工作情况：关于工程图纸问题， 现场巡视。			
文件及会议：站内场区三通一平阶段			

记录人：

周吉祥

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年7月25日	星期	—
当日风力	当日气温	天气状况	编号
东南2级	29~20	阴转降雨	
监理人员动态			
施工情况： 进场道路，场地平整。			
监理工作情况： 等待开工。			
文件及会议：			

记录人：周群

监 理 日 志

No.

监理日期	年 月 日	星期	二			
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
南风2~3级	29~20℃	晴				
监理人员动态	不变					
施工情况：进场砂6车，碎石。 搅拌站进场；地泵一台 桩机钻试验孔						
监理工作情况：签桩资料1份 现场巡视。 已要求施工单位落实检测实验室。（口头） 进场物质质量保证资料齐全。						
文件及会议：图纸进场三份						

记录人：

周燕军

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年7月27日	星期 三				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
γ-3	25°-34°	晴 天				
监理人员动态	刘富斌到项目部工作, 邓正常					
施工情况: 一名小挖机在左侧(围护边)开挖, 一名抽水机在右侧抽水, 两名工人负责打桩机, 打桩机在右侧双排管桩部分钢筋的设置, 一名大挖机在右侧。						
监理工作情况: 下午16:40分在项目部与周总及周孝军、打桩机班班长、抽水机班班长如何提高打桩机的效率, 讨论的讨论。						
文件及会议:						

记录人:

刘富斌

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年7月28日	星期 四				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3	25℃—34℃	晴天				
监理人员动态	今天周嘉军放假6号调休工作正常					
施工情况：今天周嘉军带着以从灰线线'槽(用)线放线'孔板的天寸. 每板之间板距1.8m. 钢筋板之间1.5m. 部分前号排1.67m. 一部分1.47m. 灰线槽板有4号从灰线线水泥浆料地. 灰线槽板有以从灰线线槽板进机(翻)一名小机板灰线槽板开为路水在南部. 各: 道路于6月15日开始修于7月20日结束. 东灰9号4号板前号前号后八号8号板前号. 板机修.						
监理工作情况：到现场巡视灰线线 槽板板 钢筋板机. 对施工现场的灰线线 槽板板 钢筋板机 发电机 机用箱 板地 回等以从灰线线 槽板板 板机修.						
文件及会议:						

今天进一车
木板425木板
25T进一车
φ6.5. 12#板
箱. φ6.5. 1#板
φ12. 12#板
支54x6米.
预埋件2000块
钢板1套.
金永达板
板进一车石
子.

记录人: 王德成

7-7. $123 + 196 = 329$
619 根豆.

No.

施工情况：该楼排架5名以左排架的。钢筋加工棚以左加工钢筋笼和柱头预埋件， $150 \times 190 \text{ mm} \times 8 \text{ mm}$ ，钢筋和灌筑之。设小铲车一台，钢筋机一台，水平线控制板一块。2016年7月31日造到8月10日复修板45根。今天进入四车种。施工基本结束，所有火车运到站60000部送到地。

文件及会议:

记录人:

2016.8.27 2. 140
329+140=469

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月2日	星期				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	27℃ — 30℃	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况：今天材料站以正常供应，钢筋翻砂场正 常施工，钢筋翻砂场正常施工。今天只有一台挖掘机 在翻砂场底部填土翻砂，准备为修路之一半翻砂 翻砂。						
监理工作情况：到现场巡视时现场的质管和环境文明施 工提出进一步的要求，要求各组长必须带头做好。						
文件及会议：						

记录人：刘伟文

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月3日	星期 三				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
1-2级	27℃ - 36℃	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况: 今天揽材船4人-1台铲车-1台机加钢筋笼85X 加工钢筋笼, 钢筋灌注泵52-1台钢筋机-1台铲车-1台振 动泵(棒)-1台打桩机(水手找) 陈明带物资公司来帮 场地准备进桩, 桩头未出, 今天打10.20分左右出桩 头, 今天-另2人到现场检查, 桩头质量合格进夜 书总要求机加钢筋笼, 钢筋笼材料准备和检查 查, 1台机加钢筋笼在地继续加工处理。						
监理工作情况: 今天到现场巡视, 与现场施工队(周工)沟通 桩头质量, 桩头进一安快通, 纹胶改管第一。						
文件及会议:						

记录人:

孙富文

监 理 日 志

No.

监理日期	2018年8月5日	星期 五				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2 - 3级	22℃ — 26℃	阴天小雨				
监理人员动态	正常					
施工情况：今天下午有小雨施工没有正常进行，搅拌站取钢筋加和火药等预拌配，浇筑混凝土浇筑200较正常浇筑进一寸45米长30寸。						
监理工作情况：今天下午四川瑞安建设股份有限公司汇报项目部帮助业主汇报项目部和项目部文明设计检查发现机机配电箱全部以投地。						
文件及会议：						

记录人：

孙德刚

监理日志

监理日期	2016年8月6日	星期 六	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3-4级	21℃ — 24℃	阴天有小雨	
监理人员动态	陈		
施工情况：今天早上的小雨，将一些室外工程暂停。按照计划，在模板拆除前，钢筋绑扎已经完成。从东面的钢筋开始，然后向西面，钢筋绑扎完成。钢筋绑扎工人：一名杨军成，一名李学斌。发过机带下。			
监理工作情况：到施工现场巡视，查看设计图纸（图号V35015-D0701-01到-05）。			
文件及会议：			

记录人:

监 理 日 志

No.

施工情况:今天接机师傅有2人,一名负责开车送料,刘解加2名
5人在加钢筋笼和浇筑预埋件,潘康龙板有工人
2人,三名负责转运送料,一名刘解加在抄平,施工基本
正常,下午浇筑预埋件,送来的变压器和电缆线
施工队是朝日变80KW,各种配件都进入现场,

文件及会议:

记录人:


监理日志

No.

监理日期	2016年8月10日	星期	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
1-2级	21°—20°	晴转小雨	
监理人员动态	正常		

施工情况: 该桥墩底端26# 5人-号+号桥墩共砌. 钢筋
请筑墩底端26# 7人-号+号桥墩共砌. 一分水线
在桥中. 钢筋设有如钢筋笼. 因设有钢筋了预填
体也没有火焊. 共540分左右的桥墩. 距墩底更接相线
和水平线. 水平线以5号道路为基准. 测水平线初为0.3cm
成110mm ± 0.00 为57cm. 共24.5分左右的桥墩. 距墩底更接相线
测.

监理工作情况: 对现场巡视, 发现钻孔桩施工时, 黄泥线, 对泥线的桩孔位置进行复测, ± 0.00 为 57.0m

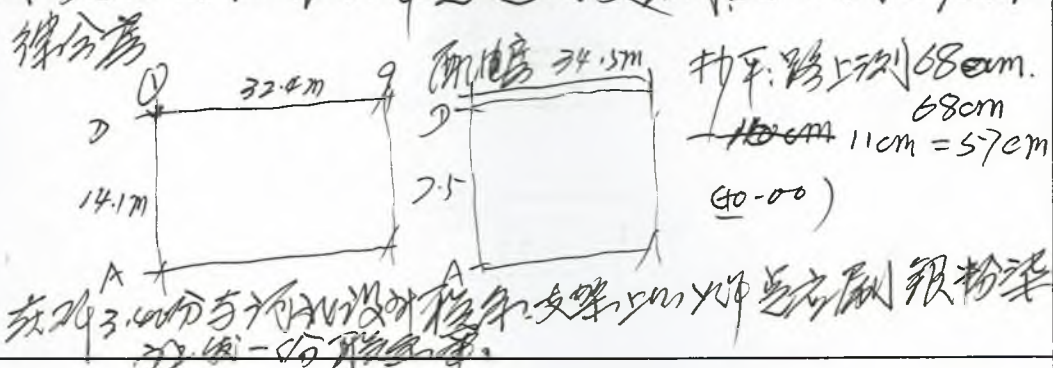

文件及会议:

记录人:

1298+152=1450

监 理 日 志


No.

监理日期	2016年8月12日	星期 五	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
2-3级	27℃ - 36℃	晴	
监理人员动态	正常		

施工情况：今天继续施工，主要进行钻孔灌注桩施工。上午11时左右，10号钻机停止施工，在下午11时左右，6号钻机等待，钢筋笼已吊至井口，6人正在绑扎。同时用吊钩将2号钻机吊至井口，可用吊钩80KW，煤油房，而电房继续开挖，两处井口挖深为2m，有6名工人正在做降水井，用φ50mm钢管入地1.5m，进一车机板，另一车机板开挖，进一车机板。另一台钻机在平整场地。

监理工作情况：到现场巡视，与项目部施工员高坝别，因桩基施工，故高坝别调查。

用尺丈地面2m，另修筑垫层-2m

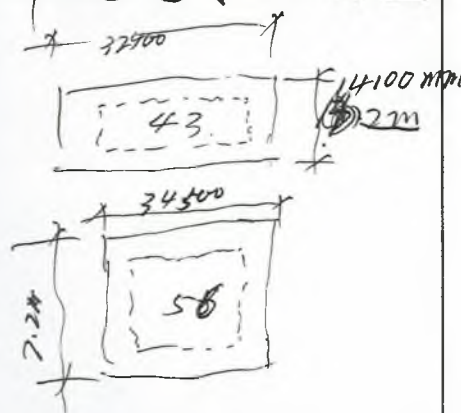

文件及会议：

记录人：

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月13日	星期六	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
2-3级	26℃ — 36℃	晴天	
监理人员动态	正常		
施工情况：1. 综合楼分房配电房附近临时配电房降水井只有一名用有线电话技术人员在现场其他人员。昨天夜间因变压器线路故障等待验收。须主管人员。楼前部5人死故障2人。钢筋加工和预埋件等。共计2人在常施工。1人钢筋机5人。吊车16名2人在施工。施工正常。1人吊车一大。机械在10号方陈排沟排坑和车晒地。在2号17号方陈有预埋件正常。记给综合楼配电房配电房配电房配电房配电房降水井2人。示灯降水井。			
监理工作情况：到现场的巡视处理因其他原因。			
文件及会议：			

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月14日	星期 二				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	25℃-35℃	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况：今天煤分房、配煤房、除铁继续1人一名在连接 调直机、剪断机、弯曲机、调直机的电线和接地的线又接 二箱接地的有3人左右接当时收放、接煤房5人那接 钢筋的2人和接煤房5人那接钢筋的白班和夜班 二台打桩机、5名工人在接桩、共12名工人在接桩、 接二台桩机在打桩。煤分房叫进车钢筋、一名大挖机继续 翻地、接桩。						
监理工作情况：到现场巡视、写文案、签字。						
文件及会议：						

记录人：

监理日志

监理日期	2016年8月15日	星期 一	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3-4级	21° - 32°	晴天	
监理人员动态	正常		
施工情况：今天杨振站5人，二标孔精筑C30砼14人，5方+铁车浇筑砼。基本正常。指出质量进度问题。预拌5人在现场管理钢筋制配及绑扎。灰浆台旁和预埋房处有两名钢筋工在绑机、杯形基础旁部钢筋工，有两名瓦工清理基槽。准备明天，24一台挖土机和一台大挖机在河内料场转较多土方，为打板桩做准备。一台大挖土机在周边局部东岸开挖地，在一要路大挖机到大门口整理地基并建小室。			
监理工作情况：到现地巡视，发现该房新预埋房的钢筋（图缺）。			
文件及会议：			

记录人:

王雲文

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月16日	星期 二				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	18℃—29℃	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况：今天大墩机场南水路面侧查核物机槽管放2.8.9.10方阵的线。钢筋加工和预埋件均停止，因为预埋钢筋师停的槽管放。为钢筋槽管放之端，所以人员和设备与昨天基本相同。故昨10.00分请周建毅文习，查看保场文等。刘磊刘、陈明胜、杨国发刘、张传利分别对楼舍房、机电房进行了带槽管放槽管放之端，满足地基和设计要求进行下道工序。						
监理工作情况：到现场巡视，对水电消防预埋和钢筋加工等。						
文件及会议：						

记录人：

刘磊刘

监理日志

No.

监理日期	2016年8月17日	星期 三	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
2-3级	16℃ - 28℃	晴天	
监理人员动态	陈		

施工情况：今天钢筋绑扎施工有方大机新6名人员在楼2号
 吊车。揽杆站正常供货。N号机设有楼的内部设
 有铁网筒笼和预埋件，钢筋到10号还设有来钢筋
 2、电焊工都停工。综合楼和南病房。分别有100mm厚的
 填充层和厚300mm 贵，1000mm素C30，配6人在浇筑。钢筋
 3人绑扎推筋，本2人在做V板400x400mm柱的拉拔其他
 机械没有施工。故昨。11:30分有进了一捆重12根Φ6.5钢筋，在12:30分
 午供200钢筋。钢筋绑扎完后开始浇筑混凝土。在13:30分左右浇筑完板形20

监理工作情况：到现场巡视处理内业资料。在14:00分（张总
 第二车到现场调研。我们陪同调研。（4女，4男）在2号
 16:00分左右（司大为副局长乘座了车。5个人到现场查看停
 7日。
 备注：2016.8.25日。转到2016.8.25日。时表。
 10#由北向南第二排X:5186414.827。Y:609683.012
 由南向北X方向轴9米 X:5186423.827。Y:609591.812

文件及会议：南病房：浇筑为圈梁要求500+500砌筑与柱240m
 要砌板面角钢40x4。和L50x5。10#槽钢。保证偏差差不大
 在±2mm之内。

记录人:

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月8日	星期 四				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	16℃ - 29℃	晴				
监理人员动态	正常					
施工情况: 今天揽抄站钢筋加工棚内部正常进行。二台孔灌注桩机台方斗铲车24号人员施工正常。各技术负责人调整方阵的度板等设计决定综合房侧边房时模板拆除后, 一辆车在因填土, 从早27.30开始, 钢筋4人负责架梁的钢, 2人负责加不搭的模板, 各地方负责人负责搭架的支撑, 该方阵调整在揽抄机, 在24.30分左右开始不用, 综合房素石200mm² x 100mm²又因填土结束, 侧边房400x400, 完成了该方阵的拆除。						
监理工作情况: 到现场巡视, 检查质量, 检查是否按计划10#方阵度板, 等待设计审批。						
文件及会议:						

记录人:

孙富利

监理日志

No.

监理日期	2016年8月19日	星期	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
2-3级	15℃-28℃	晴天	
监理人员动态	正常。		
施工情况：今天，钢筋加工，预埋件焊接，各2人。模板支5名，方钢风灌筑机。土方修整，14名2人。施工正常。在煤房，原机房。5名。浇筑筑板。3名钢筋。解场加。因架钢因昨天晚上6点多钟下一场大雨。但是大部分降水施工没有停。			
监理工作情况：列现场巡查，看2.8.9.10方阵图。因路5方阵位置与放线和设计均无位置。如何相符合。			
文件及会议：			

记录人:

监理日志

No.

监理日期	2016年8月20日	星期	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
2-4级	15℃—28℃	晴天	
监理人员动态	正常		
施工情况: 今天, 取土方一台大挖机在挖回填土, 回填土因染 灰房灰部, 煤仓房有4名工人, 回东小工在砌墙, 由600变500 370mm, 砌墙5井, 钢筋4名在加钢筋, 木4人在配漆, 木工模板, 一名小工在砌灰红砖, 在土方阵有2名叔线技 术员在砌线, 履带式打桩机停2, 大挖机在挖土, 还有小铲车 2名工人, 钢筋工, 预埋5人都在干活, 进了两捆木料 2m和1.5 米(因因木料 2m和1.5米在干活, 抽水(场地集水) 2名有打 桩机, 在较型设备, 发电机, 电缆, 配电箱, 2号车。			
监理工作情况: 到现场巡查, 4和周2部阵的机进因因再 次调查质量。			
文件及会议:			

记录人:

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月21日	星期 二				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
1-2级	15℃-26℃	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况: 该配用房有钢筋5人负责绑扎圈梁, 250X400 20@800及24号大工, 同时有继续砌砌块墙合房地: -0.060 以及370mm墙, 一名负责砌50x5找地, 4名负责砌模板等 孔洞模板, 一名大机班8号方陈旋2名以, 5名以负责挖和 挖, 8名以在钢筋砌墙砌钢筋等砌块等挖填土方, 全 进在进内子和石。						
监理工作情况: 到现场巡查, 准备资料, 看规范。						
文件及会议: 2016年8月10日召开监理例会。						

记录人:

孙磊

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月27日	星期 一	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
2-3级	15℃ - 29℃	晴天	
监理人员动态	正常		

施工情况：今天继续浇筑地梁，20#楼解#8，400x250mm间距2月周，加设500mm@100mm梯坎内4名钢筋工在梯坎处合度破根处（图）解#12间距200mm#6，房固固上部有构造筋互互互继续浇筑70mm#6，梯坎5人在梯坎板互互互在门窗口过梁，两名在梯坎板地，在梯坎板有4名钢筋工，一台大搅拌机，两台钢筋机，搅拌机5名，钢筋工15名，钢筋加工设及施工（可能没有钢筋工）新架梯坎板第一台大搅拌机，在梯坎处浇筑400x250mm（图）

监理工作情况：列现报运心，列地质量发报报告。

文件及会议：

记录人：

孙敬利

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月23日	星期	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
1-2级	15℃ - 30℃	晴天	

监理人员动态

陈

施工情况:

今天综合房有8名瓦工在继续砌墙,两名瓦工在
3级接地的预埋^{预埋}木方拆除梁模板、两名钢
筋工在绑扎综合房370x250mm Φ 12.6柱箍筋
间距200mm^{间距}梁、一名木工160个电渣压力焊。钢筋工
2名在绑扎梁、4名在绑柱、14名在绑梁、模板工5名在
收口、一名在收口在8月21日开过一般列分又都去收口(因为
没有钢筋钢筋的木工、钢筋工在收口钢筋工在收口钢筋工在收口。
钢筋工在收口钢筋工在收口钢筋工在收口。

监理工作情况:

到现场巡查,学习规范,整理资料。

文件及会议:

记录人:

王

3725 + 217 = 3

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月24日	星期 三				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	16℃ — 32℃	多云				
监理人员动态	陈					
施工情况: 今天该栋楼有3名工人, 2名在灰土砌电管沟, 因没有电管沟的作法, 证暂停一天。施平信又停, 有3名新钢筋工绑扎新钢筋和梁合房(即梁钢筋)12a 200mm, 370x 250mm, 构造柱4a 12, 暗柱钢筋按梁合房(即梁钢筋)在梁钢筋合, 2名新工人, 因号上铁车铁扣, 一大块板在吊钩铁扣, 2人4名, 拉材料, 5名, 2人陈施, 因没有钢筋, 钢筋工停。						
监理工作情况: 到该栋楼巡视, 陈尔设外院, 尽快给控制房的通线, 陈尔设外院, 尽快给控制房的通线, 陈尔设外院, 尽快给控制房的通线。 到该栋楼, 5月1-5月有大雨, 还朝天, 为加快施工, 陈尔设外院。						
文件及会议:						

记录人:

陈尔设

3942+167=4109

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月25日	星期 四	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3 — 4级	14℃ — 27℃	晴天	
监理人员动态	正常		
施工情况: 今天在南睡房, 煤舍房, 用一台拆去机, 一台搅拌机 和一台叉车(同拆去). 用一台拆去机, 一台搅拌机, 一台叉车 过梁. 拆去5公分左右板, 拆去机轴系机了. 先拆去 二台打孔机和钢筋. 二人都去等料, 钢筋还没有来, 有的 钢筋在拆去时拆坏的. 在5公分板内复生. 拆去南睡房和煤舍房的钢筋. 拆去2-6. 拆去3是拆去3- 拆去. 500板, 一拆去5通, 三台400大钢筋机机了.			
监理工作情况: 到现场巡视 钢筋煤舍房 浇筑构造圈梁.			
文件及会议:			

记录人: 叶富礼

4319+239=45

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月28日	星期六				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	16℃-34℃	阴有雨				
监理人员动态	正常					
施工情况：今天用油房有5名架工架架子，有瓦工10人瓦砌花 样合楼面并板机起，江灰做模机机，暖人靖防，熟练有 4名钢筋工架板板的钢筋，有焊工2，2人在支楼合房外圈 焊，做二次砌砖作看。在钢筋部分，做第钢筋架，人工，机 多车2号，搅拌机正常，塔吊14号人，钢筋机又有4名钢筋工架 下钢筋和预埋件，另一号大钢筋机在转校工部面。冲塔板文岸文司 被清除，陈朋与村一、二号冲塔进行初验。						
监理工作情况：到现场巡视，看可制支梁圈，研第10号冲塔的面 局，						
文件及会议：灰冲板板以书分案，高只以周建新板板，对10号冲塔二 排处理意见①：冲塔第一排放在10号冲塔西面二排板无1并2号冲塔 东面，每排板一板。						

记录人：

4558+182=4730

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月28日	星期 日				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	15℃—34℃	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况：该所电房有木工4人在变梁、板、柱模板及2102在砌筑宿舍房二次浇筑30mm厚钢筋2人连板、梁钢筋、水电3人在电房搭$\angle 50 \times 5$、$\angle 40 \times 4$、$\angle 10$槽钢的$\phi 8$钢筋钩、渣打钢筋、电焊机、一台挖机、20名工人旋挖桩孔桩钢筋、5名模板工人、7名钢筋工在砌筑宿舍房预埋件$210 \times 190 \times 12$的钢筋等。						
监理工作情况：到现场检查看图纸整理资料。						
文件及会议：因总办交代、晚饭后召开管理科管理开会、要抓好工程进度、安全文明施工、各班组要遵守纪律。						

记录人：叶瑞记

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月29日	星期 一				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
3-4级	13° — 27°	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况: 今天浇筑部分, 从南边从X中开始, 一致有班。大建部分, 叫名钢筋在顺房后部绑扎梁钢筋, 本工人在捆板子横板钢筋间距500mm左右一巡, 浇筑后, 有板板板, 五工以在继续用钢筋, 程分房板, 本部分, 工本和板板板板的梁板板。						
监理工作情况: 到施工现场, 处理内业资料。						
文件及会议:						

记录人: 张锦记

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年8月30日	星期 一	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3-4级	13°-16°	阴天有阵雨	
监理人员动态	正常		

施工情况：今天第一车架梁条在8:50进场，由陈阿福接收。具体数据如下：
 灰砂砖房有钢筋5人左右在砌机分布筋150x150过梁处。
 梁的加密筋100mm 钢筋架200mm 有木架在修梁柱加固在
 粮食房有1条瓦在砌钢筋240mm(内墙) 灰砂砖房有3条
 水电在砌钢筋板的管成子包管，14捆13捆，8条，3捆5条5捆3条
 灰砂砖了。(一捆100斤) 灰砂2.20分开始下雨，灰2.45分到2地2人要
 2楼的设置了，在粮食房到灰砂砖砌墙，砌完2楼，打砌清泥没有做。

监理工作情况：到现场检查，查看图纸，支架找发，准备技术
 变更。
 这车支架进场货车被当地群众人要1000元的过路费。

文件及会议：

记录人：叶锡斌

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年9月1日	星期 四	
当日风力	当日气温	天气状况	编号
3-4级	14℃—27℃	明天有雨	
监理人员动态	正常		
施工情况：今天项目部的雨，工地没有施工，只有管桩工人在现场。 我们等着，要等一车一车一车货不知能不能到现场，泥路，车在不能开着走了。			
监理工作情况：			
文件及会议：			

记录人：

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年9月2日	星期	二			
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
3-4级	13℃ — 21℃	阴有大雨				
监理人员动态	正常					
施工情况：今天，因明天大雨现场没有施工。来了两车13米长的半挂车，拉的柴和支撑杆。路设标方开车，用一名铲车50型从后边推，杆开到场边。卸车到晚上8.20分左右。						
监理工作情况：协助业主施工，保证道路畅通。 做一部边杆。						
文件及会议：						

记录人：

孙海洲

监 理 日 志

No.

监理日期	2006年9月3日	星期	六			
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	18℃-30℃	晴天				
监理人员动态	正常					
施工情况: 该段现浇板有2.6人. 用2.板3人给梁板柱 C30砼 L(2) 250X400. $\phi 8 @ 100/200$. L(5) (1) 250X400 $\phi 8$ 2#18 2#18 2#18 2#18. 100/200 (2) 2#18 2#18. L(7) 250X400 $\phi 8/100/200$ 2#18. 板厚150mm L(2) 250X400 $\phi 8/100/200$ 2#18 2#18 灰板新双层双(2) $\phi 8 @$ 板厚150mm 150. K66 (1) 250X600 $\phi 8/100/200$ (2) 2#20 7#20 8#12. 分布 筋$\phi 10 @ 200$. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 搭设内围圈梁. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 灰板新双层双(2) $\phi 8 @$ 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm. 板厚150mm.						
监理工作情况: 到现场巡视现浇板.						
文件及会议:						

记录人: 王静

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年9月4日	星期 四				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	17℃—29℃	多云				
监理人员动态	正常					
施工情况: 今天综合房有10名瓦工, 灰工砌内墙, 240mm 砌 浆砌, 2人负责搭设综合房的内架, 有两名钢筋工绑扎综 合房的板钢筋解绑。2: 今天浇筑支架的开始进场, 浇筑第 10层首先浇筑板, 2: 综合房有整取。 今天4组钢筋试验, 一组支架, 有在10层浇筑现场 交清楚, 有综合房有板板板板板板。						
监理工作情况: 到现场巡视, 学习图纸, 做整理。						
文件及会议:						

记录人: 叶露

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年9月5日	星期				
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	18℃ — 28℃	阴天 阵雨				
监理人员动态	正常					
施工情况: 该有瓦工从砌筑棉舍房的内墙, 有木工架木方格及棉舍房顶板模板, 有泥水工在搞水电预埋, 有钢筋工在砌筑棉舍房圈梁和顶板钢筋, 在第四方阵有泥水工在砌筑化粪池。						
监理工作情况: 到現場巡視, 搞交架技术和特交负责。						
文件及会议:						

记录人:

邓贵利

监 理 日 志

No.

监理日期	2016年9月6日	星期	二			
当日风力	当日气温	天气状况	编号			
2-3级	16℃ — 27℃	阴天,有阵雨				
监理人员动态	停					
施工情况: 今天综合楼有瓦工以灰砌筑内墙,有架子工2.5人灰搭设综合楼顶板架子,有木工在综合楼综合楼顶板模板的安装,有水电工在综合楼顶板预埋管,水电房有木工在灰泥砖和对角线房顶部上砖,搭砌顶板灰包墙,支架安装时没有人施工。 灰泥,灰泥时一为铝孔机,一为木机都有施工,量在2.20时到办公室发现两名机械搭架,中午时杨带两名工人到临时大门搭架了,将搭架搭好,没有人。(24)						
监理工作情况: 孔机杨德社,杨杨文等谈,砌孔墙,搭板板,以体检后,以,再相能部等跟收。						
文件及会议:						

记录人

孙富利

