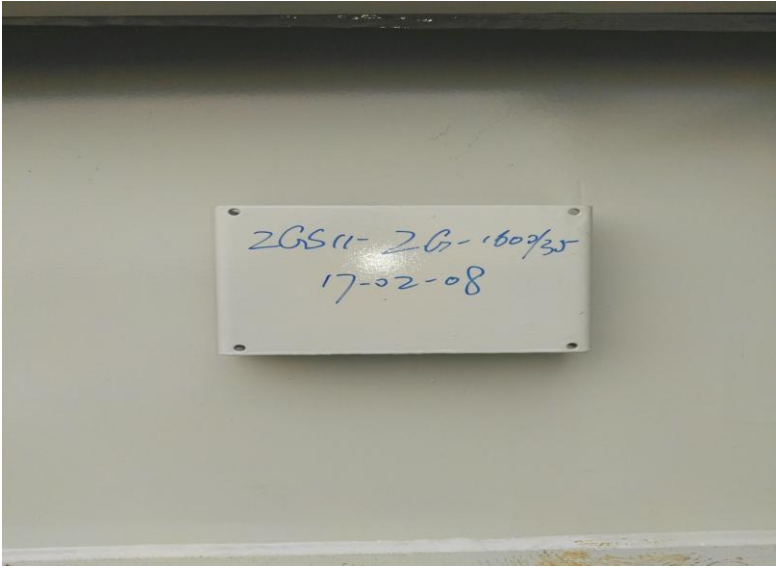


监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 03 月 21 日, 星期二		天气.: 多云, ,温度 7℃~15℃,风向: 北风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容		资源投入量		
光伏区	主接地网机械挖沟		2 台		
光伏区	主接地网		15 人		
光伏区消缺	支架、组件		40 人		
光伏区增补区	支架、组件		30 人		
/	/		/		
二、施工进度					
施工部位	施工内容		完成情况		
光伏区	主接地网挖沟		70%		
厂区防雷接地	接地网		40%		
光伏区增补区	支架、组件		10%		
/	/		/		
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
太平洋	18#箱变	更换安装	/	/	更换完成, 未带负荷受电, 明日带负荷
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	/	/	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作会议	工作内容	工作结果	
/	/	/	/	/	
五、签发监理文件台账					

文件编号	文件标题	接收单位	是否回复
/	/	/	/
六、之前问题整改复查情况			
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
支架:组件	拉撑未紧捆、桩帽防腐、组件平整	处理中	处理中
 更换箱变-箱变临时序列号			
本日监理人员	储乐峰、李仓立		

@
