


监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 04 月 24 日, 星期一		天气.: 晴、,温度 13℃~27℃,风向: 东南风: 风力:3~4 级			
一、施工内容					
施工部位	施工内容		资源投入量		
光伏区消缺	支架、组件		10 人		
光伏区增补区	支架、组件		10 人		
增补区	箱变		道路影响浇筑		
增补区	接地网		2 人		
升压站南	碎砖铺路		挖掘机一台、翻斗车一台		
二、施工进度					
施工部位	施工内容		完成情况		
光伏区增补区	支架、组件		100%		
增补区箱变	一层支模		100%		
增补区	焊接地网		80%		
升压站南	碎砖铺路		85%		
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
武进建工	一、四、五区	支架、组件消缺	通病	图纸	消缺中
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
九洲裕光	武进建工 正衡监理	业主会议室	二期开工预案	准备中……	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		

/	/	/	/
---	---	---	---

六、之前问题整改复查情况

施工部位	存在问题	复查情况	整改实效
/	/	/	/

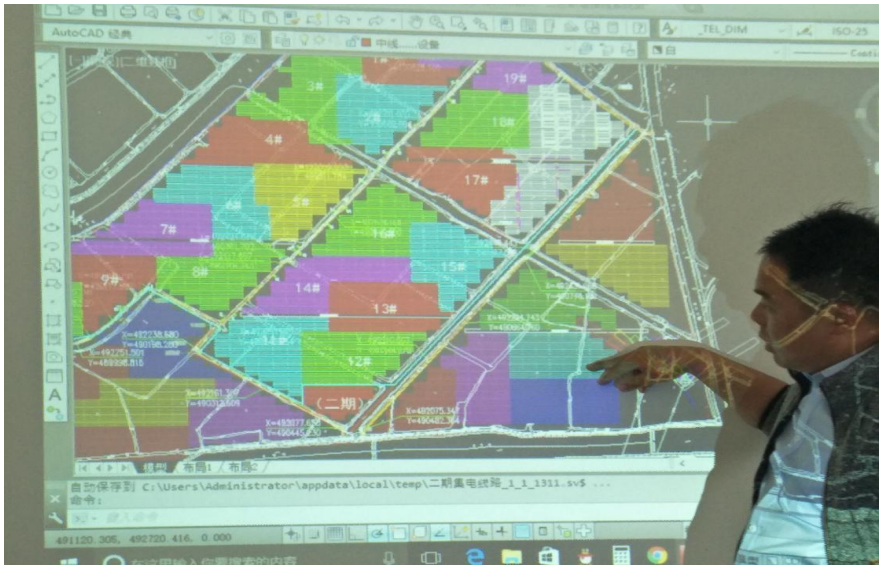

二期开工预案

本日监理人员	李仓立、
--------	------
