


监理日志

项目名称：常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目					
日期:2017 年 06 月 29 日, 星期四		天气: 多云、温度: 21℃~30℃,风向: 东南风: 风力:3~ 4 级			
一、施工内容					
施工部位		施工内容		资源投入量	
二期工程 20#子阵		打桩		打桩机 1 台	
/		/		/	
二、施工进度					
施工部位		施工内容		施工进度	
二期工程 20#子阵		打桩		55 根	
/		/		/	
三、施工质量问题					
责任单位	施工部位	施工内容	存在问题	评判标准	处理情况
/	/	/	/	/	/
四、监理工作情况					
组织单位	参与单位	工作地点	工作内容	工作结果	
九洲新能源	武进建工、苏文、 正衡	九洲新能源会议 室	专题会议 630 并 网	没有落实、还有 0.8MW 没并上	
五、签发监理文件台账					
文件编号	文件标题	接收单位	是否回复		
/	/	/	/		
六、之前问题整改复查情况					
施工部位	存在问题	复查情况	整改实效		
/	/	/	/		

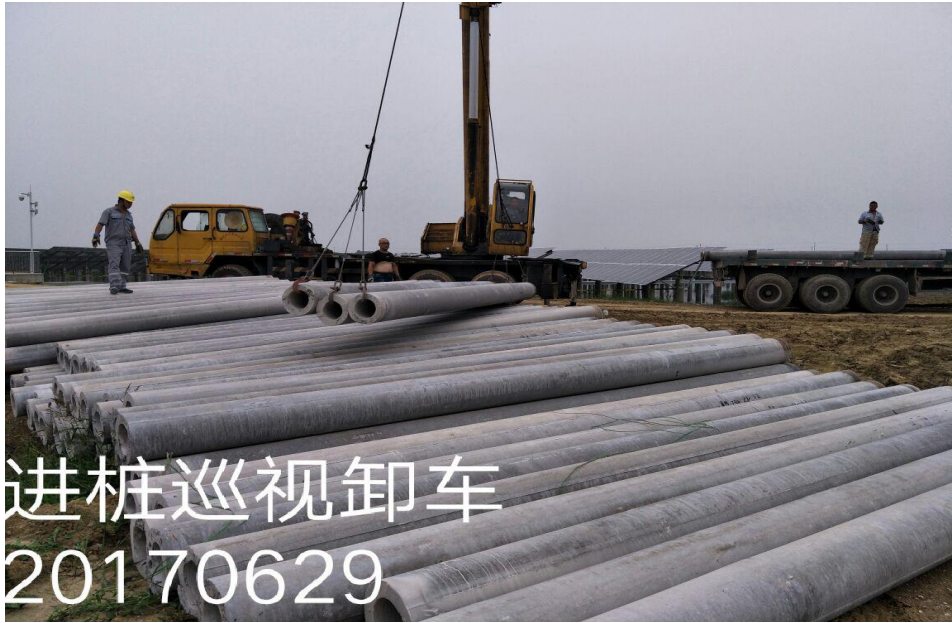

工地巡视 20170629

本日监理人员

李仓立、
