

监 理 日 志

工程名称:		日期:	2017年12月2日 星期六	气候:	多	气温:	-3~8℃
监理单位动态:		全勤、正常		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:		123人 正常					
施工机械动态:		铲车2台、挖机2台、叉车1台					
施工进度情况	26、26、41、42、43支架、组件安装 35区斜拉杆安装 42、37区电缆沟开挖 39、40区汇流箱至箱变电缆敷设 37、38区光伏电缆敷设、汇流箱安装 38、39组件区修整						
检查发现的问题	1、30单元箱变基础清理不符，29单元光伏电缆未敷设。 2、现场支架堆放不整齐。						
处理措施、意见、结果	要求施工单位2日内整改完成						
协调内容或其他	25单元村民阻工，会同业主协调						
记录人	周书仁		总监签阅		张建忠		




支架安装



箱逆变检测



组件安装

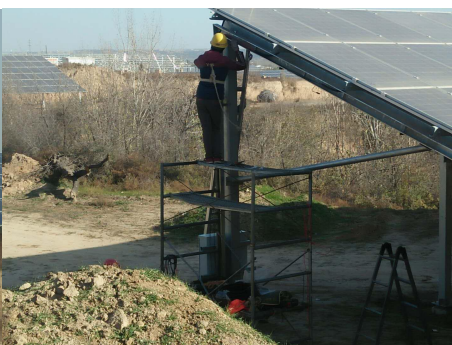

光伏电缆敷设
